



Sisma ed Emergenza Ischia

Ricostruzione Post Terremoto e
Interventi Contro il Dissesto Idrogeologico

**Resoconto sulle attività della Struttura Commissariale
Post Sisma e Post Frana al 31 dicembre 2023**

Indice

Introduzione	3
Misure di assistenza alla popolazione	6
Rilievo dei danni conseguenti alla frana del 26 novembre 2022	8
Monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi	10
Interventi emergenziali e di messa in sicurezza del territorio	11
Piano degli interventi urgenti del Commissario delegato	12
Piano degli interventi strutturali del Commissario straordinario	20
Stato di attuazione dell’Ordinanza n. 22 del 26 maggio 2023	25
Stato di attuazione dell’Ordinanza 18 del 31 agosto 2022.....	27
La ricostruzione post sisma.....	28
Ricostruzione privata.....	28
Ricostruzione pubblica	31
Nuova programmazione della riparazione e ricostruzione degli edifici di culto	38
Attività di pianificazione della ricostruzione	40
Riepilogo del fabbisogno e delle disponibilità finanziarie.....	41
Allegato 1 – Relazione finanziaria.....	43
Quadro delle risorse finanziarie disponibili	43
così suddivise:	46
Allegato 2 - Elenco ordinanze.....	57
Ordinanze del Commissario straordinario.....	57
Ordinanze speciali del Commissario straordinario	60
Ordinanze emanate dal Commissario delegato	61

Introduzione

Il 2023 è stato un anno spartiacque nella storia di Casamicciola e dell'intera isola. I devastanti effetti della frana e dell'alluvione si sono sommati alle ferite inferte dal sisma 2017, in molti casi sovrapponendosi. Sono rimaste impresse nel ricordo di tutti le immagini di quei giorni, segnati dal dolore per le vittime, dalla necessità per molti cittadini di lasciare le proprie case ed aziende invase dal fango, dal sostanziale blocco della mobilità e di molti servizi pubblici. La situazione di paralisi che si era determinata portava con sé rischi di danni irrimediabili all'economia turistica dell'isola, riferibili non soltanto alle molte imprese danneggiate dai due eventi catastrofici, ma anche a tutte le altre dell'isola, con un effetto a catena. Grazie all'impegno di tutti, si è riusciti a superare tale drammatica situazione, attraverso una efficace e partecipata gestione della fase emergenziale, con una straordinaria prova di impegno e solidarietà di tutte le istituzioni, a partire dai Sindaci. Alla doverosa attività di assistenza alla popolazione e alle imprese, si è immediatamente aggiunta quella finalizzata alla rimozione dei gravi effetti dannosi della frana e dell'alluvione, con gli interventi per la riduzione del rischio residuo, tuttora in corso, e con la volontà di orientare da subito le attività emergenziali tipiche verso l'obiettivo della ricostruzione e della progressiva messa in sicurezza strutturale del territorio. Le numerose iniziative messe in campo e la straordinaria prova di cooperazione istituzionale e sociale hanno consentito di ripristinare gran parte dei servizi pubblici essenziali e salvaguardare la stagione turistica.

I principali risultati delle attività portate avanti dalla struttura commissariale sono stati descritti e riepilogati nei rapporti annuali già pubblicati rispettivamente il 21 agosto scorso, relativamente alla ricostruzione post sisma, ed il 26 novembre, per quanto riguarda l'emergenza frana. Questo documento intende integrare tali rapporti, al fine di fornire un sintetico aggiornamento delle attività e dei dati, a conclusione dell'anno in corso. In particolare, vengono rappresentati, tramite le tabelle contenute nel presente rendiconto, gli aggiornamenti relativi agli interventi programmati e finanziati, nonché il loro stato di avanzamento.

I risultati raggiunti non sarebbero stati possibili senza un dialogo costante e approfondito con Comitati, professionisti e cittadini, attraverso numerosi incontri, assemblee e momenti di confronto pubblico anche su specifici temi, relativi alle ordinanze approvate o alle procedure per ottenere contributi o presentare le pratiche per la ricostruzione post frana e post sisma. Un ringraziamento, per l'impegno profuso, va al Governo e al Dipartimento nazionale della Protezione Civile, alla Regione Campania, nelle sue varie articolazioni, alla Città metropolitana, al Prefetto, ai Vigili del Fuoco, all'Esercito, alle Forze dell'Ordine, alle Autorità marittime e alla Capitaneria di Porto, alla

Soprintendenza e all’Autorità di Bacino dell’Appennino meridionale, nonché agli altri enti di tutela del paesaggio e del territorio e alle società pubbliche attuatrici degli interventi.

Nel corso del difficile ed operoso primo anno di emergenza, è emersa una nuova consapevolezza da parte della comunità isolana in merito alla portata distruttiva dei rischi sismico e idrogeologico e degli effetti degli eventi catastrofici. Un cambiamento culturale sostenuto anche attraverso la messa a disposizione di una grande mole di informazioni, analisi e dati scientifici raccolti grazie alla proficua e fondamentale collaborazione con le Università, i Centri di competenza, la Banca europea degli investimenti (BEI), i Carabinieri forestali e le altre istituzioni scientifiche che sono state coinvolte. All’introduzione di un metodo basato su analisi messe a disposizione dalla comunità scientifica, si è affiancata l’attività di studio sulla valutazione degli effetti dei cambiamenti climatici sulla progettazione degli interventi di ricostruzione e di messa in sicurezza dell’isola, grazie alla collaborazione in atto con la BEI, che ha sottoscritto un protocollo di collaborazione con la struttura commissariale, che prevede due fasi di attività. La prima fase, relativa allo studio sugli effetti dei cambiamenti climatici, è quasi ultimata, e i risultati saranno presentati all’inizio del prossimo anno. E’ già stato dato avvio alla seconda fase, indirizzata al supporto alla Struttura commissariale e ai Comuni nelle attività tecnico-amministrative e nella valutazione dei progetti presentati dai Soggetti attuatori.

Grazie a tale approccio innovativo, gli interventi emergenziali e di ricostruzione sull’isola di Ischia possono rappresentare un vero e proprio modello, anche per la sperimentazione di una estesa utilizzazione delle tecnologie digitali in contesto emergenziale e ricostruttivo. Oltre ad aver prodotto la realizzazione del “gemello digitale” dell’isola, come già illustrato nel rapporto pubblicato il 26 novembre scorso al quale si rimanda per maggiori dettagli, si segnalano due ulteriori strumenti digitali che nell’ultimo mese sono stati messi a disposizione dei tecnici, delle istituzioni e dei cittadini. Si tratta del “*Geoportale Ischia*”, accessibile dal sito della struttura commissariale, che consente di visualizzare in modo intuitivo e dinamico tutte le informazioni riguardanti le aree e gli edifici danneggiati dagli eventi calamitosi del 2017 e del 2022, accedendo in tempo reale alla individuazione puntuale e geolocalizzata dei singoli edifici, con dati utili anche ai fini della progettazione degli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza degli immobili e delle aree colpite sia dal sisma che dalla frana. L’altro strumento è la piattaforma GE.DI.SI., che è stata sviluppata nell’ambito del processo di ricostruzione del Centro Italia e richiesta in uso gratuito dalla struttura commissariale di Ischia; con i necessari e specifici adeguamenti, in parte già realizzati e in parte in corso di elaborazione, la stessa diverrà strumento indispensabile per centralizzare, standardizzare e

semplificare la gestione delle pratiche della ricostruzione, consentendo un più agile svolgimento dei procedimenti in sede di conferenza Speciale dei Servizi, sia preliminare che decisoria.

La quantità e la qualità delle attività portate avanti nel primo anno dopo l'emergenza è destinata a dispiegare pienamente la sua efficacia nell'anno che abbiamo davanti. Nel corso del 2024 dovranno essere conseguiti i seguenti importanti obiettivi:

- completamento degli interventi emergenziali avviati, sia per la fase di progettazione che di esecuzione, ed avvio dei lavori della rimanente parte delle circa 200 opere finanziate, delle quali 39 saranno avviate entro i primi 4 mesi del 2024. Con i lavori, che sono stati programmati e finanziati per un importo complessivo di euro 86.009.683,36, l'opera di riduzione del rischio residuo, e quindi la messa in sicurezza del territorio del Comune di Casamicciola e delle altre aree a rischio dell'Isola, è destinata a far conseguire un livello di sicurezza molto più avanzato di quello pre-frana;
- l'ulteriore rilevante obiettivo per l'anno 2024 sarà di avviare l'attuazione degli interventi strutturali di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio del Comune di Casamicciola, oggetto dell'ordinanza speciale n. 4, mediante la progettazione di tutti i lavori e l'esecuzione delle prime opere previste nel Piano, nei limiti delle risorse già assegnate. Tale imponente opera di messa in sicurezza potrà essere attuata per una parte importante con le risorse già disponibili, ma per essere completata necessita di ulteriori finanziamenti per il Comune di Casamicciola, mentre per gli altri Comuni dell'Isola dovrà essere interamente finanziata
- apertura del numero maggiore possibile di cantieri della ricostruzione pubblica, tra quelli già finanziati con le ordinanze speciali n. 1, 2, 3, 5, 6 e 7; sulla base del monitoraggio completato in questi giorni è prevedibile che nei primi mesi del prossimo anno saranno aperti 5 ulteriori cantieri della ricostruzione pubblica post-sisma, 5 relativi alla riparazione e ricostruzione di edifici di culto e circa altri 10 afferenti ad interventi strutturali di mitigazione del rischio idrogeologico;
- la ricostruzione privata, che nel corso del 2023 ha registrato un significativo avanzamento passando da n. 41 decreti complessivamente emanati al 31/12/2022, a n. 80 progetti approvati, dei quali 75 decretati, con il raddoppio nel 2023 rispetto ai decreti approvati nel corso dei 5 anni precedenti, dovrà ulteriormente accelerare nel corso del prossimo anno. Ciò sarà pienamente possibile solo con l'approvazione definitiva sia del Piano stralcio del PAI da parte dell'Autorità di Bacino, che del Piano di ricostruzione da parte della Regione Campania, per completare i quali sono in corso da alcuni mesi attività di confronto e condivisione di dati e valutazioni sul rischio idrogeologico e sismico;

- le delocalizzazioni degli edifici ubicati nelle aree a rischio dovranno essere concretizzate sia acquisendo le domande definitive di quanti hanno già presentato la domanda preliminare (attualmente n. 32), che incrementandone il numero, soprattutto dopo aver acquisito in via definitiva le indicazioni provenienti dagli strumenti di pianificazione sopra indicati, a mezzo dei quali saranno definite le delocalizzazioni obbligatorie; nel contempo, nei primi mesi del 2024 dovrà essere concluso l'accordo definitivo per l'acquisizione del Pio Monte della Misericordia, ed eventualmente di altri immobili da destinare alle delocalizzazioni, mettendo in atto un notevole sforzo progettuale e realizzativo, finalizzato anche a superare le difficoltà sin qui registrate nel mercato immobiliare ischitano;
- per l'assistenza alla popolazione la priorità sarà quella di individuare sistemazioni alloggiative per le 47 famiglie che sono ancora ospitate negli alberghi a seguito dell'evento catastrofico del novembre 2022, e di definire uno scadenziario per la presentazione delle domande di ricostruzione e delocalizzazione, al cui rispetto sarà subordinata l'erogazione del CAS. Una adeguata sistemazione alloggiativa di tutte le famiglie colpite dal sisma e dalla frana costituisce un obiettivo essenziale da perseguire nel corso del prossimo anno.

Misure di assistenza alla popolazione

Relativamente all'assistenza alla popolazione colpita dal sisma del 21 agosto 2027, ad oggi risultano ancora percepire il contributo di autonoma sistemazione (CAS) n. 476 nuclei famigliari, comprendenti 1.302 persone come di seguito specificato in dattaglio nella tabella:


		CAS	Hotel
Casamicciola	Nuclei	358	-
	Terme	993	-
Forio	Nuclei	12	-
	Persone	31	-
Lacco Ameno	Nuclei	106	-
	Persone	278	-
Totale	Nuclei	476	-
	Persone	1302	-

Tra le misure di assistenza alla popolazione, è stato inoltre garantito al Comune di Casamicciola il servizio di trasporto scolastico per assicurare gli spostamenti alla popolazione studentesca. Per tale servizio è stato erogato l'importo di € 539.787,89.

A seguito degli eventi catastrofici che hanno interessato l'isola di Ischia dal 26 novembre 2022, ai sensi dell'OCDPC n. 948 del 30 novembre 2022, al Commissario delegato è stato affidato il coordinamento, tra l'altro, degli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti ad assicurare l'assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi.

Alla data del 26 novembre 2022 le persone assistite erano in totale 364 di cui 165 in strutture ricettive e 199 in sistemazioni autonome con la corresponsione del CAS.

Il grafico che segue offre un quadro dell'andamento dell'assistenza alla popolazione dall'inizio dell'emergenza, a seguito delle due rimodulazioni della zonizzazione, fino ad oggi.

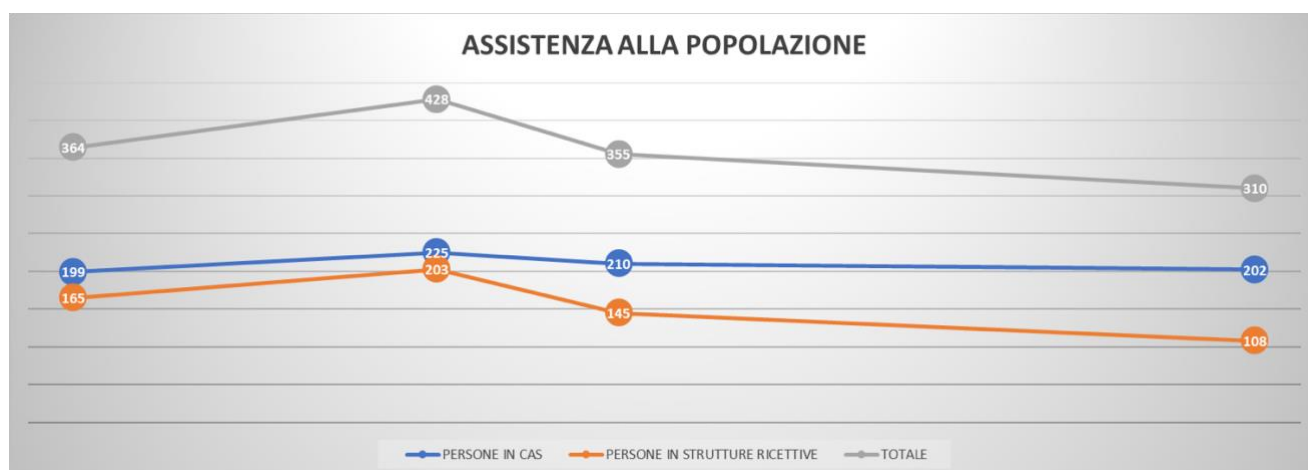

A seguito dell'emanazione delle ordinanze del Commissario delegato n. 10 del 17/03/2023 e n. 12 del 26/05/2023 che hanno disciplinato rispettivamente la rimodulazione della zonizzazione di Piazza Bagni nel Comune di Casamicciola Terme e la ripermetrazione della stessa, ad oggi risultano in assistenza 310 persone di cui n. 121 nuclei famigliari, comprendenti 202 persone che percepiscono il contributo di autonoma sistemazione, pari a 74 nuclei familiari, mentre fruiscono ancora dell'assistenza alberghiera 47 nuclei famigliari corrispondenti a 108 persone, come di seguito specificato in dattaglio nella tabella:

		CAS	Assistenza alberghiera
Casamicciola	Nuclei	62	46
Terme	Persone	176	107
Forio	Nuclei	1	-
	Persone	2	-
Lacco Ameno	Nuclei	4	1
	Persone	16	1
Ischia	Nuclei	4	
	Persone	4	
Serrara Fontana	Nuclei	3	
	Persone	4	
Totale	Nuclei	74	47
	Persone	202	108

Sono in fase di predisposizione e saranno emanate nel prossimo mese di gennaio due ordinanze relative al CAS sisma e al CAS frana. Per il terremoto del 2017, l'obiettivo della riduzione della popolazione che usufruisce del CAS è collegato all'esigenza di accelerare la ricostruzione privata, con l'introduzione di una armonizzazione, già prevista dall'art. 1 dell'ordinanza n. 25 del 12/12/2023, tra le misure di assistenza abitativa e le scadenze previste per la presentazione delle domande di contributo. Per quanto riguarda l'assistenza ai cittadini in seguito alla frana del novembre 2022, l'obiettivo nei prossimi mesi sarà di cessare l'assistenza alberghiera, provvedendo alla pubblicazione di un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse per reperire sistemazioni alloggiative alternative.

Rilievo dei danni conseguenti alla frana del 26 novembre 2022

Ai fini della valutazione dell'impatto sui fabbricati a seguito dell'evento calamitoso del 26 novembre 2022, con Ordinanza del Commissario delegato n. 7 del 24 febbraio 2023, è stato avviato il censimento e rilievo del danno utilizzando, per la prima volta in ambito nazionale, la Scheda AeDEI, adattata per l'occasione, con il supporto del Dipartimento della protezione civile, al contesto emergenziale dell'isola di Ischia e denominata "*AeDEI-Ischia 2023*".

La prima fase delle attività di sopralluogo, coordinata dalla Struttura Commissariale in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile, delle Regioni e delle Province Autonome, oltre ai geologi della Struttura Tecnica Nazionale, è stata condotta a "tappeto" sui fabbricati del Comune di Casamicciola Terme.

In esito ai 567 sopralluoghi effettuati sulla base degli aggregati risultanti da cartografia ufficiale, per circa n. 133 unità non è stato possibile assegnare un esito finale per assenza/rifiuto del proprietario dell'edificio, ovvero perché i manufatti non risultavano tra quelli per cui è prevista la redazione della scheda AeDEI (ruderi, edifici collabenti, baracche, ecc..). I dati dei sopralluoghi effettuati sono stati trasmessi ai Comuni e resi disponibili in maniera sintetica e facilmente fruibile anche ai cittadini, tramite l'applicativo web *Arcgis*.

Successivamente il Commissario delegato ha stabilito di estendere l'attività di sopralluogo AeDEI agli edifici ospitanti le attività economiche e produttive che avessero presentato, come previsto all'Ordinanza n. 4 del 30 dicembre 2022, il modello C1 di "*Ricognizione dei danni subiti e di richiesta di contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive*". Questa fase di ricognizione, avviata il 27 aprile 2023 e conclusa a fine giugno 2023, ha interessato complessivamente 18 attività produttive (13 nel comune di Casamicciola Terme e le restanti 5 nel comune di Serrara Fontana).

Con Ordinanza n. 12 del 26 maggio 2023, è stato stabilito che gli edifici per i quali si era registrata l'indisponibilità dei proprietari, possessori o detentori all'effettuazione dei sopralluoghi, fossero equiparati agli edifici inagibili, fino a quando gli stessi non si rendessero disponibili a consentire l'accesso per la redazione della scheda *AeDEI*. Pertanto è stata data la possibilità di produrre ulteriori istanze di sopralluogo.

Infine, l'Ordinanza del Commissario delegato n. 16 del 17 dicembre 2023 ha fissato al 31 dicembre 2023 il termine ultimo per la richiesta di sopralluogo AeDEI da parte dei cittadini e dei titolari delle attività produttive, disponendo, altresì, il termine del 15 gennaio 2024 per il completamento delle attività di ricognizione. Le attività di sopralluogo sono in corso a cura dei tecnici della Struttura Commissariale muniti di specifica professionalità, con il supporto di tecnici specialisti della Regione Campania. Ove non fosse possibile accedere agli immobili, se tecnicamente possibile il rilievo sarà condotto solo dall'esterno.

I dati rilevati con la scheda AeDEI rivestono una funzione di importante supporto alle autorità locali di protezione civile per l'adozione dei provvedimenti per la pubblica e privata incolumità, ed anche nella fase di ripristino e ricostruzione. Come disposto dall'ordinanza del Commissario Straordinario n. 22 del 26 maggio 2023, a partire dagli esiti delle schede AeDEI per le quali si registra un danno non grave, vengono disciplinate le modalità per l'erogazione dei contributi per la riparazione e il ripristino dei fabbricati privati e delle sedi di attività produttive.

A sua volta l'ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023, ai fini della delocalizzazione, equipara gli edifici gravemente danneggiati dal sisma del 2017 a quelli distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi catastrofici del 26 novembre 2022, con esito E ed EF risultante dalla scheda AeDEI.

Da ultimo, l'ordinanza 25 del 6 dicembre 2023, dispone che ai fini della ricostruzione degli edifici gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali del 2022, come attestati dalla scheda AeDEI con esito E ovvero EF, si applicano le disposizioni di cui all'ordinanza n.17 del 31 maggio 2022.

Nella tabella che segue sono rappresentati gli esiti di agibilità delle schede di valutazione del danno AeDEI suddivise per comune, come risultanti alla data odierna:

Esito	Casamicciola T.	Lacco Ameno	Forio d'Ischia	Barano	Serrara Fontana	Ischia
A	212	6	2	2	3	-
A-F	119	8	-	11	-	1
B	41	-	4	-	-	-
B-F	26	1	-	-	1	2
C	4	-	-	-	-	-
C-F	5	-	-	-	1	-
D	-	-	-	-	-	-
D-F	-	-	-	-	-	-
E	20	-	-	-	-	-
E-F	44	-	-	-	-	-
F	17	-	-	-	-	-
N.E	146	-	-	-	-	-
Totale per comune	637	15	6	13	5	3
Totale Sopralluoghi	679					

Monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi

A partire dal mese di giugno 2023, la Struttura commissariale si è munita di una specifica unità organizzativa per implementare l'attività di monitoraggio di tutte le attività facenti capo al Commissario delegato e al Commissario straordinario, relative sia al piano degli interventi emergenziali, a quelli di ricostruzione pubblica post-sisma 2017 e post-frana 2022, a quelli di ricostruzione privata e di delocalizzazione, nonché agli interventi di ripristino del tessuto abitativo e produttivo di cui all'Ordinanza 22/2023.

Tale attività di monitoraggio si è svolta, inizialmente, mediante una ricognizione dello stato complessivo di avanzamento di tutte le attività, con la predisposizione di un Database contenente i

dati di tutti gli interventi, contenente informazioni dettagliate, utili anche a valutare l'iter dei procedimenti.

Pertanto, tale attività consente di disporre di un quadro complessivo di tutti gli interventi, con l'indicazione delle tempistiche istruttorie interne (per le richieste di contributo per la ricostruzione privata) e dei cronoprogrammi degli interventi di ricostruzione pubblica sia post-sisma che post-frana, con l'indicazione delle fasi previste e dell'inizio delle attività di cantiere di tutti gli interventi.

Per l'anno 2024 il programma di monitoraggio prevede di offrire un supporto per assicurare una costante verifica delle attività, in particolare per l'attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica, per i quali si prevede una ridefinizione dei cronoprogrammi attuativi, in gran parte non allineati all'attuale stato di avanzamento.

Interventi emergenziali e di messa in sicurezza del territorio

È utile premettere il richiamo alla distribuzione delle competenze tra il Commissario delegato, nominato dal Capo Dipartimento della Protezione civile d'intesa con il Presidente della Regione Campania, e il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto-legge 109/2018.

Come previsto dal Codice di protezione civile, in seguito al DPCM contenente la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA) a partire dal giorno 26 novembre 2022, con OCDPC n. 948/2022 è stato nominato il Commissario delegato. Le funzioni del Commissario delegato, come previste dall'art. 25, comma 2, del citato Codice di protezione civile, relativamente a tutti i Comuni dell'Isola, sono:

- a) assistenza e soccorso alla popolazione
- b) interventi di somma ed estrema urgenza volti al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture, gestione dei rifiuti e delle macerie e del materiale alluvionale, misure volte a garantire la continuità amministrativa
- c) prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità, in particolare (art. 4 OCDPC 948/2022) attraverso l'erogazione di un contributo fino a Euro 5.000 ai nuclei familiari la cui abitazione principale risulti compromessa nella sua integrità funzionale, e fino a Euro 20.000 per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive.

Per quanto riguarda le attività previste dalle successive lettere d), e) ed f) dell'art. 25, comma 2, del Codice di protezione civile, relative a

d) interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti;

e) ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio;

f) attuazione delle misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), anche attraverso misure di delocalizzazione, laddove possibile temporanea, in altra località del territorio regionale

le stesse sono state assegnate alla competenza del Commissario Straordinario, con l'art. 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9 (c.d. "decreto Ischia").

Per quanto attiene in particolare alle misure relative al dissesto idrogeologico, il citato art. 5-ter prevede che il Commissario straordinario approvi un piano di interventi urgenti riguardanti le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso nel comune di Casamicciola Terme, mentre per il restante territorio dell'Isola è prevista una ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e disponibili contro il dissesto idrogeologico.

Pertanto, le attività di riduzione del rischio residuo post-frana, attribuite al Commissario delegato, e quelle di programmazione ed avvio degli interventi strutturali di mitigazione del rischio idrogeologico si svolgono in modo tra loro coordinato e si sono sviluppate come di seguito sintetizzato.

Piano degli interventi urgenti del Commissario delegato

L'OCDPC 948/20220 prevede che il Commissario delegato, dopo una prima fase ricognitiva delle situazioni di rischio presenti sull'Isola a seguito degli eventi calamitosi e delle attività e degli interventi da porre in essere, anche con procedure semplificate di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi e finalizzate ad evitare situazioni di pericolo

o maggiori danni a persone o a cose, predisponga un piano da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Il Piano degli interventi urgenti ex OCDPC 948/2022, approvato in data 3 marzo 2023, pianificava e finanziava, per un importo complessivo di circa 46.650.000€, l'esecuzione di 183 interventi di somma ed estrema urgenza inerenti:

- alla rimozione, trasporto e smaltimento dei fanghi riversati sulle strade a seguito dell'evento del 26 novembre 2022;
- alla rimozione di massi pericolanti e disgaggio sui principali alvei dell'Isola;
- al ripristino della funzionalità idraulica dei principali alvei;
- al rifacimento dei sottoservizi danneggiati (illuminazione pubblica, impianti fognari, condotte interrato);
- al ripristino delle condizioni ante evento alluvionale di spazi pubblici;
- alla messa in sicurezza della ex SS270 – la principale arteria stradale di collegamento dei sei Comuni dell'Isola - e delle ulteriori infrastrutture viarie
- al dragaggio del Porto di Casamicciola, volto a ripristinare la piena funzionalità dello stesso che a seguito della frana è risultato insabbiato per una variazione delle batimetrie dei fondali, determinando la compromissione di un servizio essenziale per il collegamento dell'isola alla terraferma. Le attività previste consistono nel rilievo batimetrico e nel confronto tra la situazione attuale e i dati disponibili al 2019, nell'elaborazione del piano di caratterizzazione, nel campionamento del materiale, nella progettazione e nel dragaggio e destinazione finale dei sedimenti del medesimo porto.
- al consolidamento dei muri di contenimento prospicienti spazi pubblici.

Il Piano, che, per sua natura, è uno strumento programmatico dinamico che si adatta al progressivo andamento delle fasi conoscitive del territorio ed attuative dei lavori, è stato sottoposto a due rimodulazioni in data 20 ottobre e 6 dicembre 2023.

Le rimodulazioni del Piano degli interventi ex OCDPC 948/22 fin qui proposte dalla Struttura commissariale sono parte di una strategia complessiva che ha tenuto conto di tutti gli spazi finanziari previsti a diverso titolo dai provvedimenti per la messa in sicurezza e la ricostruzione dell'isola di Ischia, adottati sia dal Commissario delegato che dal Commissario Straordinario.

In particolare:

- l'articolo 5-sexies, comma 1, del decreto-legge 186 del 2022, con riferimento alla gestione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione, autorizza la spesa di euro 20 milioni per l'anno 2023 e, ai sensi del medesimo articolo il Commissario straordinario assicura, con proprie ordinanze, il necessario raccordo con le funzioni esercitate come Commissario delegato, anche rispetto a misure precedentemente adottate. Tenuto conto di quanto sopra, il Commissario Straordinario, con Ordinanza speciale n. 5 del 8 agosto 2023, ha inteso dare copertura finanziaria a parte degli interventi di lett. b) inerenti alla gestione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione, attuati fino a quel momento con i fondi del Piano degli interventi urgenti del Commissario delegato. Con lo stanziamento previsto a tal fine nella citata ordinanza speciale n. 5, pari a € 12.615.412,81 si è provveduto, pertanto, a dare copertura ad 11 interventi urgenti, liberando risorse pari a circa €3.700.000 sugli stanziamenti nella disponibilità del Commissario delegato.
- la Giunta Regionale della Campania, con Deliberazione n. 624 del 29/11/2022, ha stabilito di destinare l'importo di € 4.000.000,00 per il pronto avvio di interventi prioritari per la tutela dei territori maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022. Con ordinanza del Commissario delegato n. 12, tale somma è stata destinata in parte all'integrazione delle risorse per la realizzazione del piano degli interventi di somma urgenza, ed in altra parte per la copertura finanziaria dell'intervento di dragaggio del Porto di Casamicciola.
- la copertura finanziaria della parte residua dell'intervento di dragaggio del porto di Casamicciola è assicurata, per l'importo pari a 1.190,095,62 €, dalle economie derivanti dall'intervento di "Ripascimento delle spiagge dell'isola d'Ischia", finanziato con fondi della Regione Campania;
- con ordinanza del Commissario straordinario n. 22 del 26 maggio 2023, ai sensi dell'art. 5-ter del decreto-legge n. 186/2022, sono stati previsti i criteri e le procedure per la concessione dei contributi di immediato ristoro per i privati che provvedano o abbiano provveduto agli interventi per il ripristino dei danni alle strutture, agli edifici e alle pertinenze di proprietà privata. L'art. 4 di tale ordinanza prevede che *“ Sono ammessi, nel contesto delle aree pertinenziali degli immobili privati o funzionali alle attività produttive, con le modalità di cui al successivo art. 7, anche interventi sui manufatti e/o sui versanti finalizzati al ripristino e alla rimozione dei pericoli determinati da cause esterne, direttamente connesse agli eventi del 26 novembre 2022, che ne hanno compromesso l'accesso e l'utilizzo in condizioni di sicurezza, anche migliorativi rispetto al preesistente, come riportato nelle schede AeDEI.”* Pertanto, alcuni Comuni, in seguito alle interlocuzioni con i privati interessati, hanno

comunicato che diversi interventi già previsti, insistenti su aree private e necessari ad evitare pregiudizi per le infrastrutture pubbliche e in generale per la pubblica e privata incolumità, per un importo pari ad € 747.825,73, dovevano essere stralciati dal piano ed eventualmente finanziati ai sensi della suddetta Ordinanza n. 22.

Infine, a seguito di diverse interlocuzioni con il Dipartimento e della nota prot. 2696 del 11/09/2023, con cui la Struttura commissariale ha richiesto lo stanziamento di un importo integrativo pari ad euro 27.358.000,00, per la copertura economica degli ulteriori interventi urgenti di messa in sicurezza del territorio, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2023, l'iniziale stanziamento di risorse di cui all'articolo 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022, è stato integrato di euro 24.930.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 25 del medesimo decreto legislativo.

Tenendo conto delle ulteriori risorse finanziarie su richiamate, pertanto, come su anticipato, la Struttura ha provveduto a completare due rimodulazioni.

Nella prima rimodulazione, che ha complessivamente approvato la programmazione di 181 interventi per un importo complessivo di € 64.041.183,36, si è provveduto:

- all'accorpamento o eliminazione di 26 interventi con una riduzione di spesa pari a 5.001.629,16 €;
- alla rimodulazione economica in diminuzione di 16 interventi con il recupero di un importo complessivo pari a 9.793.914,51 €;
- alla rimodulazione economica in aumento di 22 interventi che ha generato una maggiore spesa per un importo complessivo pari a 10.059.693,94 €;
- all'inserimento di 12 nuove opere finanziate con la contabilità del Commissario delegato per un importo pari a € 4.735.849,73;
- all'inserimento di 4 interventi finanziati con fondi della Regione Campania per un importo complessivo pari ad € 5.190.095,62;
- all'inserimento di 11 interventi finanziati con fondi ex articolo 5-sexies, comma 1, del decreto-legge 186 del 2022 a disposizione del Commissario straordinario per un importo complessivo pari ad € 12.615.412,81;
- al diverso finanziamento di 4 interventi finanziati con fondi ex Ordinanza n. 22 a disposizione del Commissario straordinario per un importo complessivo pari ad € 747.825,73.

Nella seconda rimodulazione, che ha complessivamente approvato la programmazione di 202 interventi per un importo complessivo di € 86.009.683,41 €, si è provveduto:

- a) alla rimodulazione economica in diminuzione di 2 interventi per € 518.647,25;
- b) alla rimodulazione economica in aumento di 8 interventi che ha generato una maggiore spesa per un importo complessivo pari a € 4.538.647,25;
- c) all'inserimento di 21 nuove opere per un importo pari a € 17.945.000,00.


Con riferimento allo stato di attuazione degli interventi, dal monitoraggio effettuato mediante interlocuzione costante con i soggetti attuatori, alla data del presente resoconto risulta che dei 202 interventi:

1. 63 risultano definitivamente conclusi per un importo complessivo stimato inizialmente nel piano pari a 11.278.695,31 €;
2. 29 interventi sono in corso di esecuzione per un importo complessivo stimato pari a 29.237.550,21 € e per un importo di stato avanzamento lavori pari a 17.660.222,25 €
3. 59 interventi risultano in fase di progettazione, affidamento della progettazione o dei lavori o per i quali sono in corso di esecuzione gli studi e le indagini preliminari per un importo complessivo (inizialmente stimato) pari a 32.981.957,31 € e per un importo di stato avanzamento dei servizi di progettazione stimato intorno al 50% (pari a 1.649.097,62 €);
4. 51 interventi di importo complessivo, stimato nel piano degli interventi originario, pari a 12.563.305,52 € per i quali sono in corso le attività conoscitive preliminari all'avvio delle fasi progettuali ovvero dei lavori.


Gli interventi definitivamente conclusi (a) e quelli per cui è in corso il procedimento (b e c) corrispondono complessivamente ad un importo pari a **30.588.015,18 €**.

Nelle tabelle seguenti sono riportate le principali informazioni di sintesi inerenti agli interventi di somma ed estrema urgenza, di competenza del Commissario delegato, cui alla lett. b) comma 2 dell'art. 25 del Codice di Protezione civile:

- **tabella 1:** stato di attuazione finanziario degli interventi, per ogni fonte di finanziamento;

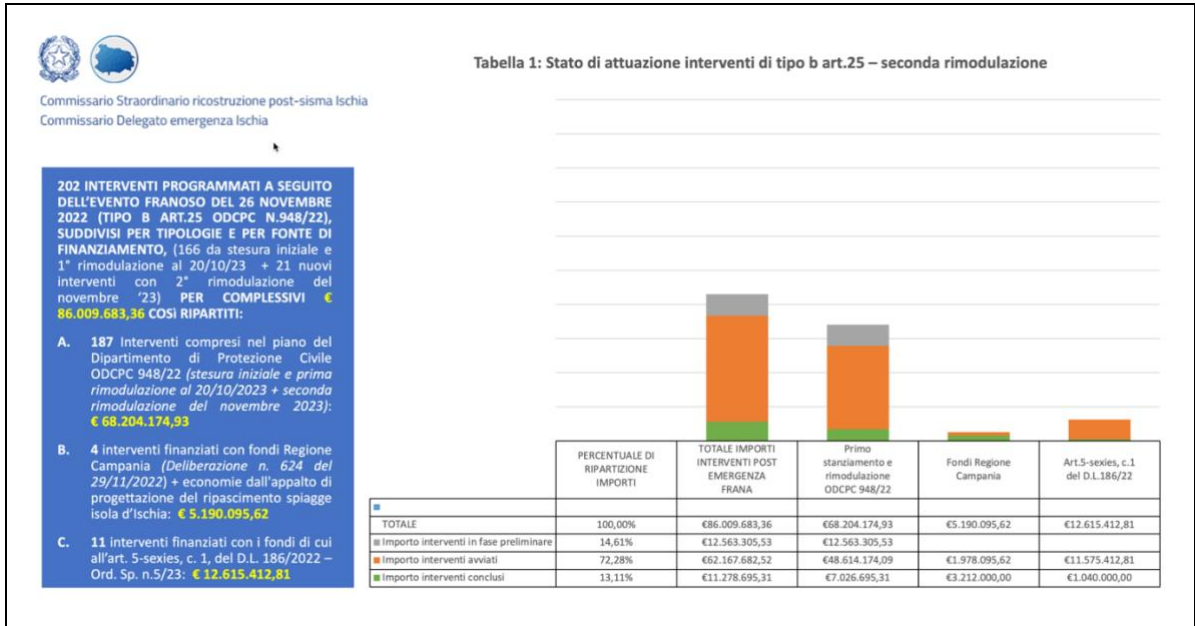

- **tabella 2:** stato di attuazione per numero di interventi, per ogni fonte di finanziamento;

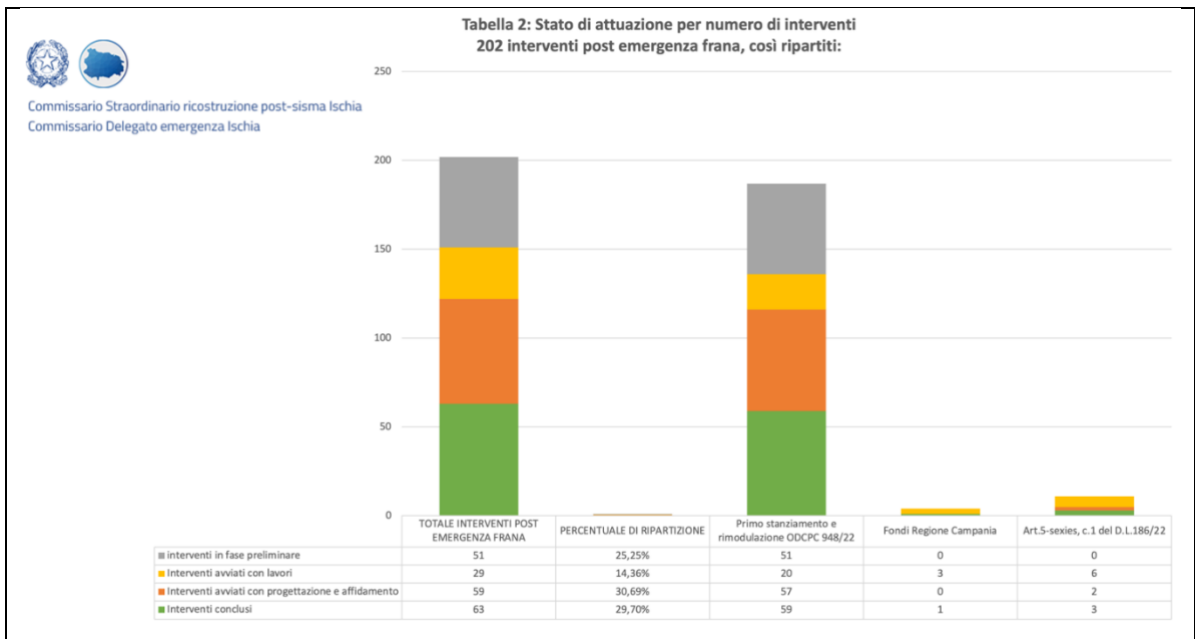

- **tabella 3:** importi degli interventi conclusi, quelli in corso di esecuzione, quelli per i quali sono in corso le attività di progettazione, indagini propedeutiche e quelli per i quali sono in corso le attività preliminari. L'importo indicato è sia quello complessivo del quadro economico finanziato, sia quello corrispondente allo stato di avanzamento dei lavori o della progettazione. Dalla tabella si evince che, con riferimento all'importo finanziato, sono stati avviati interventi per una percentuale pari all'85%, di cui il 13% conclusi, mentre lo stato d'avanzamento effettivo dei lavori avviati è pari al 36%. Si fa presente che la percentuale di attuazione complessiva degli interventi, registrata a novembre, era

pari al 41%, in quanto gli interventi approvati dal DPC a quella data erano 166 per un importo finanziato pari a complessivi 64.041.183,36 €. Considerando tale numero di interventi la percentuale di attuazione risulta incrementata e prossima al 50%. L'attuale percentuale del 36% è calcolata, invece, considerando lo stato di avanzamento del piano rimodulato, che comprende i 21 nuovi interventi approvati e finanziati con ordinanza commissariale n.16 del 7 dicembre 2023, e che quindi non sono stati ancora avviati.


	AVANZAMENTO IMPORTI PIANO	AVANZAMENTO EFFETTIVO	AVANZAMENTO IMPORTI PIANO	AVANZAMENTO EFFETTIVO	AVANZAMENTO IMPORTI PIANO	AVANZAMENTO EFFETTIVO	AVANZAMENTO IMPORTI PIANO	AVANZAMENTO EFFETTIVO
	Seconda rimodulazione - ODCPC 948/22 - IMPORTI PIANO	Seconda rimodulazione - ODCPC948 - AVANZAMENTO STATO DI ATTUAZIONE	Regione Campania - IMPORTI PIANO	Regione Campania2 - stima avanzamento stato di attuazione	Ordinanza n.5/23 allegato 1	Ordinanza n.5/23 allegato 2 - stima avanzamento stato di attuazione	TOTALE INTERVENTI POST EMERGENZA FRANA importi piano	TOTALE INTERVENTI POST EMERGENZA FRANA avanzamento stato di attuazione2
Totale finanziato	68.204.174,93 €	46.235.674,93 €	5.190.095,62 €	5.190.095,62 €	12.615.412,81 €	12.615.412,81 €	86.009.683,36 €	86.009.683,36 €
Importo interventi conclusi	7.026.695,31 €	7.026.695,31 €	3.212.000,00 €	3.212.000,00 €	1.040.000,00 €	1.040.000,00 €	11.278.695,31 €	11.278.695,31 €
Importo interventi in corso lavori	15.684.041,78 €	9.110.854,32 €	1.978.095,62 €	872.428,69 €	11.575.412,81 €	7.676.939,24 €	29.237.550,21 €	17.660.222,25 €
Importo interventi affidamenti e/o progett	32.930.132,31 €	1.646.506,62 €			51.825,00 €	2.591,00 €	32.981.957,31 €	1.649.097,62 €
Totale interventi in corso ed esclusi	55.640.869,40 €	17.784.056,25 €	5.190.095,62 €	4.084.428,69 €	12.667.237,81 €	8.719.530,24 €	73.498.202,83 €	30.588.015,18 €
Percentuale interventi in corso e conclusi	82%	38%	100%	79%	100%	69%	85%	36%
Importo interventi in fase preliminare	12.563.305,53 €	- €	- €	- €	- €	- €	12.563.305,53 €	- €

- **tabella 4:** suddivisione per territorio degli interventi di somma ed estrema urgenza di competenza del Commissario delegato, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 25 del Codice di Protezione civile



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

Tabella 4: Suddivisione per territorio degli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art.25 del Codice di Protezione Civile

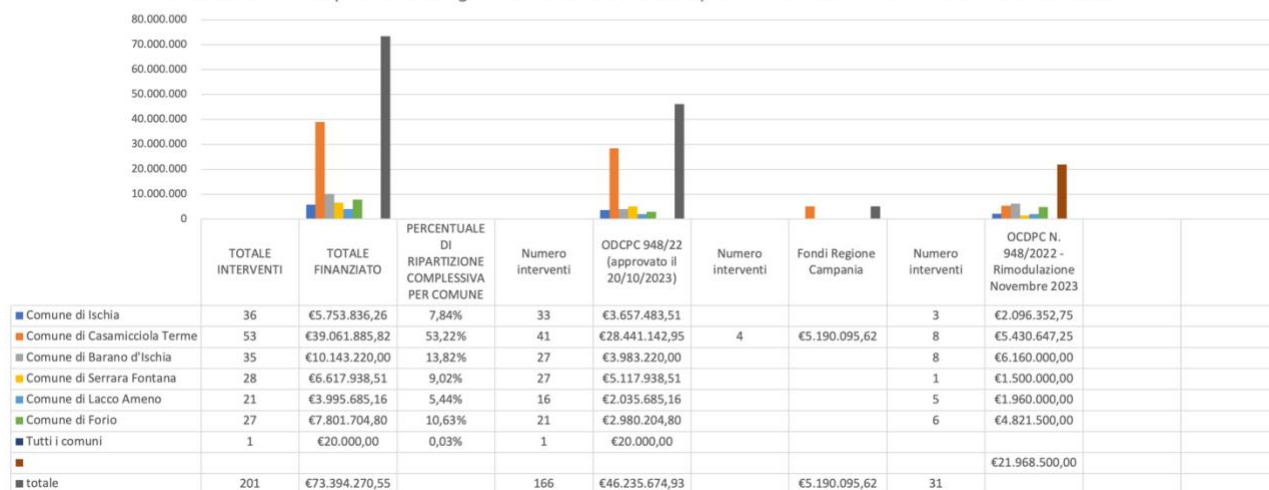


Nell'ambito degli interventi sopra elencati, di particolare rilievo rivestono le attività di pulitura degli alvei e di rimozione dei fanghi dalle aree pubbliche, che hanno richiesto di movimentare quantitativi molto elevati di materiali, seguendo un approccio di sicurezza e sostenibilità, declinato nelle varie ordinanze del Commissario delegato.

I volumi complessivamente movimentati, riferiti alle attività sin qui espletate, che dovranno essere completate nei prossimi mesi, sono quelli risultanti dalla seguente tabella:

<i>Riepilogo quantitativi lavorati ed estratti</i>					
<i>Sito di produzione</i>	Tot. volumi lavorati mc	<i>terreno mc</i>	<i>lignei mc</i>	<i>litoidi mc</i>	<i>frammisti (vari) mc</i>
Pulizia Strade	25 000	0	0	0	0
Dragaggio Porto	25 000	0	0	0	0
<i>Totale mc (Primi interventi)</i>	50 000	0 0%	0 0%	0 0%	0 0%
Alveo Celario	27 000	19 750	5000	1750	500
via Ombrasco	24 500	17 530	5500	1350	120
Alveo Negroponte	8 000	5 050	2250	500	200
Alveo Fasaniello	12 000	8 300	3300	400	0
Alveo Cuccufriddo	3 500	1 360	2050	70	20
Alveo Pozzillo	6 000	3 700	2000	200	100
Alveo Sinigallia	27 500	20 000	5700	1650	150
Alveo Fontana	21 000	14 500	4800	1700	0
Alveo La Rita	4 350	2445	1850	25	30
Alveo Il Monaco	611	300	299	12	0
Alveo Scialicco	285	0	285	0	0
<i>Totale mc (ALVEI)</i>	134 746	92 935 69%	33 034 25%	7 657 6%	1 120 1%
Intervento via Campomanno	1 020	300	700	20	0
Intervento uscita Piazzetta Nizzola	3 500	0	3 500	0	0
Intervento Paradisiello	1 000	0	1 000	0	0
<i>Totale mc (INTERVENTI)</i>	5 520	300 5%	5 200 94%	20 0%	0 0%
<i>Totale mc</i>	190 266	93 235 1689%	38 234 693%	7 677 139%	1 120 20%



Tabella 4: Suddivisione per territorio degli interventi di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art.25 del Codice di Protezione Civile

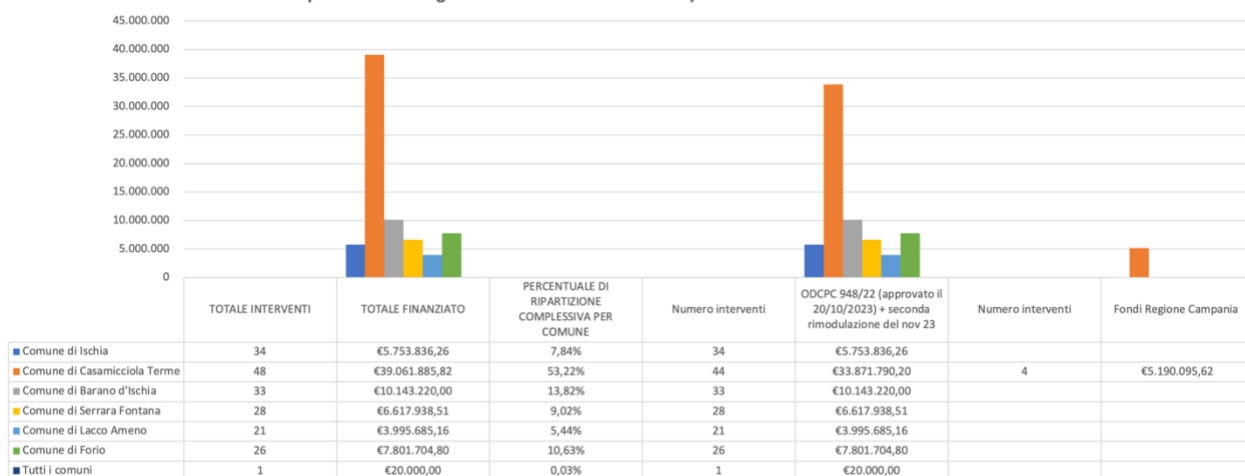

Piano degli interventi strutturali del Commissario straordinario

Il Piano degli interventi, approvato dal Commissario straordinario con ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023, ai sensi dell'art. 5-ter del decreto Ischia, contiene la previsione di 70 interventi per un investimento complessivo di circa 138 milioni di euro nel Comune di Casamicciola Terme, e la ricognizione di ulteriori 76 interventi per un importo di 176 milioni negli altri Comuni dell'Isola. Dopo l'approvazione del Documento di indirizzo per la progettazione delle opere (DIP), a fine agosto, è stata avviata la fase attuativa per 41 interventi raggruppati in 12 opere per un importo di 116 milioni di euro ed è stato pubblicato l'avviso per le manifestazioni di interesse per il conferimento degli incarichi di progettazione, conclusosi con l'adesione di circa 90 operatori economici. La procedura negoziata per il conferimento degli incarichi professionali sarà avviata non appena l'ANAC avrà espresso il suo parere sugli atti ad essa sottoposti in virtù dell'Accordo di vigilanza collaborativa.

ELENCO INTERVENTI RICOSTRUZIONE PUBBLICA CASAMICCIOLA - Opere connesse ricostruzione frana - art.5-ter L.9/2023 - Ord. Speciale n.4																							
UBICAZIONE E DENOMINAZIONE INTERVENTI					QUADRO FINANZIARIO		PROGRAMMAZIONE e QUADRO ESIGENZIALE		PROGETTAZIONE														
Elenco interventi piano commissariale di interventi urgenti					Importi complessivi approvati per opera	Importi dei singoli interventi	Nomina Soggetto Attuatore	Redazione DIP	Procedura di scelta del contraente per il servizio di progettazione ed esecuzione indagini	PFTE in attesa di progetto esecutivo		Progettazione conclusa											
CODICE INTERVENTO	ALVEO	CATEGORIA A BASE DI GARA	OPERE	DENOMINAZIONE						concluso	approvato in Cds	concluso	approvato in Cds										
CS-14-CU02	Cuccufriddo	idraulica e strutture	opera 1	Interventi di mitigazione dell'impatto dei flussi detritici della cava Cuccufriddo.	17.000.000,00 €	4.000.000,00 €	100%	100%	50%														
CS-15-CU03	Cuccufriddo			Miglioramento dell'efficienza idraulica del tratto tombato alla foce della cava Cuccufriddo		2.000.000,00 €																	
CS-16-CU04	Cuccufriddo			Sistemazione idraulica della cava Cuccufriddo a valle fino alla tombatura		2.000.000,00 €																	
CS-17-M002	Monaco			Sistemazione idraulica della cava Del Monaco fino alla confluenza con la cava La Rita		4.000.000,00 €																	
CS-18-M003	Monaco			Briglie aperte nel tratto della cava Del Monaco subito a monte della confluenza con la cava La Rita		5.000.000,00 €																	
CS-01-S01	Sinigallia	idraulica struttura e ambiente	opera 2	Vasca di espansione di circa 5000 mc, pulizia biomassa ed eventuali disaggi	43.000.000,00 €	6.000.000,00 €	100%	100%	50%														
CS-02-S03	Sinigallia			Realizzazione briglie a pettine		1.000.000,00 €																	
CS-03-S04	Sinigallia			Realizzazione briglie, recupero briglie esistenti e briglia a gradoni		7.000.000,00 €																	
CS-04-S05	Sinigallia			Vasca di espansione con briglia selettiva		1.000.000,00 €																	
CS-05-S06	Sinigallia			Realizzazione vasca espansione con briglia selettiva e recupero briglie esistenti		2.000.000,00 €																	
CS-07-CE02a/CE02b	Celario			Intervento di riduzione del rischio da flussi detritici in località Celario		9.000.000,00 €																	
CS-09-CE03	Celario			Inalveazione della cava a valle della località Celario fino all'incrocio con via Celario		4.000.000,00 €																	
CS-10-FO01	Fontana			Inalveazione della cava a valle dell'incrocio con via Celario		3.000.000,00 €																	
CS-11-FO02	Fontana			Realizzazione di una vasca di laminazione e di dissipazione nel tratto medio della cava Fontana		4.000.000,00 €																	
CS-12-FO03	Fontana			Sistemazione del collegamento idraulico tra la via Santa Barbara e la cava Fontana.		2.000.000,00 €																	
CS-13-FO04	Fontana			Ripristino e consolidamento delle briglie esistenti nella cava Fontana a monte dell'intersezione con la cava Sinigallia.		4.000.000,00 €																	
CS-19-F01	Fasaniello			idraulica e strutture		opera 3								Intervento di rinforzo di circa 250 metri lungo l'asse longitudinale del fondo alveo; asportazione di circa 2000 mc di materiale, installazione di briglie.	27.000.000,00 €	5.000.000,00 €	100%	100%	50%				
CS-20-F03	Fasaniello													Intervento di realizzazione briglie su circa 200 metri di alveo		3.000.000,00 €							
CS-21-F04	Fasaniello	Realizzazione vasca di accumulo	1.000.000,00 €																				
CS-22-F06	Fasaniello	Pulizia alveo e realizzazione briglie; ripristino briglie esistenti qualora possibile	3.000.000,00 €																				
CS-23-F08	Fasaniello	Realizzazione vasca di accumulo	1.000.000,00 €																				
CS-24-F09	Fasaniello	Realizzazione barriera e soglie	3.000.000,00 €																				
CS-25-C01	Campomanno	Ripristino terrazzamenti e regimentazione acque con briglie	2.000.000,00 €																				
CS-26-C02	Campomanno	Realizzazione di briglia a pettine e interventi corticali	1.000.000,00 €																				
CS-27-N01	Negroponte	Rifacimento briglia, rimozione materiale e sistemazioni	2.000.000,00 €																				
CS-28-N02	Negroponte	Realizzazione gradonata, briglie, stabilizzazione versanti e pulizia biomassa con eventuali disaggi	6.000.000,00 €																				
CS-29-P01	Puzzillo	idraulica e strutture	opera 4	Sistemazione del reticolo idraulico e vasca di espansione di circa 1000 mc	7.000.000,00 €	3.000.000,00 €	100%	100%	50%														
CS-31-P03	Puzzillo			Vasca con briglie a pettine sul lato di valle		1.000.000,00 €																	
CS-30-P02a	Puzzillo			Intervento con 10 soglie;		3.000.000,00 €																	
CS-32-M001	Monaco	strutture e ambiente	opera 5	Pulizia e ripristino delle briglie nel tratto montano della cava Del Monaco	4.000.000,00 €	2.000.000,00 €	100%	100%	50%														
CS-33-M004	Monaco			Sistemazione dei fossi minori presenti nel bacino della cava La Rita-Cuccufriddo-Del Monaco		2.000.000,00 €																	
CS-34-S02	Sinigallia	strutture e ambiente	opera 6	Stabilizzazione alveo e ripristino viabilità	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	100%	100%	50%	Ischia, 31/12/2023													
CS-35-F02	Fasaniello	strutture e ambiente	opera 7	Intervento di rinforzo corticale con estensione di circa 100 metri di lunghezza e circa 50 metri di sviluppo di pendio, pulizia biomassa ed eventuali disaggi	5.000.000,00 €	2.000.000,00 €	100%	100%	50%														
CS-36-F07	Fasaniello			Interventi di consolidamento di circa 4000 mq di pendio		1.000.000,00 €																	
CS-37-F10	Fasaniello			Pulizia alveo, rimozione materiale ed interventi di stabilizzazione pendii		2.000.000,00 €																	
CS-38-P02b	Puzzillo	strutture e ambiente	opera 8	Sistemi soil nailing con reti aderenti per i pendii maggiormente acclivi, rinverdimento incluso.	4.000.000,00 €	2.000.000,00 €	100%	100%	50%														
CS-39-P02c	Puzzillo			Intervento di rinforzo lungo circa 200 metri circa di fondo alveo e altezza di pendii fino a 20 metri comprensivo di pulizia biomassa e disaggi.		2.000.000,00 €																	
CS-40-IC02	Scala comunale		affidamento diretto	Sistemazione agronomico-forestale del tratto di cornice sommitale		1.000.000,00 €	100%	100%	100%														
CS-41-IC04	Scala comunale	ambiente	opera 9	Regimazione del deflusso superficiale a monte del centro abitato	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	100%	100%	50%														
CS-42-IC05	Scala comunale	strutture e ambiente	opera 10	Interventi per la riduzione del rischio delle frazioni alle pendici dell'Epomeo	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	100%	100%	50%														
CS-43-CU01	Cuccufriddo		affidamento diretto	Sistemazione e pulizia del tratto montano della cava Cuccufriddo		1.000.000,00 €	100%	100%															
CS-44-F05	Fasaniello	strutture e ambiente	opera 11	Intervento di disaggio e trasporto della biomassa	1.000.000,00 €	1.000.000,00 €	100%	100%	50%														
CS-45-IC01	Scala comunale		affidamento al corpo forestale dei carabinieri	Cartografia di base		100.000,00 €	100%	100%	100%														
CS-46-IC03	Scala comunale	strutture e ambiente	opera 12	Interventi di mitigazione del rischio da caduta di blocchi dai costoni delle zone sommitali	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €	100%	100%	50%	Ischia, 31/12/2023													

ELENCO INTERVENTI RICOSTRUZIONE PUBBLICA CASAMICCIOLA - Opere connesse ricostruzione frana - art.5-ter L.9/2023 - Ord. Speciale n.4													
UBICAZIONE E DENOMINAZIONE INTERVENTI					QUADRO FINANZIARIO		PROGRAMMAZIONE e QUADRO ESIGENZIALE		PROGETTAZIONE				
Ulteriori interventi da eseguire sul territorio del Comune di Casamicciola (SMA)					Importi complessivi approvati per opera	Importi dei singoli interventi	Nomina Soggetto Attuatore	Redazione DIP	Procedura di scelta del contraente per il servizio di progettazione ed esecuzione indagini	PFTE in attesa di progetto esecutivo		Progettazione conclusa	
CODICE INTERVENTO	ALVEO	CATEGORIA A BASE DI GARA	OPERE	DENOMINAZIONE						concluso	approvato in CdS	concluso	approvato in CdS
CS-52-CD-CT-1-010	Casamicciola Terme	Consolidamento		Completamento consolidamento via Vicinale Castanito località Piccola Sentinella		496.967,77 €	100%	100%	100%	100%			
CS-54-CD-CT-1-020	Casamicciola Terme	Misto		Completamento intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell'alveo Senigallia		729.065,64 €	100%	100%	100%	100%			
CS-55-CD-CT-1-021	Casamicciola Terme	Misto		Completamento intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell'alveo Cava Fontana - Vallone Selva		653.048,01 €	100%	100%	100%	100%			
CS-56-CD-CT-1-022	Casamicciola Terme	Misto		Completamento intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica degli alvei Negroponte (foce), Fasanliello o Ervaniello		896.699,15 €	100%	100%	100%	100%			
CS-57-CD-CT-1-023	Casamicciola Terme	Misto		Completamento intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell'Alveo Pozzillo o Cava Bains		707.107,40 €	100%	100%	100%	100%			
CS-63-CD-CT-1-039	Casamicciola Terme	Consolidamento		Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone sovrastante via Mortito - Primi interventi di messa in sicurezza		945.000,00 €	100%	100%	100%	100%			
CD-CT-1-009	Casamicciola Terme	Consolidamento		Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone località Valle del Cotto per una lunghezza di circa mt 50,00 ed un'altezza di circa mt 20,00 - Primi interventi di messa in sicurezza		473.945,75 €	100%	100%	100%	100%			
CD-CT-1-015	Casamicciola Terme	Consolidamento		Intervento di ricostruzione muro di contenimento sovrastante Corso Vittorio Emanuele tra il civico 68 e 74 per una lunghezza di circa m. 15,00 ed un'altezza di circa m. 3,00 - Primi interventi di messa in sicurezza		176.033,75 €	100%	100%	100%	100%			

ELENCO INTERVENTI RICOSTRUZIONE PUBBLICA CASAMICCIOLA - Opere connesse ricostruzione frana - art.5-ter L.9/2023 - Ord. Speciale n.4													
UBICAZIONE E DENOMINAZIONE INTERVENTI					QUADRO FINANZIARIO		PROGRAMMAZIONE e QUADRO ESIGENZIALE		PROGETTAZIONE				
ULTERIORI INTERVENTI LETT. D COMMA 2 ART. 25 DEL D.LGS 1 2018					Importi complessivi approvati per opera	Importi dei singoli interventi	Nomina Soggetto Attuatore	Redazione DIP	Procedura di scelta del contraente per il servizio di progettazione ed esecuzione indagini	PFTE in attesa di progetto esecutivo		Progettazione conclusa	
CODICE INTERVENTO	ALVEO	CATEGORIA A BASE DI GARA	OPERE	DENOMINAZIONE						concluso	approvato in CdS	concluso	approvato in CdS
CS-47-CD-CT-2-003	Casamicciola Terme	Consolidamento		Completamento dell'intervento di consolidamento di versante sovrastante l'Alveo Negroponte, per un fronte di circa mt 70,00 ed un'altezza media di mt 17,00.		517.064,91 €	100%	non richiesto	100%	80%			
CS-48-CD-CT-2-004	Casamicciola Terme	Consolidamento		Completamento dell'intervento di consolidamento versante a monte ed a valle II traversa Santa Barbara, per un fronte di circa mt 300 ed un'altezza di mt 30,00		786.522,56 €	100%	non richiesto	100%	80%			
CS-49-CD-CT-2-006	Casamicciola Terme	Consolidamento		Completamento dell'intervento di consolidamento costone al di sopra della via Edomade-Casa Siano per una lunghezza di circa mt. ed un'altezza di circa mt 40,00		68.530,12 €	100%	non richiesto	100%	70%			
CS-50-CD-CT-2-007	Casamicciola Terme	Consolidamento		Completamento intervento di consolidamento del costone sottostante la strada Viale Paradisiello e soprastante la strada Rampe Paradisiello, per una lunghezza di circa mt 80,00 ed un'altezza di mt 40,00		94.805,82 €	100%	non richiesto	100%	80%			
CS-51-CD-CT-2-008	Casamicciola Terme	Consolidamento		Completamento intervento di consolidamento costone sottostante la strada via Selva Pera, per una lunghezza di circa mt 50,00 ed un'altezza di circa		174.055,07 €	100%	non richiesto	100%	80%			
CD-CT-2-010	Casamicciola Terme			Completamento consolidamento via Vicinale Castanito località Piccola Sentinella		496.967,77 €	100%	non richiesto	100%	80%			
CD-CT-2-019	Casamicciola Terme			Completamento risistemazione marciapiedi e parapetti via Santa Barbara e parcheggio Celario e risistemazione canale di captazione delle acque meteoriche		1.400.000,00 €							
CD-CT-2-020	Casamicciola Terme			Completamento intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell'alveo Senigallia		729.065,64 €	100%	non richiesto	100%	80%	/12/2023		

ELENCO INTERVENTI RICOSTRUZIONE PUBBLICA CASAMICCIOLA - Opere connesse ricostruzione frana - art.5-ter L.9/2023 - Ord. Speciale n.4													
UBICAZIONE E DENOMINAZIONE INTERVENTI					QUADRO FINANZIARIO		PROGRAMMAZIONE e QUADRO ESIGENZIALE		PROGETTAZIONE				
ULTERIORI INTERVENTI LETT. D COMMA 2 ART. 25 DEL D.LGS 1 2018					Importi complessivi approvati per opera	Importi dei singoli interventi	Nomina Soggetto Attuatore	Redazione DIP	Procedura di scelta del contraente per il servizio di progettazione ed esecuzione indagini	PFTE in attesa di progetto esecutivo		Progettazione conclusa	
CODICE INTERVENTO	ALVEO	CATEGORIA A BASE DI GARA	OPERE	DENOMINAZIONE						concluso	approvato in CdS	concluso	approvato in CdS
CD-CT-2-021	Casamicciola Terme			Completamento intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell'alveo Cava Fontana- Vallone Selva		653.048,01 €	100%	non richiesto	100%	80%			
CD-CT-2-022	Casamicciola Terme			Completamento intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica degli alvei Negroponte (foce), Fasaniello o Ervaniello		896.699,15 €	100%	non richiesto	100%	70%			
CD-CT-2-023	Casamicciola Terme			Completamento intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell'Alveo Pozzillo o Cava Bains		707.107,40 €	100%	non richiesto	100%	70%			
CD-CT-1-029	Casamicciola Terme			Intervento da attuare nell'immediatezza: consolidamento delle scarpate laterali del torrente cucufreddo incrocio con via Arenale e via Montecito, nonché messa in sicurezza delle strade coinvolte - Primi interventi di messa in sicurezza		400.000,00 €							
CD-CT-2-029	Casamicciola Terme			Completamento : consolidamento delle scarpate laterali del torrente cucufreddo incrocio con via Arenale e via Montecito, nonché messa in sicurezza delle strade coinvolte		1.222.423,39 €							
CD-CT-2-039	Casamicciola Terme			Completamento intervento di consolidamento costone sovrastante via Mortito		112.426,19 €	100%	non richiesto	100%	80%			
CD-CT-2-101	Casamicciola Terme			consolidamento delle scarpate laterali dell'alveo la Rita e cava del Monaco		2.500.000,00 €							
CD-CT-2-102	Casamicciola Terme			intervento di messa in sicurezza del cotone a ridosso abitazioni su via Tommaso Morgera		500.000,00 €							
CD-CT-2-103	Casamicciola Terme			intervento di messa in sicurezza del cotone su via Dott. Mennella incombente sulle abitazioni Piazza Marina		500.000,00 €							
CD-CT-2-104	Casamicciola Terme			Opere di completamento alla portualità turistica presso il porto di Casamicciola Terme		3.000.000,00 €	100%	non richiesto	100%	80%			


Con l'ordinanza speciale n. 5 sono stati previsti ulteriori interventi per la messa in sicurezza post frana e la ricostruzione, relativi alla pulizia degli alvei, al dissabbiamento e all'efficientamento dei sistemi fognari e al trasporto dei materiali da frana verso gli impianti autorizzati al riuso, alla realizzazione di aule scolastiche a Forio, ed è stato dato avvio al progetto relativo al waterfront di Casamicciola, con un finanziamento pari a circa 6 milioni di euro, oltre alla messa in sicurezza dell'alveo tombato del "Pio Monte della Misericordia".

È stato inoltre istituito un fondo dotato di 3 milioni di euro, per l'avvio delle demolizioni degli edifici danneggiati dal sisma e dalla frana. Gli stanziamenti complessivi dell'ordinanza superano i 22 milioni di euro. Diversi degli interventi previsti in detta ordinanza sono stati avviati, sia per la fase di progettazione che per quella di esecuzione dei lavori.



Tabella 5: Ripartizione per ubicazione degli interventi COMMISSARIO STRAORDINARIO

Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia



	TOTALE INTERVENTI	TOTALE FINANZIATO	PERCENTUALE DI RIPARTIZIONE COMPLESSIVA PER COMUNE	Numero interventi	Art.5-ter L.9/2023 - Ord. Speciale n.4 *	Numero interventi	Vasca di colmata (Ord. Spec. n.5/23)	Numero interventi	Allegato 1- Ordinanza Speciale n.5/23
Comune di Ischia	0	€-	0,00%						
Comune di Casamicciola Terme	78	€155.645.788,2	99,44%	70	€137.936.583,5	1	€5.966.091,93	7	€11.743.112,81
Comune di Barano d'Ischia	0	€-	0,00%	0	€-				
Comune di Serrara Fontana	0	€-	0,00%	0	€-				
Comune di Lacco Ameno	4	€872.300,00	0,56%	0	€-			4	€872.300,00
Comune di Forio	0	€-	0,00%	0	€-				

*importo finanziato € 60.000.000 su € 137.936.583,50

Con ordinanza speciale n. 7, emanata in data 29/12/2023, si è provveduto ad implementare le misure già fatte oggetto delle suindicate ordinanze, mediante la previsione dei seguenti ulteriori interventi: completamento del “piano fanghi” di cui all’art. 5-sexies del decreto-legge n. 186/2022, con l’integrazione dell’elenco degli interventi già allegato all’ordinanza speciale n. 5, riguardanti la rimozione dei fanghi degli alvei nel territorio di Casamicciola e il finanziamento di un progetto di riuso dei fanghi finalizzato alla realizzazione di un Parco urbano e riqualificazione dell’area a Forio.

Il complesso degli interventi a valere sullo stanziamento complessivo di 20 milioni di euro di cui al citato art. 5-sexies è di circa 5 milioni di euro. Con la medesima ordinanza è stato nominato il Comune di Casamicciola quale soggetto attuatore di n. 8 progetti già redatti e ricompresi nell’elenco degli interventi strutturali allegato all’ordinanza speciale n. 4, per i quali il Comune stesso ha fornito disponibilità ad essere soggetto attuatore, essendo già stati predisposti ed approvati i relativi progetti. Inoltre, stante l’urgenza di intervenire, per l’alveo La Rita è stato ugualmente nominato il Comune di Casamicciola quale soggetto attuatore per la progettazione ed attuazione dell’intervento di messa in sicurezza strutturale. Con la medesima ordinanza è stato altresì disposto l’immediata realizzazione del primo stralcio del Waterfront di Casamicciola, già finanziato con l’ordinanza speciale n. 5, anche al fine di poter riutilizzare una parte dei materiali di frana in via di rimozione dagli alvei. Per lo stesso intervento il Comune di Casamicciola ha provveduto a completare lo studio di fattibilità complessivo, il cui esame dovrà essere completato dalla Conferenza speciale dei servizi, prima dell’avvio della fase esecutiva.

ALLEGATO 1 Ordinanza speciale n.7					
	Nuova codifica	Comune Richiedente	Soggetto attuatore	Tipologia intervento e sintetica descrizione tecnica	IMPORTI
1	CD-CT-F-040	Casamicciola Terme	SMA Campania Spa	Rimozione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all'evento calamitoso del 26 novembre 2022 e trasporto dello stesso presso i siti di stoccaggio provvisorio individuati sull'isola di Ischia	3.781.904,97 €
2	CD-CT-F-041	Casamicciola Terme	SMA Campania Spa	Trasporto e smaltimento presso siti di recupero al di fuori dell'isola di Ischia dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata rimosso a seguito degli eventi calamitosi del giorno 26 novembre 2022 e seguenti	4.885.482,24 €
3	CD-CT-F-042	Casamicciola Terme	SMA Campania Spa	Ulteriore Rimozione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all'evento calamitoso del 26 novembre 2022 e trasporto dello stesso presso i siti di stoccaggio provvisorio individuati sull'isola di Ischia	2.000.000,00 €
4	CD-LA-F-024	Lacco Ameno	EVI	Rimozione di sabbia, pietrisco e fanghi rinvenuti lungo l'asse longitudinale della condotta fognaria mista, in materiale ceramico DNS00	286.788,03 €
5	CD-LA-F-025	Lacco Ameno	EVI	Interventi di pulizia e smaltimento fanghi sulla centrale ubicata sul corso Angelo Rizzi via Pannella mc30	49.117,20 €
6	CD-LA-F-026	Lacco Ameno	EVI	Interventi di pulizia e smaltimento fanghi sulla centrale denominata "piazza Salvatore Giardi" località Capitello	338.176,63 €
7	CD-LA-F-027	Lacco Ameno	EVI	Interventi di pulizia e smaltimento fanghi sulla centrale denominata Sombrero che capta i reflui misti provenienti dall'alveo limitrofo denominato "La Rita"	470.979,12 €
8	CD-CT-F-043	Casamicciola Terme	EVI	Pulizia, dissabbiamento e ripristino del tratto terminale dell'alveo tombato "Pio Monte della Misericordia" lungo il tratto che parte da via Monte della Misericordia, attraversa la ex ss270 e sfocia sull'arenile in prossimità di piazza Anna de Felice (piazza Ancora)	258.323,51 €
9	CD-CT-F-044	Casamicciola Terme	EVI	Pulizia e dissabbiamento della centrale di sollevamento delle acque reflue denominata "Rittmann" nonché del pozzetto di confluenza posto immediatamente a monte della stessa, nei pressi di Piazza Marina	21.773,95 €
10	CD-CT-F-050	Casamicciola Terme/Lacco Ameno	Commissario straordinario	Intervento di pulizia e rimozione materiale detritico sull'Alveo La Rita	810.000,00 €
11	CD-CT-F-051	Casamicciola Terme/Lacco Ameno	Commissario straordinario	Intervento di pulizia e rimozione materiale detritico sull'Alveo Il Monaco	900.000,00 €
12	CD-LA-F-028	Lacco Ameno/FORIO	Commissario straordinario	Intervento di pulizia e rimozione materiale detritico sull'Alveo Scialicco	290.000,00 €
13	CD-CT-F-052	Casamicciola Terme	EVI	ULTERIORE PULIZIA E DISSABBIAMENTO ALVEO TOMBATO TERMINALE PIO MONTE DELLA MISERICORDIA	162.226,05 €
14	CD-CT-F-053	Casamicciola Terme	Casamicciola Terme	realizzazione di una vasca di colmata da riempire con materiale di risulta	2.421.527,68 €
15	CD-FO-F-022	Forio	Forio	Recupero fanghi e realizzazione del Parco urbano attrezzato e delle opere complementari	2.619.266,62 €
16	CD-CT-F-021	Casamicciola Terme	SMA Campania Spa	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell'alveo Cava Fontana - Vallone Selva - Primi interventi di messa in sicurezza	214.138,31 €
17	CD-CT-F-022	Casamicciola Terme	SMA Campania Spa	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica degli alvei Negroponte (foce), Fasaniello o Ervaniello - Primi interventi di messa in sicurezza	267.961,63 €
18	CD-CT-F-023	Casamicciola Terme	SMA Campania Spa	Intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell'Alveo Pozzillo o Cava Bairo	222.334,05 €
					20.000.000,00 €

Stato di attuazione dell'Ordinanza n. 22 del 26 maggio 2023

(Misure per il primo ripristino del tessuto abitativo e produttivo danneggiato dall'evento alluvionale del 26 novembre 2022 e disposizioni sui termini dell'ordinanza n.18 del 31 agosto 2022)

L'Ordinanza n. 22 del 26 maggio 2023 disciplina i criteri e le procedure per la concessione dei contributi per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture private adibite ad abitazione o ad attività economica e produttiva, danneggiate dagli eventi alluvionali del 26 novembre 2022 che abbiano riportato da scheda AeDEI esito diverso da "E" o "E-F".

In particolare, viene riconosciuto il ristoro ai cittadini e alle attività produttive che hanno o hanno avuto l'immobile alluvionato e/o danneggiato e che devono provvedere o hanno già provveduto ad effettuare interventi di immediata riparazione o interventi di messa in sicurezza del fabbricato anche in relazione al rischio esterno, vera e propria innovazione nei processi di ricostruzione post eventi

calamitosi. Per le attività produttive, inoltre, viene riconosciuto anche il danno subito ai beni strumentali, alle scorte e per la delocalizzazione temporanea per il pronto riavvio dell'attività.

In relazione alle attività produttive, l'Ordinanza 22/2023 ha previsto anche la possibilità di estendere il termine di presentazione delle domande di contributo dell'Ordinanza 18 del 31 agosto 2022 per il riconoscimento dei danni a beni mobili, scorte e beni strumentali. I privati cittadini e/o le imprese danneggiate dagli eventi alluvionali possono accedere al sito del commissario straordinario e accedere ai format e alle linee guida pubblicate con decreto n. 1664 del 16 giugno 2023.

Al 27 dicembre 2023 sono pervenute complessivamente n. 40 richieste di ristoro di danni da frana delle quali n. 11 per immobili a uso residenziale e n. 29 per attività produttive come di seguito dettagliato:

	Richieste ricevute	Importo richiesto
Contributo per immobili a uso residenziale	11	680.109,10 € *
Contributo per attività produttive	29	2.083.812,74 €
Totale	40	2.763.921,84 €

Nota: Per il contributo relativo agli interventi sugli immobili, per le civili abitazioni e sedi di attività economiche/produttiva, le istruttorie sono in capo ai Comuni (art. 7, comma 4 dell'Ordinanza n. 22 del 26 maggio 2023).

Le istanze di contributo sono così distribuite sul territorio:

	Contributo per immobili a uso residenziale	Contributo per attività produttive
Ischia	-	-
Barano	6	-
Casamicciola Terme	5	25
Serrara Fontana	-	-
Lacco Ameno	-	3
Forio	-	1
totale	11	29

Si riporta la situazione complessiva al 27 dicembre 2023 delle istanze pervenute/concesse/diniegate:


Interventi Ord. 22/2023 - ripristino del tessuto abitativo e produttivo								
Comune	Numero Istanze presentate	Istanze attività produttive	Istanze edilizia residenziale	In istruttoria presso i Comuni	Concesso attività produttive	Non approvato	Importi richiesti	Importi concessi/erogati
Casamicciola Terme	30	25	5	17	10	3	2.165.148,19 €	401.182,94 €
Barano d'Ischia	6	0	6	6	0	0	400.000,00 €	0,00 €
Lacco Ameno	3	3	0	2	1	0	143.621,57 €	102.219,33 €
Forio	1	1	0	0	1	0	55.152,08 €	44.121,66 €
Totale	40	29	11	25	12	3	2.763.921,84 €	547.523,93 €

Per il contributo relativo agli interventi sugli immobili, per le civili abitazioni e sedi di attività economiche/produktive, ai segnala che, ai sensi dell'art. 7, comma 4 dell'Ordinanza n. 22 del 26 maggio 2023, le istruttorie sono in capo ai Comuni, mentre risultano in istruttoria presso la Struttura Commissariale n. 10 istanze relative al ristoro dei beni strumentali e delle scorte.



Tabella 6: Interventi Ordinanza n.22/2023 - ripristino del tessuto abitativo e produttivo

Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

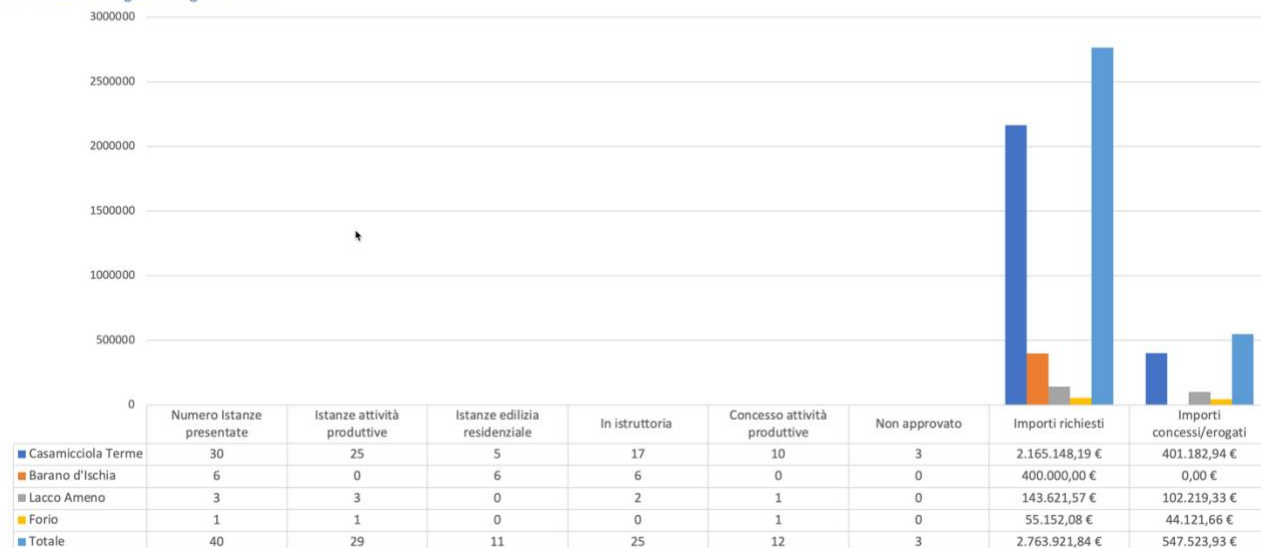

Stato di attuazione dell'Ordinanza 18 del 31 agosto 2022

“Misure in favore delle imprese danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017 ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno e disposizioni su termini”.

A seguito della riapertura dei termini disposta per le provvidenze in favore delle imprese danneggiate dal sisma del 2017, disciplinata con ordinanza n. 18/2022, si è provveduto nel corso del 2023 a completare l'istruttoria di tutte le 80 istanze pervenute con gli esiti riepilogati nella tabella sotto riportata. Con l'esame delle 80 domande pervenute, 63 delle quali risultano approvate, può dirsi conclusa l'attività di concessione di ristori in favore delle imprese danneggiate dal sisma.

TABELLA RIEPILOGATIVA ORDINANZA 18/2022 AL 27.12.2023

ORDINANZA 18/2022	n. domande pervenute	n. istruttorie	Importo richiesto In euro	n. domande approvate	Importi concessi/erogati in euro	n. dinieghi
Capi I, II, III, IV	80	80	€ 3.276.872,32	63	€ 1.665.080,08	17

La ricostruzione post sisma

Ricostruzione privata

Sulla base dell'aggiornamento della stima dei danni effettuata nell'agosto del 2023, il numero di schede AeDES relativi a edifici a uso abitativo e produttivo inagibili è di n. 839.

	TOTALE	COMUNE DI RIFERIMENTO		
		Casamicciola Terme	Lacco Ameno	Forio
SCHEDE AEDES con esito di INAGIBILITA'	1171	755	364	52
REVOCHE ordinanze di inagibilità da parte dei comuni <i>(a seguito di riparazione autonoma da parte dei proprietari senza contributo pubblico)</i>	-309	-115	-193	-1
REVOCHE ordinanze di inagibilità da parte dei comuni <i>(a seguito di riparazione con contributo pubblico)</i>	-23	-15	-7	-1
TOTALE SCHEDE AEDES con esito di INAGIBILITA'	839	625	164	50

La verifica è stata condotta analizzando la correttezza formale dei contenuti delle schede ed effettuando un ricongiungimento tra le schede eseguite per unità immobiliari riconducibili a un singolo edificio. Dal numero di schede epurato in tal senso, pari a 1171, sono state sottratte le revoche di inagibilità scaturenti da interventi di riparazione eseguiti dai proprietari o senza richiesta di contributo pubblico o con contributo pubblico.

L'analisi svolta si è, altresì, posta l'obiettivo di individuare gli intestatari di schede AeDES che nel corso di questi anni non hanno presentato alcun tipo di istanza riferita alla ricostruzione privata. Si è proceduto, quindi, a confrontare il dato sulle inagibilità residue con quello relativo alle schede Aedes per le quali un soggetto proponente ha presentato manifestazione di volontà al contributo, ovvero richiesta di concessione di contributo o richiesta di definizione delle istanze di condono. Da tale ultimo confronto è emerso che per un numero residuo di 117 schede AeDES non è mai stata presentata alcuna istanza o manifestazione di volontà a ricostruire. Con l'ordinanza n. 25/2023 è stato disposto, in via definitiva, il termine del 15 gennaio 2024 per la presentazione delle Manifestazioni di Volontà di cui all'art. 9 dell'Ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022, a pena di decadenza del contributo. A tal fine, i comuni sono stati invitati a provvedere ad informare i proprietari degli edifici oggetto delle suddette schede Aedes per consentirgli di far pervenire la presentazione della Manifestazione di Volontà entro il termine del 15 gennaio 2024.

Nel corso del 2023 molte energie sono state necessariamente rivolte ad affrontare l'emergenza che si è verificata in seguito alla frana del novembre 2022; le attività relative alla ricostruzione post-sisma,

sospese a fine novembre, sono riprese a fine gennaio. La faticosa e complessa attività di ricostruzione post sisma, che ora si affianca e sovrappone a quella post frana, si è rivelata, non da oggi, densa di molteplici criticità che sono a tutti note. A Casamicciola e negli altri comuni colpiti sono presenti rischi naturali, a volte aggravati per fatti dell'uomo, e i connessi vincoli idrogeologico, sismico e paesaggistico.

Le molte sanatorie edilizie rimaste inevase per decenni hanno rappresentato un notevole fattore di rallentamento della ricostruzione post sisma, che si sta faticosamente e pazientemente dipanando con misure di accelerazione ed efficientamento dei procedimenti, nel rispetto della legge. La struttura commissariale sta provvedendo alla digitalizzazione delle pratiche di condono esistenti presso i Comuni, al fine di poterle rendere disponibili in modo celere nel corso del procedimento.

Su tali criticità e complessità, si è innestata nel mese di agosto la proposta di Piano Stralcio del PAI che l'Autorità di Bacino ha adottato in base alle disposizioni del decreto Ischia, il cui esame e definitiva approvazione, in esito anche alle osservazioni del Comune di Casamicciola, della Regione e del Commissario, sono in fase di svolgimento.

A tale strumento di tutela della sicurezza idrogeologica del territorio, dovrà aggiungersi il Piano della Ricostruzione che la legge speciale post sisma ha affidato alla Regione Campania e che, sulla base del Piano degli interventi urgenti del Commissario straordinario varato nel maggio scorso e in fase di attuazione, potrà finalmente essere approvato.


Con l'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022, sono state introdotte rilevanti misure di semplificazione delle procedure, che hanno prodotto effetti positivi anche se non ancora pienamente soddisfacenti, sia a causa della sospensione dei termini a seguito della frana, che per il limitato numero di progetti presentati e le difficoltà solo in parte superate nell'esame dei condoni. I tempi di approvazione si sono drasticamente ridotti: i tempi medi di esame delle domande di contributo, dei progetti e dell'emanazione dei decreti di concessione, sono passati da 262 a 65 giorni.

Le tabelle di seguito riportate descrivono lo stato di avanzamento dell'attività istruttoria relativa alle richieste di concessione del contributo per la riparazione e ricostruzione privata degli edifici ai sensi delle ordinanze commissariali n. 2/2018, n. 4/2019, n. 7/2019 e n. 17/2023, alla definizione delle domande di condono ai sensi dell'ordinanza commissariale n. 17/2022 e alle istanze di delocalizzazione di cui all'ordinanza n. 24/2023.

A fronte di un dato, aggiornato al dicembre 2023, di 839 edifici inagibili, in totale sono state presentate 101 domande di contributo delle quali 47 sulla base delle ordinanze commissariali nn. 2/2018, 4/2019 e 7/2019 e 54 ai sensi dell'ordinanza n. 17/2022. Delle 101 domande presentate, 75 hanno avuto

decreti di concessione (il 74%), per un totale di contributi concessi pari a circa 24 milioni di euro, mentre per 5 progetti approvati è in corso di emanazione il relativo decreto, per altri 15 progetti si è in attesa di completamenti istruttori da parte dei Comuni o dei progettisti, e 4 progetti risultano sospesi su istanza della Regione per ragioni legate al rischio idrogeologico. Solo 2 domande non sono state approvate.

Tabella 3: Sintesi richieste di contributo ricostruzione privata

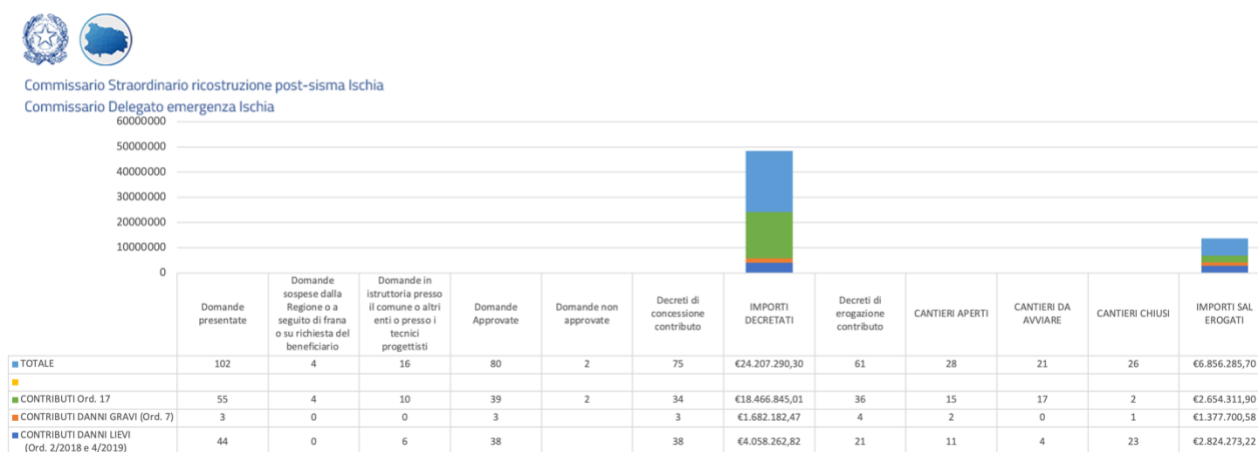


RICHIESTE DI CONTRIBUTO RICOSTRUZIONE PRIVATA												
TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO	Domande presentate	Domande sospese dalla Regione o a seguito di frana o su richiesta del beneficiario	Domande in istruttoria presso il comune o altri enti o presso i tecnici progettisti	Domande Approvate	Domande non approvate	Decreti di concessione contributo	IMPORTI DECRETATI	Decreti di erogazione contributo	CANTIERI APERTI	CANTIERI DA AVVIARE	CANTIERI CHIUSI	IMPORTI SAL EROGATI
CONTRIBUTI DANNI LIEVI (Ord. 2/2018 e 4/2019)	44	0	6	38		38	4.058.262,82 €	21	11	4	23	2.824.273,22 €
CONTRIBUTI DANNI GRAVI (Ord. 7)	3	0	0	3		3	1.682.182,47 €	4	2	0	1	1.377.700,58 €
CONTRIBUTI Ord. 17	55	4	10	39	2	34	18.466.845,01 €	36	15	17	2	2.654.311,90 €
TOTALE	102	4	16	80	2	75	24.207.290,30 €	61	28	21	26	6.856.285,70 €

La prima fase della ricostruzione privata, circoscrivibile in un arco temporale dal settembre 2018 al febbraio 2022, è stata normata dalle ordinanze commissariali n. 2/2018 e n. 4/2019, per la riparazione dei danni lievi, e l'ordinanza commissariale n. 7/2019 per la riparazione dei danni gravi. In tale arco temporale sono state presentate 44 richieste di concessione di contributo per la riparazione dei danni lievi e 3 per la riparazione dei danni gravi e sono stati emessi n. 29 decreti di concessione.

La seconda fase della ricostruzione privata ha preso avvio con la legge 25 febbraio 2022, n.15 di conversione del decreto-legge 20 dicembre 2021, n. 228 (cd. Decreto milleproroghe), che prevedeva per la ricostruzione post-sisma sull'isola di Ischia la possibilità di applicare le norme di semplificazione ed accelerazione già previste per la ricostruzione in Centro Italia. Sulla base di tali norme è stata emanata l'ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022 con le misure di semplificazione delle procedure sia di concessione del contributo che dei condoni. Ai sensi dell'ordinanza n. 17/2022, che ha superato la distinzione tra danno lieve e grave, riferendo il contributo pubblico, per la parte relativa al danno, al solo livello operativo così come determinato d'ufficio da parte dell'Università Federico II di Napoli, sono state presentate 54 richieste di contributo.

Per quanto attiene alle richieste di definizione delle istanze di condono, dalla tabella sottostante si evince che, con l'introduzione delle procedure dell'ordinanza n. 17/2022, sono state definite 47 istanze di condono gravanti su 42 edifici danneggiati dal sisma.

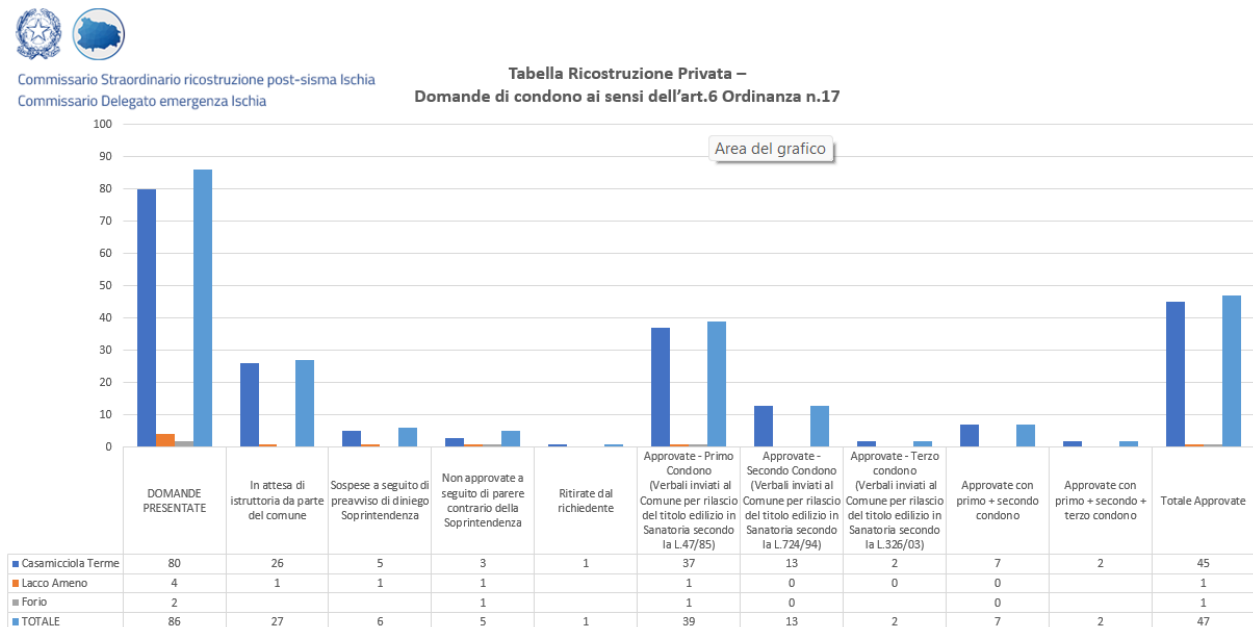

In merito all'ordinanza 24/2023 che disciplina le delocalizzazioni volontarie, in quanto frutto di una libera scelta dei cittadini con immobili danneggiati dal sisma ed in zone a rischio idrogeologico, nelle more della introduzione del Piano della Ricostruzione da parte della Regione Campania che dovrebbe individuare porzioni del territorio dell'isola da sottoporre a delocalizzazione obbligatoria, sono state presentate 32 richieste di valutazione preliminare del contributo per l'immobile da delocalizzare e una richiesta di contributo per la delocalizzazione con individuazione dell'immobile oggetto di acquisto.

DOMANDE DI DELOCALIZZAZIONE - Ord.24/2023						
DOMANDE PRELIMINARI DI DELOCALIZZAZIONE						
Comune	DOMANDE PRESENTATE	Istruttoria da avviare	In istruttoria	Ritirata dal richiedente	Non approvate	Totale Concluse
Casamicciola Terme	31	4	10	2	0	15
Lacco Ameno	1	1	0	0	0	0
Forio	0				0	0
TOTALE	32	5	10	2	0	15

Ricostruzione pubblica

L'evento sismico del 21 agosto 2017 ha causato ingenti danni al patrimonio edilizio pubblico del territorio comunale di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio.

L'art. 26 comma 1 del DL 109/2018 prevede che a seguito della ricognizione dei fabbisogni da parte del Commissario straordinario, si provveda al *“finanziamento per la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, e delle infrastrutture, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture”*.

Al comma 2 dell'art. 26, è disposto che, per dare attuazione alla programmazione degli interventi, si provvede a predisporre ed approvare un piano delle opere pubbliche, delle scuole e degli edifici di culto, che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento in base alle risorse rese disponibili. Con riferimento alla ricostruzione pubblica, sulla base delle esigenze rappresentate dai “Soggetti Attuatori” individuati nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, nonché nella Città Metropolitana, nella Regione Campania, nella Diocesi di Ischia e nella Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, **con le Ordinanze Commissariali n. 6, 9, e 14** dell'allora nominato Commissario Straordinario, sono stati approvati i primi stralci dei Piani per l'edilizia scolastica, e per le Opere Pubbliche.

Con le suddette Ordinanze, sono stati, pertanto, individuati gli interventi e approvati di conseguenza, gli importi, occorrenti per la progettazione esecutiva delle opere, stimati in circa il 30% delle spese tecniche totali, calcolate sulla base dei costi complessivi presuntivi indicati dai Soggetti Attuatori.

Su richiesta dei Comuni, e al fine di dare la massima speditezza alle procedure di attuazione degli interventi, sono state predisposte tre Ordinanze Speciali (una per ciascun Comune), che hanno introdotto procedure speciali in deroga alle norme ordinarie sugli appalti pubblici per l'avvio della ricostruzione pubblica ed il finanziamento integrale dei primi interventi più urgenti, in virtù delle disposizioni contenute nel decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in base al quale con l'art.13 comma 4 ter, agli interventi della ricostruzione post-sisma nell'isola di Ischia possono essere applicate, con ordinanza commissariale, misure di semplificazione finalizzata ad accelerare la ricostruzione privata, pubblica e degli edifici di culto.

La Struttura commissariale, preliminarmente all'emissione delle predette Ordinanze ha provveduto a redigere apposite relazioni istruttorie, per i tre Comuni coinvolti dall'evento sismico, al fine di verificare i contenuti tecnici ed economici delle richieste di finanziamento, effettuare una prima verifica di congruità della spesa e determinare di conseguenza un cronoprogramma finanziario

pluriennale da rendicontare sui fondi assegnati alla contabilità speciale del Commissario straordinario.

Le suddette Ordinanze ricomprendono alcune delle opere già inserite nella precedente pianificazione, e nuovi interventi che si sono resi necessari a seguito alle richieste più recenti dei Comuni, tra le quali sono ricompresi anche interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico nei comuni di Casamicciola, Forio E Lacco Ameno.

Le ordinanze erano state predisposte nei mesi di ottobre e novembre 2022, prevedendone l'adozione nei primi giorni del mese di dicembre 2022. Tuttavia, a seguito dell'evento catastrofico del 26 novembre 2022, l'iter è stato sospeso e poi ripreso, tenendo conto della nuova situazione determinatasi, a partire dal mese di febbraio 2023 e si sono concluse nel mese di aprile, con l'emanazione delle ordinanze 1,2, e,3 in data 11 aprile 2023.

L' **ordinanza speciale 1** approva il Piano degli interventi di recupero degli edifici ubicati nel comune di Casamicciola Terme nel limite massimo di € **45.897.264,22**, individuando e approvando come urgenti e di particolare criticità **10** interventi.

ELENCO INTERVENTI ORDINANZA SPECIALE N.1- Comune di Casamicciola Terme-DETTAGLIO DELLO STATO DI ATTUAZIONE														
CODICE IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE	QUADRO FINANZIARIO		PROGRAMMAZIONE e QUADRO ESIGENZIALE		PROGETTAZIONE				ESECUZIONE			CONCLUSIONE	
		Importi complessivi stanziati	Importi erogati	Nomina Soggetto Attuatore	Redazione DIP	Procedura di scelta del contraente per il servizio di progettazione ed esecuzione indagini	PFTE in attesa di progetto esecutivo		Progettazione conclusa		Procedura scelta ditta	Cantieri Avviati	Collaudo	Opera conclusa
							concluso	approvato in CdS	concluso	approvato in CdS				
CS-OS-CT-01	Edificio Casa Comunale denominato "Palazzo Bellavista o Napoleon" - Miglioramento / adeguamento sismico, efficientamento termico ed adeguamento funzionale.	5.359.768,47 €	- €	100%										
CS-OS-CT-02	Lavori di miglioramento/adeguamento sismico, ripristino e riqualificazione dell'ex Osservatorio Geodinamico, già sede del museo civico e della piazzola antistante	3.195.409,42 €	- €	100%	100%	100%								
CS-OS-CT-03	Consolidamento del versante sito in località Piccola Sentinella di interazione geologico-tecnica con l'area su cui è ubicato l'edificio scolastico Ibsen.	1.968.118,40 €	- €	100%	100%	10%								
CS-OS-CT-04	Miglioramento/adeguamento sismico e adeguamento funzionale del Plesso Scolastico Sanseverino con abbattimento e ricostruzione.	1.927.252,80 €	26.000,00 €	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%				
CS-OS-CT-05	Intervento di miglioramento/adeguamento sismico e adeguamento funzionale del Plesso Scolastico A. Manzoni.	7.512.535,73 €	- €	100%	100%									
CS-OS-CT-06	Lavori di Miglioramento / adeguamento sismico e adeguamento con abbattimento e ricostruzione del plesso scolastico Lembo - CUP: G34I19000740001	4.428.999,92 €	65.112,50 €	100%	100%	100%			100%	100%				
CS-OS-CT-07	Consolidamento del versante denominato Collinetta Paradisiello di interazione geologico-tecnica con le aree di sedime degli interventi Palazzo Bellavista (Napoleon), Plesso Scolastico Manzoni e Plesso scolastico San Severino.	5.239.280,00 €	- €	100%	100%	10%								
CS-OS-CT-08	Intervento di adeguamento sismico Plesso Scolastico Ibsen con abbattimento e ricostruzione	12.044.419,20 €	- €	100%	100%									
CS-OS-CT-09	Lavori di messa in sicurezza e ripristino del Cimitero Monumentale, nonché adeguamento sismico e messa in sicurezza del muro di cinta su via Vicinale Bagnitello CUP G31B21001420001	1.082.058,70 €	36.980,36 €	100%	100%	100%			100%	50%				
CS-OS-CT-10	Edificio in via Marina n.13 adibito a sede provvisoria della Casa Comunale denominato "ex Capricho" - Lavori di adeguamento, ripristino e riqualificazione del fabbricato	3.139.421,57 €	83.831,28 €	100%	100%	100%						Ischia	31/12/2023	

L'ordinanza speciale 2 approva il Piano degli interventi di recupero degli edifici ubicati nel comune di Lacco Ameno nel limite massimo di € **31.723.981,50**, individuando **6** interventi.

ELENCO INTERVENTI ORDINANZA SPECIALE N. 2 – Comune di Lacco Ameno–DETTAGLIO DELLO STATO DI ATTUAZIONE														
CODICE IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE	QUADRO FINANZIARIO		PROGRAMMAZIONE e QUADRO ESIGENZIALE		PROGETTAZIONE				ESECUZIONE			CONCLUSIONE	
		Importi complessivi stanziati	Importi erogati	Nomina Soggetto Attuatore	Redazione DIP	Procedura di scelta del contraente per il servizio di progettazione ed esecuzione indagini		PFTE in attesa di progetto esecutivo		Progettazione conclusa		Procedura scelta ditta	Cantieri Avviati	Collaudo
							concluso	approvato in CdS	concluso	approvato in CdS				
CS-OS-LA-01	Intervento di demolizione e ricostruzione della scuola media comunale Istituto Mennella danneggiata dal sisma.	5.113.147,24 €	88.343,37 €	100%	100%	100%			100%	100%				
CS-OS-LA-02	Intervento di miglioramento/adequamento sismico dell'edificio scolastico Liceo scientifico Giorgio Buchner di via Provinciale (ex Liceo scientifico Einstein) - Lacco Ameno colpito dal sisma	4.600.000,00 €	88.713,38 €	100%	100%	100%			100%					
CS-OS-LA-03	Progettazione, lavori, fornitura, trasporto e posa in opera di moduli definitivi ad uso scolastico provvisorio (MODUSP), nonché recupero per finalità scolastiche provvisorie di un immobile esistente sullo stesso sito.	6.658.000,00 €	- €	100%	100%	100%	100%							
CS-OS-LA-04	Intervento di miglioramento/adequamento sismico della sede comunale, dei locali della diocesi e dell'area archeologica di Santa Restituta, colpiti dal sisma.	11.217.200,01 €	- €	100%	100%	100%								x
CS-OS-LA-05A	Lavori di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria della Torre costiera aragonese danneggiata dal sisma	1.429.964,44 €	- €	100%	100%	100%			100%	100%				
CS-OS-LA-05B	Lavori di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria alle strutture cimiteriali ed al limitrofo costone danneggiati dal sisma	1.973.669,81 €	- €	100%	100%	100%			100%	100%				
CS-OS-LA-06	Opere complementari per l'adequamento sismico dell'edificio scolastico "Principe di Piemonte" danneggiato a seguito del sisma del 21 agosto 2017	732.000,00 €	- €	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		
Tutti i comuni dell'isola	Fondo per le demolizioni e messa in sicurezza degli edifici colpiti dal sisma e dalla frana, per il recupero o lo smaltimento delle relative macerie.	3.000.000,00 €	- €	100%										


L'ordinanza speciale 3 approva il Piano degli interventi per il Comune di Forio, per un importo di € **10.641.354,63**. Individuando tre opere e lavori urgenti e di particolare criticità Nell'Ordinanza speciale al momento non è stato inserito l'intervento relativo ai "Lavori di realizzazione di edificio, a forte prefabbricazione, da destinare temporaneamente ad uso scolastico, in località Panza, nel Comune di Forio (NA)", a causa della mancata acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune, dell'area ove saranno realizzati i moduli definitivi. Pertanto, l'inserimento di questo intervento è rinviato ad una successiva ordinanza in deroga.

ELENCO INTERVENTI ORDINANZA SPECIALE N.3– Comune di Forio –DETTAGLIO DELLO STATO DI ATTUAZIONE														
CODICE IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE	QUADRO FINANZIARIO		PROGRAMMAZIONE e QUADRO ESIGENZIALE		PROGETTAZIONE				ESECUZIONE			CONCLUSIONE	
		Importi complessivi stanziati	Importi erogati	Nomina Soggetto Attuatore	Redazione DIP	Procedura di scelta del contraente per il servizio di progettazione ed esecuzione indagini		PFTE in attesa di progetto esecutivo		Progettazione conclusa		Procedura scelta ditta	Cantieri Avviati	Collaudo
							concluso	approvato in CdS	concluso	approvato in CdS				
CS-OS-FO-01	Lavori di miglioramento sismico e funzionale del Palazzo municipale di Forio (NA), ex convento di San Francesco.	2.200.000,00 €	- €	100%	100%	100%	100%	100%						
CS-OS-FO-02	Lavori di realizzazione di edificio, a forte prefabbricazione, da destinare temporaneamente ad uso scolastico, in località Baiola.	non è inserito in piano	- €	100%	100%	100%	100%	100%						
CS-OS-FO-03	Lavori di messa in sicurezza del tratto di costa a rischio idrogeologico, compresa tra il Promontorio del Soccorso e la località Pietre Rosse - 1° Stralcio.	7.121.196,25 €	- €	100%	100%	100%	50%							
CS-OS-FO-04	Lavori di miglioramento sismico del Plesso Scolastico Istituto Nautico "Cristoforo Mennella"	1.320.158,38 €	- €	100%	100%	100%	100%	100%						
Forio	Progetto di adeguamento funzionale della palestra della scuola media in via parroco Leonardo D'Abundo per realizzazione aule scolastiche provvisorie	489.864,20 €	- €	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%



Tabella 1: Ripartizione e stato di attuazione interventi in Ordinanze Speciali n.1, n.2, n.3 e n.5

Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

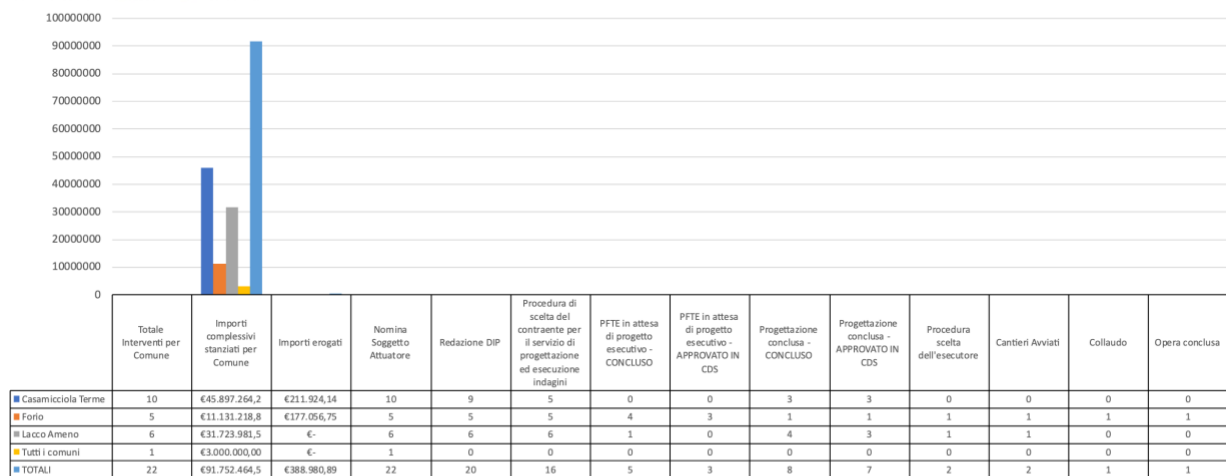

Stato di attuazione interventi post sisma

Ischia, 31/12/2023

Con l'ordinanza speciale 5 del 08/08/2023 è stato approvato l'intervento di "Adeguamento funzionale della palestra della scuola media in via parroco Leonardo D'Abundo" nel Comune di Forio, di importo complessivo pari a € 489.864,20 ed è stato individuato un vincolo di destinazione per l'importo di €3.000.000,00 finalizzato a far fronte all'avvio delle attività di demolizione e messa in sicurezza degli edifici colpiti dal sisma e dalla frana, nonché al recupero o allo smaltimento delle relative macerie.

Progetto di realizzazione di una vasca di colmata da riempire con materiale di risulta e realizzazione a mare dell'estensione dell'alveo tombato denominato "Pio Monte della Misericordia" con relativi adeguamenti urbanistici							
CODICE IDENTIFICATIVO	COMUNE	Tipologia intervento e sintetica descrizione tecnica	COSTO SINGOLE COMPONENTI DELL'INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO		STATO DI ATTUAZIONE	CRONOPROGRAMMA - STATO DI ATTUAZIONE
	Casamicciola Terme	REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI COLMATA DA RIEMPIERE CON MATERIALE SCIOLTO DA FRANA	2.421.527,68 €	5.966.091,93 €		IN CORSO	PFFE consegnato con Prot. n. 3567 del 02/10/2023. E' al tavolo tecnico per l'approvazione.
		REALIZZAZIONE A MARE DELL'ESTENSIONE DELL'ALVEO TOMBATO DENOMINATO "PIO MONTE DELLA MISERICORDIA" CON RELATIVI ADEGUAMENTI URBANISTICI	3.544.564,25 €				PFFE in corso
Interventi art. 3 e 4 - Ord. 5							
CODICE IDENTIFICATIVO	Comune Richiedente	Tipologia intervento e sintetica descrizione tecnica	COSTO SINGOLE COMPONENTI DELL'INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO		STATO DI ATTUAZIONE	CRONOPROGRAMMA - STATO DI ATTUAZIONE
	Forio	Progetto di adeguamento funzionale della palestra della scuola media in via parroco Leonardo D'Abundo per realizzazione aule scolastiche provvisorie	489.864,20 €	489.864,20 €		IN CORSO	Lavori conclusi. C'è stata inaugurazione dei locali
	Tutti i comuni dell'isola	Fondo per le demolizioni e messa in sicurezza degli edifici colpiti dal sisma e dalla frana, per il recupero o lo smaltimento delle relative macerie.	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €		DA AVVIARE	
TOTALE FINANZIATO 5b + 5c				3.489.864,20 €			

Con Ordinanza speciale n. 7, si è provveduto inoltre a finanziare nel Comune di Casamicciola, in via De Rivaz, un intervento urgente sulla rete fognaria, a causa dei danni causati dal sisma e dalla frana, e a dare corso al primo lotto per la demolizione dell'edificio già adibito a sede comunale, ex Capricho, nell'ambito dello stanziamento già disposto con ordinanza speciale n. 1/2023.

Oltre ai **22 interventi** individuati nelle **ordinanze speciali 1, 2e 3 e 5**, permane la previsione di **11 opere** ricomprese nei programmi elaborati dal precedente Commissario con le **ordinanze n. 9,11 e 14**. Di questi 2 sono situati nel comune di Lacco Ameno, 2 nel comune di Forio e 7 in quello di Casamicciola. Di questi ultimi, per uno il soggetto attuatore è la Regione Campania, per due è la Città Metropolitana di Napoli e per 4 il Comune di Casamicciola Terme.


ELENCO INTERVENTI RICOSTRUZIONE PUBBLICA SISMA (Ord. n.9, n.11 e n.14)												
UBICAZIONE E DENOMINAZIONE INTERVENTI			QUADRO FINANZIARIO			PROGETTAZIONE				ESECUZIONE		CONCLUSIONE
COMUNE	COCIDE IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE	Importi complessivi stanziati	Importi erogati	Procedura di scelta del contraente per il servizio di progettazione ed esecuzione indagini	PFTE in attesa di progetto esecutivo		Progettazione conclusa		Procedura scelta ditta	Cantieri Avviati	Opera conclusa
						concluso	approvato in CdS	concluso	approvato in CdS			
Lacco Ameno	OP/LA/04	Messa in sicurezza del sentiero naturalistico della collina di Montevico nel comune di Lacco Ameno. [Ordinanza n.14 del 29 ottobre 2020, "Primo stralcio del piano delle opere pubbliche dan-neggiate o seguita dagli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017.")	446.015,27 €	- €	100%	100%	100%					
Lacco Ameno	PS/LA/03	Istituto comprensivo Mennella (Scuola elementare + scuola materna) di via Pannella	1.648.963,01 €									
Casamicciola Terme	OP/CM/01	Lavori di ricostruzione del muro di contenimento posto a confine con la ex S.S. 270 (Isola Verde) KM 25 + 700 nel comune di Casamicciola	3.520.000,00 €									
Casamicciola Terme	OP/CM/01	Camera di Manovra adiacente il Serbatoio idrico di Casamicciola <i>scheda Aedes Esito EF</i>	302.241,06 €	- €	100%			100%	100%	100%	100%	
Casamicciola Terme	OP/RC/01	Rimozione macerie edificio crollato Via Serrato (completamento intervento urgente01/U/01 -	506.181,14 €	392.550,00 €	100%			100%	100%	100%	100%	100%
Casamicciola Terme	OP/CT/03	Ripristino e messa in sicurezza di via Gran Sentinella e via Iasolino	60.000,00 €		100%			100%				
Casamicciola Terme	PS/CAS/04	Scuola elementare De Gasperi	FONDI MIUR		100%			100%	100%	100%	100%	100%
Casamicciola Terme	PS/CAS/07	Edificio ex sede Centro per l'impiego	614.440,00 €									
Casamicciola Terme	PS/CAS/02	Istituto superiore Mattei	5.100.000,00 €	- €	100%							
Forio	PS/FOR/01	Istituto comprensivo Forio 2 - D'Abundo	1.997.456,48 €	- €	100%			100%	100%	100%	100%	
Forio	PS/FOR/02	Istituto comprensivo Forio 1 - Luca Bassofiore	4.120.794,84 €	- €	100%			100%	100%	100%	100%	

Considerando **lo stato di attuazione degli interventi** oggetto **delle ordinanze speciali**, come si evince dalla tabella 1, attualmente per 2 interventi nel comune di Casamicciola è stato redatto il DIP ed è in corso l'affidamento dei servizi di progettazione; per 16 interventi risultano affidati i servizi di progettazione e di esecuzione delle indagini. Di questi, sono stati consegnati 13 progetti (di cui 5 PFTE mentre per 8 è stata conclusa la progettazione) di cui 7 anche approvati o con iter di approvazione in corso. Inoltre, i lavori di adeguamento funzionale della palestra della scuola media in via parroco Leonardo D'Abundo nel comune di Forio sono stati conclusi; mentre sono in corso di esecuzione i lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico Principe di Piemonte a Lacco Ameno, per la quale l'ordinanza speciale n.2 ha finanziato i lavori di completamento.



Tabella 2: Ripartizione e stato di attuazione interventi in Ordinanze n.9, n.11 e n.14

Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

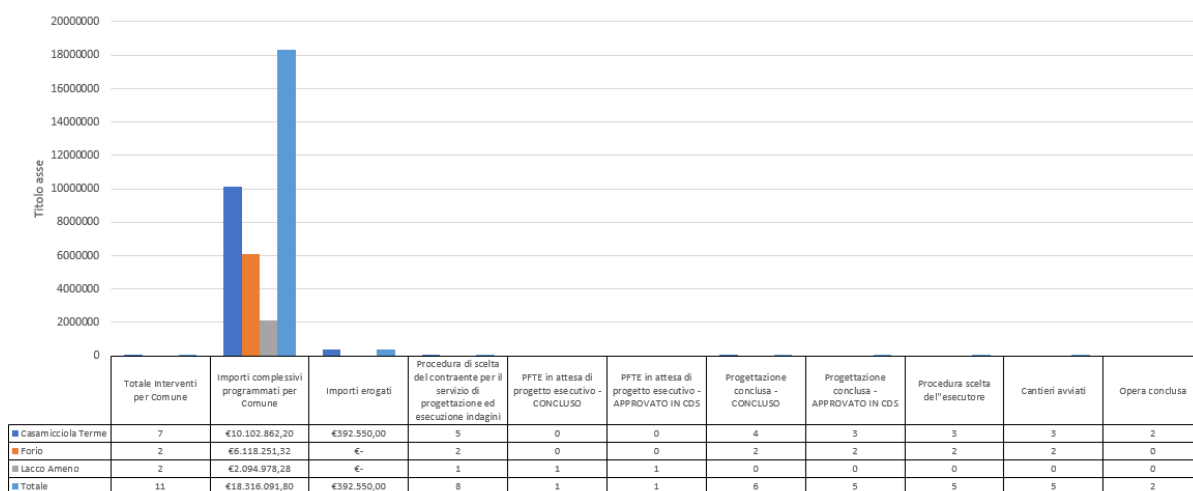

Stato di attuazione interventi post sisma

Ischia, 31/12/2023

Considerando **lo stato di attuazione degli interventi** oggetto **delle ordinanze 9,11 e 14**, come si evince dalla tabella 2, attualmente per 8 risultano affidati i servizi di progettazione e di esecuzione delle indagini. Di questi, per 5 interventi, oltre all'approvazione del progetto esecutivo, la fase di esecuzione dei lavori è la seguente:

- Per 2 interventi ubicati nel comune di Casamicciola Terme, relativi alla riparazione del danno della scuola G. De Gasperi e alla "Rimozione macerie edificio crollato Via Serrato" i lavori sono terminati.
- Per 2 interventi nel comune di Forio, relativi all'"Istituto comprensivo Forio 2 - D'Abundo" e all'"Istituto comprensivo Forio 1 - Luca Balsoglio" sono in corso i lavori
- Per 1 intervento nel comune di Casamicciola Terme il cui soggetto attuatore è La Regione Campania relativo alla "Camera di Manovra adiacente il Serbatoio idrico di Casamicciola" sono in corso i lavori.

In sintesi tra tutti gli interventi individuati con le Ordinanze speciali nn. 1, 2, 3, 5 e con le Ordinanze del precedente Commissario, ci sono 28 interventi avviati, per 24 dei quali è stata affidata la progettazione. Tra questi

- 3 interventi sono conclusi per un importo complessivo pari a € 996.045,24;
- 4 interventi con lavori in corso per un importo pari a € 7.152.492,38;

- 5 interventi il cui inizio dei lavori avverrà nei prossimi mesi pari a € 15.955.092,91

Per i restanti interventi dovrà essere conclusa o avviata la progettazione.

Nuova programmazione della riparazione e ricostruzione degli edifici di culto

La nuova programmazione di recupero degli edifici di culto danneggiati dagli eventi sismici, aggiornato sia nel numero che relativamente alle stime, è articolata nel modo che segue: i primi cinque cantieri per ricostruire e riparare quegli edifici di Culto danneggiati dal sisma del 2017 che già dispongono dei progetti esecutivi o definitivi, avvieranno i lavori nelle prossime settimane con una spesa complessiva di circa 5 milioni di euro.

Si tratta degli interventi di consolidamento e restauro delle Chiese di Sant'Antonio da Padova (703mila euro) e di San Pasquale Baylon detta Congrega di Sant'Anna (1.003.422,96 euro) a Casamicciola Terme, così come per le Chiese di Santa Lucia (440mila euro) e di San Domenico (300 mila euro) nel Comune di Forio. Oltre al complesso intervento di demolizione e ricostruzione della Chiesa di San Giuseppe al Fango (2.594.297 euro) a Lacco Ameno la cui progettazione definitiva, completata dallo stesso Comune, sarà successivamente alla definizione dell'esecutivo trasferita alla Diocesi di Ischia consentendole di assumere la responsabilità dell'attuazione dell'intervento.

Tabella degli interventi finanziati di immediata esecuzione già previsti dall'Ordinanza 15/2021								
Comune	Codice interv.	Edificio di Culto	Progetto	Q.E. come da Ordinanza 15/2021	Q. E. Aggiornato (a)	Anticipo spese tecniche erogate con Ordinanza 15/2021 - (b)	Stazione appaltante	Progettisti
C.T.	BC/CA/05	Chiesa Sant'Antonio da Padova	Esecutivo	450.000,00 €	703.984,56 €	15.000,00 €	Diocesi di Ischia	Soprintendenza
C.T.	BC/CA/03	Chiesa San Pasquale Baylon	Esecutivo	1.130.000,00 €	1.003.422,96 €	39.000,00 €	Diocesi di Ischia	Soprintendenza
Forio	BC/FO/01	Chiesa Santa Lucia	Esecutivo	440.000,00 €	440.000,00 €	12.000,00 €	Diocesi di Ischia	Soprintendenza
Forio	BC/FO/05	Chiesa San Domenico	Esecutivo	300.000,00 €	300.000,00 €	27.000,00 €	Diocesi di Ischia	Soprintendenza
L.A.	BC/LA/02	Chiesa San Giuseppe al Fango	Definitivo	1.627.843,78 €	2.594.297,79 €	44.383,08 €	Comune di Lacco Ameno poi Diocesi di Ischia per attuazione	Progettisti esterni
			tot.	3.947.843,78 €	5.041.705,31 €	137.383,08 €		

Gli ulteriori interventi, programmati ma non ancora finanziati, sono quelli risultanti dalle due seguenti tabelle:

Tabella degli interventi confermati nel programma già previsti dall'Ordinanza 15/2021								
Comune	Codice interv.	Edificio di Culto	Progetto	Q.E. come da Ordinanza 15/2021	Q. E. Aggiornato (a)	Anticipo spese tecniche erogate con Ordinanza 15/2021 - (b)	Stazione appaltante	Progettisti
C.T.	BC/CA/01	Chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio	N.A.	760.000,00 €	890.646,32 €	18.000,00 €	Diocesi di Ischia	Soprintendenza
C.T.	BC/CA/02	Chiesa di Santa Maria della Pietà	N.A.	1.080.000,00 €	1.332.522,12 €	24.000,00 €	Diocesi di Ischia	Soprintendenza
C.T.	BC/CA/07	Chiesa Santa Maria del Suffragio detta del Purgatorio	N.A.	514.938,00 €	514.938,00 €	15.701,40 €	Diocesi di Ischia	Comune C.T.
Forio	BC/FO/03	Chiesa parrocchiale di San Sebastiano	N.A.	605.000,00 €	714.721,65 €	16.500,00 €	Diocesi di Ischia	Soprintendenza
Forio	BC/FO/04	Chiesa di San Michele Arcangelo detta del Purgatorio	N.A.	1.245.000,00 €	1.527.487,58 €	43.500,00 €	Diocesi di Ischia	Soprintendenza
L.A.	BC/LA/01	Chiesa della SS. Annunziata	N.A.	690.000,00 €	825.646,01 €	27.000,00 €	Diocesi di Ischia	Soprintendenza
C.T.	BC/CA/05	Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maddalena	N.A.	4.565.380,00 €	5.550.361,00 €	0,00 €	Comune C.T.	Comune C.T.
C.T.	BC/CA/06	Chiesa dell'Immacolata	N.A.	1.450.000,00 €	1.450.000,00 €	45.000,00 €	Segretariato regionale del MIC	Soprintendenza
Forio	BC/FO/02	Chiesa di Santa Maria di Loreto	N.A.	1.900.000,00 €	1.900.000,00 €	44.383,08 €	Segretariato regionale del MIC	Soprintendenza
			tot.	12.810.318,00 €	14.706.322,68 €	234.084,48 €		

Tabella dei nuovi interventi del programma non già previsti nell' Ordinanza 15/2021								
Comune	Codice interv.	Edificio di Culto	Progetto	Q.E. come da Ordinanza 15/2021	Q. E. Aggiornato (a)	Anticipo spese tecniche erogate con Ordinanza 15/2021 - (b)	Stazione appaltante	Progettisti
C.T.	-	Chiesa di San Giuseppe - Don Orione	N.A.	-	1.303.549,87 €	-	Diocesi di Ischia	Diocesi di Ischia
L.A.	-	Chiesa Maria Assunta in cielo	N.A.	-	820.579,11 €	-	Diocesi di Ischia	Diocesi di Ischia
Forio	-	Chiesa di San Francesco d'Assisi	N.A.	-	603.433,05 €	-	Diocesi di Ischia	Diocesi di Ischia
			tot.	-	2.727.562,03 €	-		

Per gli interventi programmati sopra indicati, lo stato di avanzamento è il seguente:

Progetti esecutivi:

- **BC/CA/05:** Lavori di consolidamento e restauro della Chiesa di Sant'Antonio da Padova -Casamicciola Terme;
- **BC/FO/01:** Lavori di consolidamento e restauro della Chiesa di Santa Lucia – Forio;
- **BC/FO/05:** Lavori di consolidamento e restauro della Chiesa di San Domenico - Forio;
- **BC/CA/03:** Lavori di consolidamento e restauro della Congrega di Sant'Anna (San Pasquale Baylon) – Casamicciola Terme;

a) Progetti definitivi da approvare in Conferenza dei Servizi:

- **BC/LA/02:** Intervento di demolizione e ricostruzione della chiesa di San Giuseppe al Fango – Lacco Ameno;

b) Progetti in corso di elaborazione da parte della Soprintendenza di Napoli che avranno come stazione appaltante la Diocesi di Ischia:

- **BC/CA/01:** Chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio – Casamicciola Terme;

- **BC/CA/02:** Chiesa di Santa Maria della Pietà – Casamicciola Terme;
 - **BC/FO/03:** Chiesa parrocchiale di San Sebastiano - Forio;
 - **BC/FO/04:** Chiesa di San Michele Arcangelo detta del Purgatorio - Forio;
 - **BC/LA/01:** Chiesa della SS. Annunziata – Lacco Ameno.
- c) **Progetti in corso da parte della Soprintendenza- stazione appaltante Segretariato:**
- **BC/CA/06:** Chiesa dell’Immacolata – Casamicciola Terme;
 - **BC/FO/02:** Chiesa di Santa Maria di Loreto – Forio.
- d) **Progetto da avviare dal Comune di Casamicciola:**
- **BC/CA/05:** Basilica della Santa Maria della Maddalena;
- e) **Progetto da avviare da parte della Diocesi di Ischia:**
- **BC/CA/07:** Chiesa di Santa Maria del Suffragio detta del Purgatorio.
- f) **Progetti ad opera della Diocesi di Ischia - Studio di fattibilità:**
- Chiesa di San Giuseppe al Don Orione – Casamicciola Terme;
 - Chiesa di Santa Maria Assunta in Cielo - Lacco Ameno;
 - Chiesa di San Francesco d’Assisi – Forio.

Attività di pianificazione della ricostruzione

L'articolo 5-ter del dl 186/2022 stabilisce che le previsioni del piano degli interventi, approvato con ordinanza speciale del Commissario straordinario n. 4, integrano il Piano di ricostruzione post-sisma previsto dall'articolo 24-bis del D.L. 109/2018, mentre l'articolo 5-quater prevede che l'Autorità di bacino aggiorni gli strumenti di pianificazione per il contrasto del dissesto idrogeologico, provvedendo per stralci funzionali; il primo stralcio, che riguarda il territorio del Comune di Casamicciola, deve essere adottato entro sessanta giorni dall'approvazione del suddetto piano commissariale. L'Autorità di Bacino ha trasmesso il Progetto di Aggiornamento del Piano per l'Assetto Idrogeologico dell'Isola di Ischia - Primo Stralcio funzionale - Comune di Casamicciola Terme il 7 agosto 2023 alla Struttura Commissariale, alla Regione Campania, alla Città Metropolitana e al Comune di Casamicciola.

Il Commissario straordinario, il Comune di Casamicciola e la Regione Campania hanno inviato all’Autorità di Bacino le loro osservazioni, e sono state avviate le interlocuzioni al fine di pervenire

ad una conclusione condivisa, all'esito della quale l'Autorità di bacino dovrà approvare in via definitiva il Piano stralcio.

Nel corso degli incontri svolti, sono state condivise tra i tecnici della struttura commissariale, con il coordinamento del Vicecommissario ing. Gianluca Loffredo, le simulazioni relative alle propagazioni dei fenomeni di flusso iperconcentrato, relativi a fenomeni franosi, e dei fenomeni più squisitamente idraulici, constatando la sostanziale sovrapponibilità tra quelle elaborate dai Centri di competenza per conto del Commissario e quelle sottoposte dall'Autorità di bacino. L'Autorità ha condiviso le modellazioni elaborate dai Centri di Competenza, e si è convenuto sull'opportunità di svolgere approfondimenti su alcune aree (Cuccufriidu e Il Monaco in primis) le cui modellazioni dei fenomeni di crollo sono in fase di affinamento da parte del gruppo di esperti coordinato dal prof. Carcaterra. Anche per la parte idraulica si è riscontrata una sostanziale confluenza dei risultati. Per quanto attiene alla programmazione degli interventi, quelli previsti dal Piano approvato dal Commissario per il Comune di Casamicciola saranno ulteriormente implementati dalla programmazione dell'Autorità di bacino, in particolare nell'area confinante con Lacco Ameno, per la mitigazione di alcuni importanti fenomeni franosi, sulla cui valutazione gli esperti delle due strutture concordano. Infine, la struttura commissariale ha proposto una prima bozza di ambiti, conseguenti sia alle simulazioni che al piano di zonizzazioni dell'Autorità di bacino, che potrà costituire un primo passo per l'elaborazione del Piano di ricostruzione di competenza della Regione Campania, in particolare per gli aspetti riguardanti il dissesto idrogeologico oltre che per quelli legati al rischio sismico.

Con il completamento del Piano stralcio del PAI da parte dell'Autorità di Bacino, la Regione Campania sarà nelle condizioni di provvedere alla redazione del Piano di ricostruzione di cui all'art. 24-bis del decreto-legge 109/2018. Tali pianificazioni risultano non più procrastinabili per garantire il definitivo decollo della ricostruzione privata.

Riepilogo del fabbisogno e delle disponibilità finanziarie

Il fabbisogno finanziario complessivo necessario a completare gli interventi di ricostruzione post sisma 2017 pubblica e privata, quelli strutturali per la messa in sicurezza idrogeologica sull'isola di Ischia a seguito della frana del 26 novembre 2022, ammonta a circa euro 1.260.000.000,00.

La stima analitica del fabbisogno è quella che è stata dettagliatamente illustrata nel rapporto sulla ricostruzione post sisma e post frana del mese di Agosto 2023, pubblicato sul sito del Commissario Straordinario e formalmente trasmesso al Governo.

Nell'importo sopraindicato non sono ovviamente ricomprese le somme necessarie a far fronte agli interventi emergenziali post frana 2022, di competenza del Commissario delegato, che affluiscono ad altra contabilità speciale di cui si è dato conto nella parte descrittiva delle attività emergenziali.

Il totale stanziato per gli investimenti in conto capitale relativi alla ricostruzione ammonta ad euro 347.879.203,40, che vengono arrotondati per comodità a 348.000.000.

Pertanto, gli ulteriori finanziamenti necessari al completamento della ricostruzione post sisma e post frana per gli anni futuri sono pari alla differenza tra 1.260.000.000 e le somme sino ad oggi stanziate per investimenti di circa 348.000.000,00 ammontanti a circa euro 912.000.000.

Tenendo conto delle somme impegnate da ultimo con le ordinanze emanate nel corso del mese di dicembre 2023, le somme ulteriormente impegnabili per la ricostruzione pubblica e privata sono quelle risultanti dalla tabella di seguito riportata:

Anno	L. 197/2022 art. 1 c. 737	DL 186/2022 art. 5-ter c. 6	Somme impegnate	TOTALE Residuo finanziario Somme libere
2023			€ 5.658.612,96	€ 26.264.023,73
2024	€ 30.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 45.658.612,96	€ zero *
2025	€ 50.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 39.977.423,64	€ 20.022.576,36
2026	€ 80.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 80.000.000,00
2027	€ 20.000.000,00	€ -	€ -	€ 20.000.000,00
	€ 180.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 101.294.649,56	€ 146.286.600,09

Al fine di poter programmare nuovi interventi di ricostruzione pubblica e privata e di completare il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idrogeologica del territorio, è pertanto urgente che si provveda a nuovi stanziamenti, in particolare per le annualità 2024 e 2025.

Allegato 1 – Relazione finanziaria

Quadro delle risorse finanziarie disponibili

Il Commissario Straordinario è intestatario della contabilità speciale n. 6103 aperta dalla Banca d'Italia presso la Tesoreria dello Stato di Roma, sulla quale sono state trasferite, negli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, risorse dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero dello sviluppo economico e a seguito della cessazione dello stato di emergenza, dal Commissario delegato ex OCDPC 476/2017.

Come dettagliatamente riportato nella seguente tabella, alla fine dell'esercizio 2022, in attuazione di quanto previsto dall'art. 19 del D.L. n. 109/2018 convertito con L. 130/2018, risultava accreditata sulla contabilità speciale la somma complessiva di Euro 175.584.268,11.

Tabella : FONTI FINANZIAMENTI PREVISTE NELL'ART. 19 del D.L. 109/2018 E STANZIAMENTI NEL BILANCIO DELLO STATO

FONTI FINANZIAMENTI PREVISTE NELL'ART. 19 del D.L. 109/2018 E STANZIAMENTI NEL BILANCIO DELLO STATO						
	2018	2019	2020	2021	2022	TOTALI
STATO DI PREVISIONE MEF - Cap. 7461	9.690.000,00	59.380.000,00	49.690.000,00	20.000.000,00	7.170.000,00	145.930.000,00
STATO DI PREVISIONE MISE - Cap. 7492	5.000.000,00	5.000.000,00				10.000.000,00
TRASFERIMENTO DALLA CONTABILITA' SPECIALE EX COMMISSARIO DELEGATO OPCM 587/2019		19.654.268,11				19.654.268,11
TOTALE TRASFERITO SULLA CONTABILITA' SPECIALE 6103 NEL QUINQUENNIO 2018/2022						175.584.268,11

A tali risorse vanno aggiunti gli stanziamenti pluriennali previsti sia dall'ultima legge di bilancio n. 197 /2022, che dal DL 186/2022 sul post frana, di cui si darà conto di seguito.

Relativamente a quanto riportato nella Tabella di cui sopra "FONTI FINANZIAMENTI PREVISTE NELL'ART. 19 del D.L. 109/2018 E STANZIAMENTI NEL BILANCIO DELLO STATO" si specifica inoltre quanto segue.

Con riferimento alla disponibilità complessiva, l'importo è stato successivamente suddiviso tra le somme denominate "libere" in quanto prive di vincoli di destinazione specifici e pertanto utilizzabili per qualunque finalità nell'ambito di quelle attribuite al Commissario Straordinario, da quelle che, in virtù delle disposizioni normative primarie sono invece "vincolate" ad uno specifico utilizzo, ovvero in quanto destinate da precedenti provvedimenti commissariali a specifica destinazione.

In particolare, per l'esercizio 2022, lo stanziamento di parte corrente previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) all'art.1, commi 460 e 461 ammonta a Euro 7.170.000,00.

Per gli anni successivi al 2022, si riepilogano di seguito gli stanziamenti previsti sia dalla Legge di bilancio per il 2023 che dal Decreto Ischia:

TABELLA : STANZIAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2023 E DAL DECRETO ISCHIA

Anno	L. 197/2022 art. 1 c. 737	DL 186/2022 art. 5-ter c. 6	DL 186/2022 art. 5-sexies c. 3 (gestione fanghi)	TOTALI
2023	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 40.000.000,00
2024	€ 30.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ -	€ 40.000.000,00
2025	€ 50.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ -	€ 60.000.000,00
2026	€ 80.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ -	€ 90.000.000,00
2027	€ 20.000.000,00	€ -	€ -	€ 20.000.000,00
	€ 190.000.000,00	€ 40.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 250.000.000,00

Per l'anno 2023 occorre altresì aggiungere le seguenti ulteriori assegnazioni per le spese di parte corrente:

TABELLA : STANZIAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE DI BILANCIO PER IL 2023 E DAL DECRETO ISCHIA

DISPONIBILITA' DI PARTE CORRENTE ANNO 2023	
L. 197/2022 art. 1 commi 734 e 735	
Per le attivita' di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, e' autorizzata la spesa di 4,95 milioni (ASSISTENZA ALLA POLAZIONE)	€ 4.950.000,00
a) 1,4 milioni di euro per le finalita' di cui all'articolo 31 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; (SPESE DI STRUTTURA)	€ 1.400.000,00
b) 1,8 milioni di euro per le finalita' di cui all'articolo 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; (RINNOVO INVITALIA)	€ 1.800.000,00
c) 1 milione di euro per le finalita' di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130; (RIMBORSO TARI AI COMUNI)	€ 1.000.000,00
ASSESTAMENTO STATO DI PREVISIONE G.U. N. 30 DEL 04/10/2023	€ 5.000.000,00
RETTIFICA DI BILANCIO 2023 -STATO PREVISIONE MEF	€ 40.000,00
TOTALE	€ 14.190.000,00

DISPONIBILITA' FINANZIARIE

Al fine di individuare le disponibilità finanziarie residue per l'anno in corso e per gli anni successivi occorre procedere individuando le risorse disponibili alla data del 1° gennaio 2023, come di seguito illustrato:

TABELLA : RIEPILOGO DELLA DISPONIBILITÀ FINANZIARIA AL 1° GENNAIO 2023

Disponibilità finanziaria anno 2023	54.190.000,00
Residuo annualità precedente	101.974.939,31
TOTALE	156.164.939,31

così suddivise:

TABELLA : SUDDIVISIONE DELLA DISPONIBILITÀ FINANZIARIA

SOMME VINCOLATE	
1.000.000,00	Rimborso TARI
1.495.638,29	Spese struttura (compreso residuo anni precedenti)
1.800.000,00	Convenzione INVITALIA
4.950.000,00	Assistenza alla popolazione
20.000.000,00	Fanghi ex art. 5 sexies dl 186/2022
10.000.000,00	DL 186/2022 art. 5-ter c. 6
SOMME LIBERE	
116.919.301,02	

Per “somme libere” si intendono le disponibilità finanziarie non finalizzate per vincolo di legge o per provvedimenti del Commissario straordinario a specifici interventi ed utilizzabili per la ricostruzione pubblica e privata.

Durante l’anno 2023, sino all’approvazione dell’Ordinanza speciale n. 7 compresa, rispetto al residuo di somme libere al 1° gennaio 2023 pari ad euro 116.919.301,02, con provvedimenti del Commissario

Straordinario sono state destinate per investimenti relativi alla ricostruzione pubblica post sisma e post frana e alla ricostruzione privata post sisma e post frana, ulteriori somme che hanno comportato un impegno complessivo di euro 85.541.759,53, a valere sugli stanziamenti per l'anno 2023. Pertanto, alla data del 27 dicembre 2023 il residuo disponibile, per l'anno in corso, considerati anche gli impegni sopra indicati, ad euro 31.377.541,49.

Con riferimento agli anni successivi, (2024, 2025, 2026 e 2027) sia la legge di bilancio per il 2023 (articolo 1 comma 737 della legge 197 del 2022) che il cosiddetto Decreto Ischia (articolo 5 ter del decreto-legge 186 del 2022) hanno stanziato ulteriori somme, rappresentate nella tabella sottostante.

TABELLA : ULTERIORI SOMME DEL DECRETO ISCHIA

Anno	L. 197/2022 art. 1 c. 737	DL 186/2022 art. 5-ter c. 6	TOTALI
2024	€ 30.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 40.000.000,00
2025	€ 50.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 60.000.000,00
2026	€ 80.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 90.000.000,00
2027	€ 20.000.000,00	€ -	€ 20.000.000,00
	€ 180.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 210.000.000,00

Rispetto a tali somme, con le ordinanze speciali 1, 2, 3 e 4 sono state già impegnate parte delle risorse, sulla base della programmazione degli interventi previsti nei medesimi provvedimenti.

In particolare, rispetto alle singole annualità, gli importi impegnati per specifici interventi sono i seguenti:

Per il 2024 euro 45.658.612,96

Per il 2025 euro 39.977.423,64

*L'importo di euro 45.658.612,96 impegnato per l'anno 2024 supera lo stanziamento previsto per il medesimo anno per euro 5.658.612,96 importo che pertanto erode la disponibilità finanziaria per l'anno 2023 che deve essere ridotta per la medesima cifra da accantonare per le esigenze dell'anno successivo

Pertanto, la disponibilità finanziaria al netto della sopra indicata somma di euro 5.658.612,96 per l'anno 2023 alla data del 27 dicembre è pari ad euro 25.718.928,53.

La disponibilità finanziaria residua complessiva, anche considerando gli anni successivi, può pertanto essere riassunta nella seguente tabella:

TABELLA : DISPONIBILITÀ FINANZIARIA RESIDUA COMPLESSIVA

Anno	L. 197/2022 art. 1 c. 737	DL 186/2022 art. 5-ter c. 6	Somme impegnate	TOTALE Residuo finanziario Somme libere
2023			€ 5.658.612,96	€ 25.718.928,53
2024	€ 30.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 45.658.612,96	€ zero *
2025	€ 50.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 39.977.423,64	€ 20.022.576,36
2026	€ 80.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00	€ 80.000.000,00
2027	€ 20.000.000,00	€ -	€ -	€ 20.000.000,00
	€ 180.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ 101.294.649,56	€ 145.741.504,89

Per le altre somme vincolate per legge, il residuo disponibile, al netto dell'utilizzo di cassa è rappresentato dalla seguente tabella:

		utilizzo	residuo
€ 1.000.000,00	rimborso tari comuni	€ 865.969,05	€ 134.030,95
€ 1.495.638,29	spese di struttura+residuo 2022	€ 1.141.198,17	€ 354.440,13
€ 1.800.000,00	Invitalia	€ 1.800.000,00	-
€ 4.950.000,00	assistenza popolazione	€ 4.950.000,00	-
€ 20.000.000,00	fanghi dl 186 art. 5 sexies	€ 20.000.000,00	-
€ 10.000.000,00	dl 186/2022 art. 5-ter c. 6	€ 10.000.000,00	-

STANZIAMENTI SULLA CONTABILITÀ SPECIALE N. 6387 INTESTATA AL COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi del **DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 2018, n. 1 – Articolo 27 –
comma 2 e 3.**

Le risorse stanziare a valere sul Fondo emergenze nazionali di cui alla delibera prevista dall'articolo 24, comma 1 del D. Lgs. 1/2018, sono trasferite integralmente a seguito della nomina del Commissario Delegato sulla contabilità speciale aperta ai sensi del citato comma 1.

A tale riguardo, con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022 - Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA) a partire dal giorno 26 novembre 2022 - per l'attuazione dei primi interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 1 del 2018, è stato stanziato e trasferito al Commissario Delegato l'importo di **euro 2.000.000,00** a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso le ulteriori somme previste dalla delibera di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 vengono corrisposte ai sensi del comma 2 dell'articolo 27 del medesimo decreto legislativo: *“... nella misura del 50 per cento a seguito dell'emanazione della delibera medesima, mentre il restante 50 per cento all'attestazione dello stato di attuazione degli interventi finanziati...”*

L'Ordinanza n. 948 del 30 novembre 2022 - Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022 – all'art. 1, comma 4, ha previsto che il Commissario Delegato predisponga un primo piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile.

A seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, il Commissario Delegato con nota del 25 gennaio 2023, in ottemperanza al citato all'art. 24, comma 2, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, ha trasmesso la ricognizione delle misure urgenti per le attività di cui alle lettere a) e b) e per quelle relative alle lettere c), del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018.

Di seguito, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2023 lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, è stato integrato di **euro 54.200.000,00** a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo, come peraltro richiamate nell'Ordinanza n. 948/2022.

Le ulteriori somme previste dalla delibera di cui all'articolo 24, comma 2, sono state corrisposte nella misura del 50 per cento, pari ad **euro 27.100.000,00** a seguito dell'emanazione della delibera

medesima, mentre il restante 50 per cento sarà corrisposto all'attestazione dello stato di attuazione degli interventi finanziati.

In prosieguo, considerate le note del 25 gennaio 2023, del 13 aprile 2023 e del 24 aprile 2023 con le quali il Commissario Delegato ha trasmesso la ricognizione delle misure urgenti per le attività di cui alla lettera c), del comma 2 dell'art. 25 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018 con Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023 lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, è integrato di **euro 1.135.000,00** a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per le misure di cui alla lettera c) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto legislativo.

Su tale finanziamento, ai sensi del citato art. 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018, è stato accreditato il 50 per cento dell'importo pari ad **euro 567.500,00**.

Infine, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2023 lo stanziamento di risorse di cui all'art. 1, comma 3, della delibera del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022, è stato integrato di **euro 24.930.000,00** a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1 del 2018, per il completamento delle attività di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'art. 25 del medesimo decreto.

Su tale finanziamento, ai sensi del citato art. 27 del decreto legislativo n. 1 del 2018, è stato accreditato il 50 per cento dell'importo pari ad **euro 12.465.000,00**.

Ai sensi del citato articolo 27, comma 3, sulla contabilità speciale intestata al Commissario Delegato, può essere autorizzato il versamento di eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle stanziare a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, e rese disponibili dalle Regioni e dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Sulle medesime contabilità possono, altresì, confluire le risorse finanziarie eventualmente provenienti da donazioni, da altre amministrazioni, nonché dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

In merito, in attuazione della convenzione sottoscritta il 21 febbraio 2023, la Città Metropolitana di Napoli ha trasferito al Commissario Delegato risorse finanziarie pari ad **euro 1.000.000,00** per azioni ed interventi di protezione civile per il ripristino delle infrastrutture e della funzionalità dei servizi essenziali e la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità conseguenti agli eventi eccezionali del 26.11.2022 sull'Isola d'Ischia.

Successivamente, con **Ordinanza n. 12 del 26 maggio 2023** il Commissario Delegato ha dettato *“Disposizioni riguardanti la revisione della zonizzazione, la gestione del ciclo dei materiali di frana e il riuso, la nomina del soggetto attuatore per ulteriori e nuovi interventi di messa in sicurezza”*.

Nell'Ordinanza si richiama la **Deliberazione n. 624 della Giunta Regionale della Regione Campania del 29/11/2022** con la quale viene stanziato l'importo di **euro 4.000.000,00** da destinare per le finalità del pronto avvio di interventi prioritari per la tutela dei territori maggiormente colpiti dagli eventi alluvionali e franosi verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022.

Sulla base di intese tra il Commissario Delegato e la Regione Campania si è prevista la possibilità di utilizzare economie di gara relative all'intervento "Ripascimento delle spiagge dell'isola di Ischia", per euro **1.190.095,62** nella disponibilità del soggetto attuatore - Comune di Lacco Ameno, per la copertura economica della progettazione e dei lavori di dragaggio del porto di Casamicciola Terme.

In merito, nell'**Ordinanza n. 14 del 30 settembre 2023**, per l'intervento di dragaggio del Porto di Casamicciola, autorizzato per un importo complessivo di euro 3.212.000,00, lo stesso è stato coperto finanziariamente per euro 1.190.095,62, a valere sulle economie di gara dell'intervento "Ripascimento delle spiagge dell'isola di Ischia", nella disponibilità del soggetto attuatore di cui all'art. 2 dell'Ordinanza n.8, sulla base di intese tra il Commissario Delegato e la Regione Campania.

Infine, con l'emanazione dell'**Ordinanza n. 16 del 7 dicembre 2023** il Commissario delegato ha preso atto dell'approvazione del piano degli interventi urgenti rimodulato per un importo complessivo di euro **81.816.402,00**, in conformità a quanto approvato dal Capo Dipartimento della protezione civile con nota acquisita al prot. n. 3542E/CD/ISCHIA del 06/12/2023 (prot. DPC 63254-06/12/2023). Inoltre, sono stati ridefiniti i fabbisogni degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel Piano degli interventi.

Riepilogo delle fonti di finanziamento, delle movimentazioni di cassa e delle voci di impiego dei finanziamenti al 21 dicembre 2023

Con le tabelle successive viene fornita una rappresentazione riepilogativa delle fonti di finanziamento, delle movimentazioni di cassa e delle voci di impiego dei finanziamenti medesimi.

Nella tabella di seguito indicata, si rappresenta sinteticamente il riepilogo delle fonti normativa dalle quali scaturiscono le risorse nonché la quota di tali stanziamenti versata sulla Contabilità Speciale n. 6387 e le somme residue ancora da acquisire:

FONTI NORMATIVE RISORSE DI CUI AL FONDO NAZIONALE PER LE EMERGENZE - ART. 44 D.LGS 1/2018	IMPORTI STANZIATI	IMPORTI IN ENTRATA ALLA C.S. 6387	SOMME RESIDUE DA ACCREDITARE SULLA C.S. 6387
Delibera del Consiglio dei Ministri del 27 novembre 2022	€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	//
Delibera del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2023	€ 54.200.000,00	€ 27.100.000,00	€ 27.100.000,00
Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023	€ 1.135.000,00	€ 567.500,00	€ 567.500,00
Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2023	€ 24.930.000,00	€ 12.465.000,00	€ 12.465.000,00
Risorse finanziarie da bilancio Fondo per le emergenze nazionali	€ 82.265.000,00	€ 42.132.500,00	€ 40.132.500,00

FONTI NORMATIVE RISORSE DIVERSE DA QUELLE STANZIATE A VALERE SUL FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI DI CUI ALL'ARTICOLO 44 D.LGS 1/2018	IMPORTI STANZIATI	IMPORTI IN ENTRATA ALLA C.S. 6387	SOMME RESIDUE DA ACCREDITARE SULLA C.S. 6387
Deliberazione n. 624 della Giunta Regionale della Regione Campania del 29/11/2022	€ 4.000.000,00	//	€ 4.000.000,00

Deliberazione del 30/11/2022 n. 181 Convenzione Città Metropolitana di Napoli - Commissario delegato del 21/02/2023	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	//
Economie di gara relative all'intervento "Ripascimento delle spiagge dell'isola di Ischia"	€1.190.095,62	//	€1.190.095,62
Risorse finanziarie rese disponibili dalle Regioni e dagli enti locali interessati	€ 6.190.095,62	€ 1.000.000,00	€ 5.190.095,62

TOTALE RISORSE A DISPOSIZIONE DEL COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA OCDPC 948/22 (dati al 20 11 2023)	€ 88.455.095,62	€ 43.132.500,00	€ 45.322.595,62
---	------------------------	------------------------	------------------------

Riepilogo delle operazioni conseguenti al subentro del Commissario straordinario nelle misure precedentemente adottate dal Commissario delegato per la gestione dei fanghi.

Con l'emanazione del D.L. 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 2023, n. 9, all'art. 5-ter, comma 1, si è previsto che "Al fine di garantire, nell'isola di Ischia, il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, il Commissario straordinario di cui all'articolo 17 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, [...], agisce anche con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, limitatamente ai compiti regolati dal presente articolo [...]"

Per finalità di cui al D.L. 3 dicembre 2022, n. 186, convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 2023, n. 9, all'art. 5-ter al comma 6 è previsto per gli interventi di conto capitale l'autorizzazione alla spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.

Peraltro, all'art. 5-sexies - (Misure in materia di fanghi e inerti da colata) – è previsto che:

“1. Con riferimento alla gestione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all'evento calamitoso del 26 novembre 2022, il Commissario straordinario esercita i poteri di cui al comma 1 dell'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in deroga ai termini ivi previsti.

2. Con apposite ordinanze ai sensi del comma 1, il Commissario straordinario individua più siti destinati allo stoccaggio provvisorio.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa massima di 20 milioni di euro per l'anno 2023. Con le ordinanze commissariali adottate ai sensi del comma 1 è assicurato altresì il raccordo con le misure precedentemente adottate in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 dell'ordinanza

del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2022”.

Al riguardo, è stata emanata l’**Ordinanza speciale n. 5 dell’8 agosto 2023** ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 - Finanziamento interventi relativi alla gestione dei fanghi e dei materiali inerti da liquefazione e colata conseguenti all’evento calamitoso del 26 novembre 2022 di cui all’art. 5 - sexies del D.L. n. 186/2022 nonché altri interventi e misure di accelerazione post frana 2022 e post sisma 2017.

Nell’allegato 1 all’ordinanza sono elencati interventi per complessivi euro **12.615.412,81**.

Di seguito la tabella rappresentativa:

ALLEGATO 1			
progr	Comune Richiedente	Tipologia intervento e sintetica descrizione tecnica	Importo finanziabile sullo stanziamento di cui all’art. 5 sexies Legge 9/2023
1	Casamicciola Terme	Rimozione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all’evento calamitoso del 26 novembre 2022 e trasporto dello stesso presso i siti di stoccaggio provvisorio individuati sull’isola di Ischia	3.781.904,97 €
2	Casamicciola Terme	Trasporto e smaltimento presso siti di recupero al di fuori dell’isola di Ischia dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata rimosso a seguito degli eventi calamitosi del giorno 26 novembre 2022 e seguenti	5.885.482,24 €
3	Lacco Ameno	Rimozione di sabbia, pietrisco e fanghi rinvenuti lungo l’asse longitudinale della condotta fognaria mista, in materiale ceramico DNS00	219.600,00 €
4	Lacco Ameno	Interventi di pulizia e smaltimento fanghi sulla centrale ubicata sul corso Angelo Rizzoli angolo via Pannella mc30	36.600,00 €
5	Lacco Ameno	Interventi di pulizia e smaltimento fanghi sulla centrale denominata "piazza Salvatore Giardi" località Capitello	257.420,00 €
6	Lacco Ameno	Interventi di pulizia e smaltimento fanghi sulla centrale denominata Sombbrero che capta i reflui misti provenienti dall’alveo limitrofo denominato "La Rita"	358.680,00 €
6	Casamicciola Terme	Pulizia, dissabbiamento e ripristino del tratto terminale dell’alveo tombato "Pio Monte della Misericordia" lungo il tratto che parte da via Monte della Misericordia, attraverso la ex ss270 e sfocia sull’arenile in prossimità di piazza Anna de Felice (piazza Ancora)	220.500,00 €
8	Casamicciola Terme	Pulizia e dissabbiamento della centrale di sollevamento delle acque reflue denominata "Rittmann" nonché del pozzetto di confluenza posto immediatamente a monte della stessa, nei pressi di Piazza Marina	15.225,60 €
9	Casamicciola Terme/Lacco Ameno	Intervento di pulizia e rimozione materiale detritico sull’Alveo La Rita	900.000,00 €
10	Casamicciola Terme/Lacco Ameno	Intervento di pulizia e rimozione materiale detritico sull’Alveo Il Monaco	800.000,00 €
11	Casamicciola Terme/Forio	Intervento di pulizia e rimozione materiale detritico sull’Alveo Scialicco	140.000,00 €
			12.615.412,81 €

Al fine di assicurare il necessario raccordo con le misure precedentemente adottate dal Commissario delegato in attuazione di quanto previsto dall’articolo 5 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 2022, il Commissario straordinario provvede all’attuazione degli interventi di cui alla precedente tabella (allegato 1), subentrando per gli interventi già avviati dal Commissario delegato in tutti rapporti giuridici in corso, che proseguono agli stessi patti e condizioni già in essere senza che debbano essere adottati ulteriori atti o provvedimenti. Il Commissario straordinario, allo stato, ha erogato con propri decreti euro **6.935.101,21**.

Con Decreto n. **1822 del 14 dicembre 2023**, il Commissario straordinario ha effettuato una restituzione al Commissario delegato delle somme erogate in anticipazione, secondo la percentuale prevista nell’Ordinanza n. 9 del 10/03/2023, pari ad euro **2.656.317,17**, relativamente all’importo del

progetto CD – CT – 1 – 040, intervento di competenza del soggetto attuatore SMA Campania SpA, riportato nella tabella sopraindicata al n. progressivo 1 “Rimozione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all'evento calamitoso del 26 novembre 2022 e trasporto dello stesso presso i siti di stoccaggio provvisorio individuati sull'isola di Ischia” .

Stato di attuazione degli interventi al 21 dicembre 2023

La tabella successiva evidenzia, sotto il profilo finanziario, le movimentazioni di cassa relative agli stanziamenti della precedente tabella. Inoltre, vengono riportate le erogazioni relative al subentro del Commissario straordinario con le misure precedentemente adottate dal Commissario delegato per la gestione dei fanghi.

Importi accreditati sulla CS 6387 ai sensi dell'Art. 27 del D.Lgs 1/2018	Cassa	Importo erogato	Cassa residuo
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2022	€ 2.000.000,00	€ 11.391.832,12	€ 30.769.080,67
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2023	€ 27.100.000,00		
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 maggio 2023	€ 567.500,00		
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 ottobre 2023	€ 12.465.000,00		
DELIBERA REGIONE CAMPANIA del 29.11.2022 n.624	€ 0,00	€ 2.824.904,38	
DELIBERA CITTà METROPOLITANA del 30.11.2022 n.181	€ 1.000.000,00	€ 0,00	
ECONOMIE DI GARA RELATIVE ALL'INTERVENTO "RIPASCIMENTO DELLE SPIAGGE DELL'ISOLA DI ISCHIA"	€ 0,00	€ 803.000,00	
DECRETO N. 1822 DEL 14 DICEMBRE 2023 - RESTITUZIONE AL COMMISSARIO DELEGATO IMPORTO PROGETTO CD – CT – 1 – 040	€ 2.656.317,17		
TOTALI IMPORTI ACCREDITATI SULLA CS 6387 (CASSA)	€ 45.788.817,17	€ 15.019.736,50	€ 30.769.080,67
INTERVENTI RELATIVI ALLA GESTIONE DEI FANGHI E DEI MATERIALI INERTI DA LIQUEFAZIONE E COLATA	€ 12.615.412,81	€ 6.482.670,60	
TOTALE EROGATO PER GLI INTERVENTI		€ 21.502.407,10	

La tabella seguente individua le voci relative agli interventi finanziati e rimodulati. Per ogni voce è indicato l'importo erogato alla data di redazione della presente relazione ed il residuo da erogare:

id.	Voci di Fabbisogno	Rimodulazione con importo integrato con Delibera del 23/10/23 ed approvato con nota del 06/12/23.	Importo erogato	Importo residuo
1	Interventi di somma urgenza di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2 del D.Lgs 1/2018 già approvati nel Primo Piano degli Interventi Urgenti e Ulteriori Interventi di cui alle lettere a) e b) art. 25, comma 2	€ 68.204.174,94	€ 5.468.772,21	€ 62.735.402,73
2	Interventi ulteriori di cui alla lettera a) art. 25, comma 2	€ 312.692,97	€ 57.831,17	€ 254.861,80
3	Assistenza alberghiera e CAS art.2 OCDPC n. 948 (fino al 31 maggio 2023 - I e II semestre)	€ 6.600.000,00	€ 3.154.508,54	€ 3.445.491,46
4	Supporto Centri di Competenza art.1 comma 3 OCDPC n.951/22	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
5a	Lavoro straordinario artt.3 e 5 OCDPC 951/22 (primi 60 gg)	€ 110.000,00	€ 59.497,10	€ 50.502,90
5b	Prosecuzione oneri prestazioni lavoro straordinario (ulteriori 120 gg)	€ 205.631,91	€ 95.218,09	€ 110.413,82
6	Spese Organizzazioni di Volontariato (art.7 OCDPC 948/22)	€ 219.311,88	€ 0,00	€ 219.311,88
7	Gestione Rifiuti art.5 OCDPC n. 948/22	€ 2.700.000,00	€ 1.549.501,02	€ 1.150.498,98
8	Misure rafforzamento capacità operativa comune di Casamicciola			
8a	Contratti Tempo Determinato - art. 6 comma 1 OCDPC n.951/22	€ 200.000,00	€ 51.672,99	€ 148.327,01
8b	Costi di missioni - art. 6 comma 2 OCDPC n.951/22	€ 37.500,00	€ 0,00	€ 37.500,00
8c	Presidi territoriali - art. 1 OCDPC n.954/22	€ 160.000,00	€ 26.604,26	€ 133.395,74
8d	Piano Protezione Civile art.2 OCDPC n. 954/22	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00
9	Nomina vice-commissario (art.8 OCDPC n.951)	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00
10	Supporto individuazione interventi lettera d) (art.1 comma 4 OCDPC n.963/23)	€ 400.000,00	€ 160.000,00	€ 240.000,00
11	Attività tecniche per il rilievo del danno (art.1 comma 4 OCDPC n.963/23)	€ 75.000,00	€ 39.215,00	€ 35.785,00
12	Ulteriori professionalità (art.5 comma 4 OCDPC n.951)	€ 631.666,67	€ 95.533,34	€ 536.133,33
13	Spese di missione al personale utilizzato per l'Emergenza (art.5 comma 3 OCDPC n.951/22)	€ 248.000,00	€ 41.507,01	€ 206.492,99
14	Prime spese trasporto marittimo	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00
15	Spese funerarie (art.9 OCDPC n. 948/22)	€ 18.000,00	€ 18.000,00	€ 0,00
16	Spese al personale del corpo dei VVF utilizzato per l'Emergenza	€ 698.021,63	€ 250.000,00	€ 448.021,63

17	Misure di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 25 del decreto legislativo n.1/2018 (O.C. 4 e 22)	€ 686.402,00	€ 776.402,00	-€ 90.000,00
Risorse finanziarie da bilancio Fondo per le emergenze nazionali		€ 81.816.402,00	€ 11.844.262,73	€ 69.972.139,27
18	CONVENZIONE CON CITTA' METROPOLITANA (finanzia interventi fuori piano) delibera del 30.11.22 n.181	€ 1.000.000,00	€ 0,00	€ 1.000.000,00
19	GIUNTA REGIONE CAMPANIA (finanzia interventi dragaggio e pulizia alvei) delibera del 29.11.22 n.624	€ 4.000.000,00	€ 2.824.904,38	€ 1.175.095,62
20	Economie di gara relative all'intervento "Ripascimento delle spiagge dell'isola di Ischia" – (finanzia parte dell'intervento di dragaggio del porto di Casamicciola Terme) art. 6 comma 1 lett. A dell'Ordinanza 14 del 30 settembre 2023	€ 1.190.095,62	€ 803.000,00	€ 387.095,62
Totale risorse a disposizione del Commissario delegato emergenza ocdpc 948/22 al 20 11 2023		€ 88.006.497,62	€ 15.472.167,11	€ 72.534.330,51
Totale risorse destinate dal Commissario straordinario per gli interventi relativi alla gestione dei fanghi e dei materiali inerti da liquefazione e colata conseguenti all'evento calamitoso del 26 novembre 2022 di cui all'art. 5 - sexies del D.L. n. 186/2022 nonché altri interventi e misure di accelerazione post frana 2022 e post sisma 2017		€ 12.615.412,81	€ 6.935.101,21	€ 6.132.742,21
TOTALE EROGATO			€ 21.954.837,71	

In merito al finanziamento regionale, di cui alla delibera del 29.11.22 n.624, è stata inviata alla Regione Campania comunicazione nella quale si richiede il nulla osta ad utilizzare euro **1.978.095,62** per la copertura degli interventi di cui all'**Ordinanza commissariale n.9 del 10 marzo 2023** che assegnano a SMA Campania, in qualità di soggetto attuatore, tra gli altri, i seguenti interventi:

- CD-CT-1-006 - Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone al di sopra della via Eddomade-Casa Siano;
- CD-CT-1-007 - Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento del costone sottostante la strada Viale Paradisiello e soprastante la strada Rampe Paradisiello;

- CD-CT-1-008 - Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone sottostante la strada via Selva Pera.

Da tale importo suddetto è stata erogata, allo stato, la somma pari ad euro **803.000,00** a titolo di anticipazione, nella misura del 50% dell'importo del decreto di liquidazione n. 128/2023 del Commissario delegato per complessivi euro 1.606.000,00, ovvero per la copertura economica della progettazione e dei lavori di dragaggio del porto di Casamicciola Terme.

Le economie di gara relative all'intervento "Ripascimento delle spiagge dell'isola di Ischia", pari a euro **1.190.095,62** nella disponibilità del soggetto attuatore - Comune di Lacco Ameno, sulla base di intese tra il Commissario Delegato e la Regione Campania con l'**Ordinanza n. 14 del 30 settembre 2023**, sono state utilizzate a copertura parziale dell'intervento di dragaggio del Porto di Casamicciola, autorizzato per un importo complessivo di euro 3.212.000,00 nella misura del 50% dell'importo liquidato con decreto n. 128/2023 del Commissario delegato per complessivi euro **803.000,00**.

Allegato 2 - Elenco ordinanze

Dal suo insediamento, nel febbraio 2022, il Commissario Straordinario ha emanato 10 ordinanze in materia di ricostruzione e 7 ordinanze speciali; in qualità di Commissario delegato per gli interventi urgenti post-frana del novembre 2022, le ordinanze finora emanate sono 16. Di seguito l'elenco.

Ordinanze del Commissario straordinario

Ordinanza n. 16 del 28 febbraio 2022 – Atto integrativo e di proroga della convenzione con Invitalia
Il supporto di Invitalia alle attività del Commissario è previsto dall'art. 18 del decreto-legge n. 109/2018

Ordinanza n. 17 del 31 maggio 2022 – Misure per la semplificazione e l'accelerazione degli interventi per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma del 2017 nei Comuni dell'isola di Ischia. L'ordinanza ridisegna le procedure e istituisce una Conferenza speciale dei servizi; i professionisti sono incaricati di attestare e asseverare la conformità urbanistica dei progetti di ricostruzione, la congruità tecnico-economica e l'entità del contributo; per la conclusione dei procedimenti amministrativi sono stabiliti tempi certi e definiti; viene disciplinata una procedura trasparente e concentrata per l'esame dei condoni; è affermato il principio in base al quale le

ricostruzioni conformi al preesistente di edifici non vincolati non necessitano di preventiva autorizzazione paesaggistica; sono definiti i “livelli operativi” di gran parte degli edifici danneggiati, sulla base di uno studio analitico redatto dal Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e l’Architettura dell’Università Federico II di Napoli

Ordinanza n. 18 del 31 agosto 2022 - Misure in favore delle imprese danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017 ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno e disposizioni sui termini. L’ordinanza disciplina i contributi per la riduzione o perdita di fatturato conseguente al sisma del 2017 per le imprese nei tre comuni colpiti, e per la perdita di reddito delle PMI; sono altresì previsti i contributi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche, sia per inagibilità dei locali ove erano ubicate, che per la necessità di sgombrare gli stessi per svolgere i necessari lavori di ripristino; sono inoltre disciplinati i contributi per gravi danni alle scorte e beni mobili strumentali all’attività di impresa.

Ordinanza n. 19 del 6 ottobre 2022 - Organizzazione della Struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell’isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017.

Ordinanza n. 20 del 16 dicembre 2022 - Proroga dei termini per la presentazione e l’esame delle domande di risarcimento dei danni causati dagli eventi sismici a far data dal 21 agosto 2017 nell’isola di Ischia. In seguito al verificarsi degli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, l’ordinanza dispone la proroga di 45 giorni di tutti i termini relativi alla presentazione e all’esame della domanda di contributo per i danni causati dagli eventi sismici.

Ordinanza n. 21 del 16 febbraio 2023 - Approvazione dello schema di Convenzione tra il Commissario straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 ed Invitalia per l’assistenza tecnica e specialistica a supporto delle funzioni affidate al Commissario medesimo con il decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, convertito con modificazioni dalla legge 16 Novembre 2018, n. 130. L’ordinanza approva la nuova convenzione con Invitalia per il supporto alle attività del Commissario straordinario, già prevista dal decreto-legge 109/2018, tenendo conto di quanto previsto dall’Ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile (OCDPC) n. 948/2022, che in seguito agli eventi catastrofici del 26 novembre 2022 ha assegnato al Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma la funzione di Commissario delegato per l’emergenza sull’Isola di Ischia.

Ordinanza n. 22 del 26 maggio 2023 - Misure per il primo ripristino del tessuto abitativo e produttivo danneggiato dall'evento alluvionale del 26 novembre 2022 e disposizioni sui termini dell'ordinanza n.18 del 31 agosto 2022. L'ordinanza prevede le procedure per richiedere i contributi a sostegno della ripresa del tessuto economico e sociale sull'isola: cittadini e imprese possono ricevere l'indennizzo integrale dei danni conseguenti agli eventi eccezionali del 26 novembre 2022, ed è concessa la copertura del 100% anche per gli interventi esterni di messa in sicurezza. I lavori di ripristino e messa in sicurezza possono riguardare anche le aree esterne agli edifici: si possono ricostruire muri perimetrali e di contenimento, bonificare le aree interne alle proprietà invase dal fango, ripristinare i servizi di luce, gas, acqua, realizzare rapidi interventi su porzioni di versante che incombono sugli edifici. Il contributo integra le eventuali anticipazioni già concesse per un massimo di 20.000 euro per le imprese e 5.000 euro per i privati, come previsto con ordinanza di protezione civile. In assenza di una norma di legge specifica, il Commissario straordinario ha ritenuto di fare ricorso ai poteri conferiti, in esito anche al parere reso dal Dipartimento nazionale di protezione civile, e alle risorse presenti nella contabilità speciale, al fine di garantire la immediata operatività alle misure.

Ordinanza n. 23 del 29 giugno 2023 - Organizzazione della Struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dell'isola di Ischia interessati dal sisma del 21 agosto 2017. Dopo l'emanazione dell'ordinanza n. 19/2022 che ne disciplinava l'organizzazione, si è reso necessario riconfigurare la Struttura a supporto delle attività del Commissario straordinario. Gli eventi catastrofici del novembre 2022, e il decreto-legge n. 186/2022, hanno infatti inciso sensibilmente sulle funzioni e sul personale assegnato.

Ordinanza n. 24 del 21 luglio 2023 – Delocalizzazioni degli edifici danneggiati o distrutti ad uso abitativo o produttivo. L'ordinanza disciplina le delocalizzazioni, prevedendo procedure e modalità di richiesta del relativo contributo, prevedendo anche la possibilità di delocalizzazione volontaria.

Ordinanza n. 25 del 12 dicembre 2023 (in fase di registrazione alla Corte dei Conti) – Misure di completamento ed armonizzazione delle procedure e dei termini relativi alla presentazione delle domande di contributo per la riparazione ricostruzione e delocalizzazione degli edifici danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017 e dagli eventi determinati dalla frana del 26 novembre 2022. Viene introdotto il principio della correlazione fra il diritto a percepire il CAS e le scadenze della presentazione dei progetti di ricostruzione o delle istanze di delocalizzazione. Le date di scadenza saranno fissate con successivi decreti del Commissario. La scadenza definitiva per le manifestazioni di volontà è fissata al 15 gennaio 2024. Viene introdotta la possibilità di presentare domande preliminari per la determinazione del contributo di delocalizzazione, ed è prorogato al 30 aprile il termine per la presentazione delle domande di delocalizzazioni volontarie. Viene adottata la

piattaforma Ge.Di.Si per tutte le richieste di contributo. Viene definitivamente equiparata la ricostruzione post sisma e quella post frana; per gli edifici gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali del 2022 si applicano le disposizioni dell'ordinanza n.17 del 2022. Viene fissato al 15 gennaio 2024 il nuovo termine per l'invio di manifestazioni di volontà ad alienare compendi immobiliari da destinare alla delocalizzazione. Viene introdotta una specifica disciplina per la concessione del contributo riservata ai "collabenti" di interesse culturale. Viene ampliata agli edifici con danni lievi in aree ad elevato rischio idrogeologico la possibilità di delocalizzazione. Infine, vengono resi disponibili strumenti digitali ed informatici per la comunicazione ai cittadini (Geoportale) e per il più efficiente svolgimento delle Conferenze dei servizi (sistemi di condivisione dati).

Ordinanze speciali del Commissario straordinario

L'art. 13 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, al comma 4-bis stabilisce che il Commissario straordinario esercita le sue funzioni anche con i poteri di ordinanza già previsti dalla normativa sul sisma Centro Italia, ed estende alla ricostruzione post-sisma a Ischia la possibilità di utilizzo degli speciali poteri derogatori previsti dal decreto-legge n. 76/2020.

In attuazione di tali disposizioni sono state emanate, nel mese di aprile 2023, tre ordinanze speciali in deroga per i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio, al fine di introdurre ulteriori semplificazioni e accelerazioni delle procedure:

Ordinanza speciale n. 1 dell'11 aprile 2023, per il Comune di Casamicciola Terme approva n. 10 interventi urgenti e di particolare criticità, per un importo complessivo di circa 46 milioni.

Ordinanza speciale n. 2 dell'11 aprile 2023, per il Comune di Lacco Ameno prevede n. 6 interventi complessivamente per 32 milioni di euro circa.

Ordinanza speciale n. 3 dell'11 aprile 2023, per il Comune di Forio prevede n. 3 interventi per un totale di 11 milioni di euro circa. Maggiori dettagli sugli interventi previsti dalle Ordinanze speciali si trovano nel paragrafo 6.5.

Ordinanza speciale n. 4 del 31 maggio 2023, contenente l'approvazione del programma degli interventi urgenti sul dissesto idrogeologico nel Comune di Casamicciola per un importo complessivo di euro 138.000.000, riguardante 70 interventi, oltre alla ricognizione degli interventi sul dissesto riguardanti gli altri 5 comuni per un importo di 216 milioni di euro.

Ordinanza speciale n. 5 dell'8 agosto 2023, contenente l'approvazione di un nuovo elenco di interventi sulla gestione dei fanghi da frana nei Comuni di Casamicciola e Lacco Ameno, comprensivo dell'intervento infrastrutturale denominato "waterfront" nel Comune di Casamicciola,

della realizzazione di 7 aule provvisorie nel Comune di Forio e di un fondo per l'avvio delle demolizioni degli edifici danneggiati sia dal sisma che dalla frana, per un importo complessivo di oltre 22 milioni di euro.

Ordinanza speciale n. 6 del 23/12/2023 (in fase di registrazione alla Corte dei Conti): Rimodulazione del quadro degli interventi d/a effettuarsi sulle chiese e sugli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti danneggiati a seguito degli eventi sismici dell'Isola di Ischia del 21 agosto 2017. Disciplina delle procedure realizzative degli interventi. Con l'ordinanza si approva la nuova programmazione attuativa, si individuano i soggetti attuatori e disciplinano le modalità degli interventi. Le Chiese che entrano a far parte della nuova programmazione attuativa sono 17, mentre con la precedente ordinanza 15/2021 erano 14, ed è previsto l'avvio dei primi 5 cantieri più urgenti (due a Casamicciola, due a Forio e uno a Lacco Ameno) finanziati per oltre 5 milioni di euro. Con l'ordinanza, che aggiorna la programmazione prevista dalla precedente del 2021, sono disciplinate anche le relative procedure, applicando la normativa della ricostruzione pubblica per la progettazione, e quella della ricostruzione privata nella fase attuativa, come già previsto in Centro Italia. La Diocesi di Ischia è individuata quale soggetto attuatore di 14 dei 17 interventi programmati. Sono inoltre introdotte misure di accelerazione e snellimento delle procedure, oltre alla possibilità per il soggetto attuatore di nominare professionisti a supporto dell'attuazione.

Ordinanza speciale n. 7 del 29/12/2023: completamento del "piano fanghi", finanziamento del progetto di riuso dei fanghi finalizzato alla realizzazione di un Parco urbano e riqualificazione dell'area a Forio, nomina del Comune di Casamicciola quale soggetto attuatore per n. 8 progetti di cui all'ordinanza speciale n. 4 e per il progetto relativo all'alveo La Rita; realizzazione del primo stralcio del Waterfront di Casamicciola, finanziamento dell'intervento urgente in via De Rivaz e primo lotto demolizione edificio ex Capricho.

Ordinanze emanate dal Commissario delegato

Ordinanza n. 1 del 3 dicembre 2022 - individuazione dei Soggetti attuatori per le attività emergenziali.

Ordinanza n. 2 del 17 dicembre 2022 - interventi di somma urgenza per la viabilità provvisoria sulla SS270.

Ordinanza n. 3 del 20 dicembre 2022 - attività di rimozione dei fanghi e detriti e per il riuso dei materiali.

Ordinanza n. 4 del 30 dicembre 2022 - zonazione, misure di protezione civile e di sostegno al tessuto economico e sociale; allegata mappatura zonizzazione.

Ordinanza n. 5 del 26 gennaio 2023 - designazione di SMA Campania Spa quale soggetto attuatore per i primi interventi di riduzione del rischio residuo.

Ordinanza n. 6 del 15 febbraio 2023 - misure riguardanti il riuso dei materiali litoidi e lignei derivanti dall'evento franoso del 26 novembre e misure relative ad ulteriori interventi emergenziali.

Ordinanza n. 7 del 24 febbraio 2023 - nuova scheda 'AeDEI Ischia 2023' che dà avvio alle attività di valutazione dell'impatto degli eventi calamitosi e maggiore collaborazione tra la Struttura commissariale e i Centri di Competenza e le Università, chiamati a concorrere alla redazione del Piano sugli interventi urgenti, così come alla revisione della zonizzazione.

Ordinanza n. 8 del 25 febbraio 2023 - misure di semplificazione, accelerazione ed attuazione delle attività di caratterizzazione, progettazione, dragaggio e riutilizzo dei sedimenti del Porto di Casamicciola Terme.

Ordinanza n. 9 del 10 marzo 2023 - disposizioni attuative degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel Piano degli interventi e ulteriori disposizioni.

Ordinanza n. 10 del 17 marzo 2023 - per la riapertura di Piazza Bagni e modifica della zonizzazione, sulla base della relazione del gruppo tecnico e delle Università e Centri di competenza, nonché dei risultati delle rilevazioni mediante schede "AeDEI Ischia 2023".

Ordinanza n. 11 del 21 aprile 2023 - disposizioni riguardanti l'individuazione quale soggetto attuatore di E.V.I. S.p.A. e la durata dei siti di deposito temporaneo nonché proroga termini.

Ordinanza n. 12 del 26 maggio 2023 - disposizioni riguardanti la revisione della zonizzazione, la gestione del ciclo dei materiali di frana e il riuso, la nomina del soggetto attuatore per ulteriori e nuovi interventi di messa in sicurezza.

Ordinanza n. 13 del 15 giugno 2023 - Intervento di sistemazione e messa in sicurezza del versante prospiciente l'ex SS270 nel comune di Casamicciola Terme. Revoca della nomina della Città Metropolitana di Napoli quale soggetto attuatore e individuazione in sostituzione del Comune di Casamicciola Terme – Disposizioni attuative conseguenti. Intervento di ricostruzione muro contenimento nell'alveo torrente Cuccufriddu. Revoca della nomina del Comune di Casamicciola quale soggetto attuatore ed individuazione, in sostituzione di SMA Campania S.p.A. Disposizioni attuative conseguenti.

Ordinanza n. 14 del 30 settembre 2023 - Disposizioni riguardanti l'abbruciamento di residui vegetali, la semplificazione delle attività di cessione materiali litoidi e lignei, i contributi per danni a veicoli, le rendicontazioni e disposizioni finanziarie.

Ordinanza n. 15 del 31 ottobre 2023 - Disposizioni attuative degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel Piano degli interventi e ulteriori disposizioni. Stabilisce l'aumento delle anticipazioni fino al 50%, e semplificazioni in materia di rendicontazioni da parte dei soggetti attuatori, anche al fine di consentire la più rapida erogazione delle somme alle imprese che hanno svolto i lavori.

Ordinanza n.16 del 7 dicembre 2023 - Presa d'atto dell'approvazione del piano degli interventi urgenti rimodulato e ridefinizione fabbisogni degli interventi di somma ed estrema urgenza previsti nel Piano degli interventi. L'ordinanza prevede 21 nuovi interventi di somma ed estrema urgenza per la messa in sicurezza del territorio e la mitigazione del rischio idrogeologico a Ischia. Passa, quindi, da 166 a 187 il numero complessivo degli interventi previsti per tutti i sei comuni dell'isola, con un aumento delle risorse per i lavori da 46 a 68 milioni di euro.
