

Stato attuazione interventi post frana e post sisma



Aggiornamento: agosto 2024





Piano interventi ODPC 948/22 – STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

Comune di Casamicciola Terme

Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		

CODICE IDENTIFICATIVO	COMUNE	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO
CD-CT-0-001	CASAMICCIOLA TERME	Assistenza operatori	Comune di Casamicciola Terme	Eseguito	100.000,00 €	100%
CD-CT-0-003	CASAMICCIOLA TERME	Delimitazione della sede viaria, 1° disgaggio della scarpata al km 26+000 relativa alla frana in direz Lacco	Citta Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Eseguito	300.000,00 €	100%
CD-CT-0-005	CASAMICCIOLA TERME	Ex SS 270 Isola Verde altezza km 28+800, rimozione rete, taglio arbusti, disgaggio parti di costone, rimozione materiale accumulato/detriti nel tempo e in occasione degli ultimi eventi, oltre pulizia di una parte della scarpata. Con uno sviluppo li	Citta Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Eseguito	30.000,00 €	100%
CD-CT-0-006	CASAMICCIOLA TERME	Sp 123 Circumv.ne in Casamicciola	Citta Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Eseguito	15.000,00 €	100%
CD-CT-1-001	CASAMICCIOLA TERME	Ulteriori interventi, espletati e in corso, di rimozione e trasporto ai siti di stoccaggio provvisorio delle strade e spazi pubblici e privati dal fango e dai detriti a seguito della frana del ed interventi provvisionali di messa in sicurezza 26/11/22	Comune di Casamicciola Terme	Eseguito	2.000.000,00 €	100%
CD-CT-1-002	CASAMICCIOLA TERME	Intervento da attuare nell'immediatezza per il rifacimento impianto di pubblica illuminazione con sostituzione delle linee di alimentazione invase dai fanghi, dai pali danneggiati, dei corpi illuminanti, dei quadri elettrici in via SS270, piazzale Ancora	Comune di Casamicciola Terme	In corso Lavori	1.300.000,00 €	30%
CD-CT-1-003	CASAMICCIOLA TERME	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento di versante sovrastante l'Alveo Negroponte, per un fronte di circa mt 70,00 ed un'altezza media di mt 17,00. , Primi interventi di messa in sicurezza	SMA Campania Spa	In corso Lavori	975.858,00 €	70%
CD-CT-1-004	CASAMICCIOLA TERME	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento versante a monte ed a valle Il traversa Santa Barbara, per un fronte di circa mt 300 ed un'altezza di mt 30,00 , I fase	SMA Campania Spa	Eseguito	764.695,91 €	100%
CD-CT-1-005	CASAMICCIOLA TERME	Ripristino condizioni ante eventi alluvionali tratto viario Piazza Bagni, Via Monte della Misericordia, Piazzale Anna de Felice (Piazzale Ancora) ,Ripristino fontana decorativa, rifacimento aiuole, marciapiedi, muri di cinta, parapetti, ringhiere ed arre	Comune di Casamicciola Terme	In corso Lavori	1.170.000,00 €	50%
CD-CT-1-009	CASAMICCIOLA TERME	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone localita Valle del Cotto per una lunghezza di circa mt 50,00 ed un'altezza di circa mt 20,00 ,Primi interventi di messa in sicurezza	SMA Campania Spa	In corso Lavori	87.206,98 €	95%
CD-CT-1-010	CASAMICCIOLA TERME	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento via Vicinale Castanito, localita Piccola Sentinella	SMA Campania Spa	In corso Lavori	116.267,77 €	10%
CD-CT-1-011	CASAMICCIOLA TERME	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone sovrastante via Monte della Misericordia per una lunghezza di circa mt 30,00 ed un'altezza media di circa mt. 10,00 ,Primi interventi di messa in sicurezza	SMA Campania Spa	In corso Lavori	669.743,16 €	60%
CD-CT-1-012	CASAMICCIOLA TERME	Intervento da attuare nell'immediatezza gia previsto un primo intervento dal Genio Civile di Napoli, vedi nota prot. 14384 del 21/12/2022, che prevede la realizzazione una barriera paramassi	Comune di Casamicciola Terme	In corso Lavori	1.420.000,00 €	20%



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		

CODICE IDENTIFICATIVO	COMUNE	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO
CD-CT-1-015	CASAMICCIOLA TERME	Intervento di ricostruzione muro di contenimento sovrastante Corso Vittorio Emanuele tra il civico 68 e 74 per una lunghezza di circa m. 15,00 ed un'altezza di circa m. 3,00 , Primi interventi di messa in sicurezza	SMA Campania Spa	Eseguito	10.506,64 €	100%
CD-CT-1-016	CASAMICCIOLA TERME	Intervento di ricostruzione muro di contenimento alla strada via Celario (oltre frana)	Comune di Casamicciola Terme/ Commissario Delegato	Lavori da affidare	350.000,00 €	10%
CD-CT-1-017	CASAMICCIOLA TERME	Intervento di ricostruzione muro di contenimento con sovrastante parapetto alla strada via Epomeo nel tratto in prossimita dell'Alveo Torrente Cuccufrido, per una lunghezza di circa mt 40,00 ed un'altezza media di circa mt 3,00	Comune di Casamicciola Terme/ Commissario Delegato	Lavori da affidare	850.000,00 €	10%
CD-CT-1-019	CASAMICCIOLA TERME	Intervento da attuare nell'immediatezza di risistemazione marciapiedi e parapetti via Santa Barbara e parcheggio Celario e risistemazione canalone di captazione delle acque meteoriche , Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al completamento	Citta Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	In corso Lavori	560.000,00 €	55%
CD-CT-1-020	CASAMICCIOLA TERME	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento e ripristino funzionalita idraulica dell'alveo Senigallia ,Primi interventi di messa in sicurezza	Comune di Casamicciola Terme	Eseguito	89.198,65 €	100%
CD-CT-1-021	CASAMICCIOLA TERME	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento e ripristino funzionalita idraulica dell'alveo Cava Fontana - Vallone Selva , Primi interventi di messa in sicurezza	SMA Campania Spa	Eseguito	922.426,94 €	100%
CD-CT-1-022	CASAMICCIOLA TERME	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento e ripristino funzionalita idraulica degli alvei Negroponte (foce), Fasaniello o Ervaniello , Primi interventi di messa in sicurezza	SMA Campania Spa	Eseguito	609.412,13 €	100%
CD-CT-1-023	CASAMICCIOLA TERME	Intervento di consolidamento e ripristino funzionalita idraulica dell'Alveo Pozzillo o Cava Baino	SMA Campania Spa	Eseguito	40.519,94 €	100%
CD-CT-1-024	CASAMICCIOLA TERME	Intervento da attuare nell'immediatezza ripristino ed implementazione impianto fognario per regimentazione acque meteoriche Via Roma, Piazza dott. Verde, Via Sassolo, Via Castanito, via dott. Morgera, Via De Rivaz ,	EVI	Eseguito	200.000,00 €	100%
CD-CT-1-025	CASAMICCIOLA TERME	Implementazione impianto fognario per regimentazione acque a monte della scarpata di via Eddomade. Intervento in via vicinale castanito, via Eddomade via principessa margherita piazza marina ,	EVI	Eseguito	40.639,82 €	100%
CD-CT-1-026	CASAMICCIOLA TERME	Implementazione impianto fognario per regimentazione acque ss270 e piazza marina , Primi interventi di messa in sicurezza	EVI	Eseguito	228.000,00 €	100%
CD-CT-1-027	CASAMICCIOLA TERME	Adeguamento impianto fognario per regimentazione acque di via Mortito , captazione acque da Monte Tabor ,	EVI	Lavori da affidare	200.000,00 €	10%
CD-CT-1-028	CASAMICCIOLA TERME	Bonifica Pineta del Bosco della Maddalena da piante pericolanti	Comune di Casamicciola Terme	In corso Lavori	80.000,00 €	50%
CD-CT-1-029	CASAMICCIOLA TERME	Intervento da attuare nell'immediatezza: consolidamento delle scarpate laterali del torrente cuccufrido incrocio con via Arenale e via Montecito, nonchè messa in sicurezza delle strade coinvolte , Primi interventi di messa in sicurezza	SMA Campania Spa	In corso Lavori	217.934,55 €	15%
CD-CT-1-030	CASAMICCIOLA TERME	Interventi di ricostruzione muri e sistemazione scarpate lungo via Nizzola ed implementazione impianto di smaltimento delle acque	Commissario Delegato - Comune di Casamicciola Terme (realizzazione lavori)/Comune di Casamicciola Terme (realizzazione lavori)	Lavori da affidare	1.750.000,00 €	5%



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		

CODICE IDENTIFICATIVO	COMUNE	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO
CD-CT-1-032	CASAMICCIOLA TERME	Disgaggio massi pericolanti e rimozione materiali localita Celario	SMA Campania Spa	In corso Lavori	3.927.738,07 €	90%
CD-CT-1-034	CASAMICCIOLA TERME	Interventi vari di messa in sicurezza Plessi Scolastici La Rita e De Gasperi (rifacimento impermeabilizzazione manto di copertura, pulizia ecc)	Comune di Casamicciola Terme	In corso Progettazione	15.000,00 €	10%
CD-CT-1-035	CASAMICCIOLA TERME	Rifacimento segnaletica stradale orizzontale e verticale	Comune di Casamicciola Terme	Lavori da affidare	180.000,00 €	10%
CD-CT-1-036	CASAMICCIOLA TERME	Fornitura e/o noleggio segnaletica stradale provvisionale e di emergenza (transenne, coni, semafori mobili, torre faro, segnaletica luminosa ecc.)	Comune di Casamicciola Terme	In corso Progettazione	150.000,00 €	0%
CD-CT-1-037	CASAMICCIOLA TERME	<u>Intervento di messa in sicurezza ex SS270.C.so Luigi Manzi con rifacimento dei sottoservizi danneggiati</u>	Citta Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Eseguito	85.000,00 €	100%
CD-CT-1-038	CASAMICCIOLA TERME	intervento di messa in sicurezza del costone sulla ex SS270 (tratto Casa Cantoniera, Eliporto)	Comune di Casamicciola Terme	In corso Lavori	1.890.000,00 €	50%
CD-CT-1-039	CASAMICCIOLA TERME	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone sovrastante via Mortito, Primi interventi di messa in sicurezza	Comune di Casamicciola Terme	Eseguito	40.478,00 €	100%
CD-CT-1-041	CASAMICCIOLA TERME	Rimozioni materiali detritico, rifacimento marciapiedi, parapetti, sistemazione opere di contenimento, ecc. (via Vittorio Emanuele)	Comune di Casamicciola Terme	In corso Progettazione	750.000,00 €	2%
CD-CT-2-004	CASAMICCIOLA TERME	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento versante a monte ed a valle Il traversa Santa Barbara, per un fronte di circa mt 300 ed un'altezza di mt 30,00 ,Il fase	Comune di Casamicciola Terme	In corso Progettazione	1.550.000,00 €	5%
CD-CT-2-040	CASAMICCIOLA TERME	Rimozione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all'evento calamitoso del 26 novembre 2022 e trasporto dello stesso presso i siti di stoccaggio provvisorio individuati sull'isola di Ischia	Commissario Delegato	Da avviare	599.541,00 €	0%
CD-CT-2-045	CASAMICCIOLA TERME	Interventi vari di messa in sicurezza Sede Comunale Provvisoria Via Girardi", in quanto la sede provvisoria di Piazza Marina divenuta inagibile ed stato preso in locazione l'ex Convento in via S. Gilardi , Piazza Marina	Comune di Casamicciola Terme	Lavori da affidare	20.000,00 €	2%
CD-CT-2-047	CASAMICCIOLA TERME	Rimozione rifiuti Cava Pozzillo	Commissario Delegato	In corso Progettazione	950.000,00 €	5%
CD-CT-2-048	CASAMICCIOLA TERME	Ripristino dell'Alveo Celario da quota sul liv m circa 300 m fino alla sezione di imbocco di Cava Fontana e altri interventi di completamento	Commissario Delegato	In corso Progettazione	2.000.000,00 €	5%
CD-CT-2-049	CASAMICCIOLA TERME	Sistemazione / realizzazione opere di contenimento	Citta Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade/Casamicciola Terme	In corso Progettazione	1.400.000,00 €	5%
CD-CT-3-048	CASAMICCIOLA TERME	Interventi di ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo Celario consequenziali alle operazioni di pulizia in corso (da quota s.l.m. circa 300m fino alla sezione di imbocco cava Fontana) Il fase	Commissario Delegato	In corso Progettazione	2.000.000,00 €	5%
CD-CT-3-054	CASAMICCIOLA TERME	Ripristino e rifunzionalizzazione idraulica della rete fognaria Via Castanito	Comune di Casamicciola Terme	In corso Progettazione	603.720,17 €	5%
CD-CT-3-055	CASAMICCIOLA TERME	Ripristino e rifunzionalizzazione idraulica della rete fognaria Via Principessa Margherita con ripristino della sede viaria	Comune di Casamicciola Terme	In corso progettazione	937.409,67 €	5%
CD-CT-3-056	CASAMICCIOLA TERME	Ripristino funzionalità delle strade e messa in sicurezza dei muri incombenti via Principessa Margherita, corso Garibaldi e Via Vittorio Emanuele	Comune di Casamicciola Terme	Da avviare	350.000,00 €	0%
CD-CT-3-057	CASAMICCIOLA TERME	Interventi sulle strade e rifacimento muro c.so V. Emanuele e ripristino sottoservizi Il trav Ombrasco	Comune di Casamicciola Terme	Da avviare	518.090,00 €	0%



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		

CODICE IDENTIFICATIVO	COMUNE	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO
CD-CT-3-058	CASAMICCIOLA TERME	Ripristino e rifunionalizzazione idraulica della rete fognaria Via Sassolo interdotta	Comune di Casamicciola Terme	In corso Progettazione	145.676,40 €	2%
CD-CT-3-059	CASAMICCIOLA TERME	Sistemazione muro Via Montecito	Comune di Casamicciola Terme	Da avviare	331.266,88 €	0%
CD-CT-3-060	CASAMICCIOLA TERME	Primi interventi di messa in sicurezza scalinata rampe Paradisiello di collegamento area scolastica e area residenziale	Comune di Casamicciola Terme	In corso Lavori	200.000,00 €	15%
CD-CT-3-061	CASAMICCIOLA TERME	Messa in sicurezza fabbricati per consentire il rientro di nuclei familiari in edifici agibili, Fabbricato I Traversa di Napoli, civico 7 e piazza Bagni civ. 10	Commissario Delegato/VVFF	In corso Lavori	100.000,00 €	50%
CD-CT-3-026	CASAMICCIOLA TERME	Rifunionalizzazione del tratto fognario esistente in Piazza Marina e aree attigue	EVI	Da avviare	98.000,00 €	0%
CD-CT-2-042	CASAMICCIOLA TERME	Ripristino della funzionalità idraulica degli alvei Cuccufriidu, Negroponte, Fasaniello, Fontana e Via Ombrasco	SMA Campania Spa	Da avviare	10.000.000,00 €	0%



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

Piano interventi ODPC 948/22 STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI Comune di Lacco Ameno

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		

CODICE IDENTIFICATIVO	COMUNE	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO
CD-LA-0-001	LACCO AMENO	Demolizione della guaina esistente danneggiata dalle forti piogge e dal vento e posa in opera di nuova guaina	Comune di Lacco Ameno	Eseguito	43.458,83 €	100%
CD-LA-0-002	LACCO AMENO	Demolizione della pavimentazione esistente danneggiata dalle forti piogge e dal vento e posa in opera di nuova guaina	Comune di Lacco Ameno	Eseguito	63.215,50 €	100%
CD-LA-0-003	LACCO AMENO	Opere di pulizia e accantonamento del materiale che ostruisce la viabilità e opere di transennamento per garantire la pubblica e privata incolumità	Comune di Lacco Ameno	Eseguito	31.909,59 €	100%
CD-LA-0-004	LACCO AMENO	Sp 512 Monte Vico, vari tratti lungo la Sp, delimitazione provvisoria, disaggio e prime rimozioni di materiale a tergio del muro stradale	Citta Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Eseguito	30.000,00 €	100%
CD-LA-0-005	LACCO AMENO	Sp 509 Circumv.ne di Lacco Ameno, parcheggio Mezzavia	Citta Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Eseguito	1.000,00 €	100%
CD-LA-1-001	LACCO AMENO	Ripristino del muro crollato alle spalle degli spogliatoi del campo sportivo con la pulizia della scarpata retrostante gli spogliatoi e gli spalti e sostituzione del serbatoio dell'acqua danneggiato	Comune di Lacco Ameno	Eseguito	260.000,00 €	100%
CD-LA-1-002	LACCO AMENO	Ispezioni puntuali del costone, disaggio manuale di volumi pericolanti, pulizia superficiale di materiale friabile, taglio sistematico della vegetazione arbustiva sul costone roccioso parzialmente crollato	Comune di Lacco Ameno	Eseguito	10.614,00 €	100%
CD-LA-1-003	LACCO AMENO	Pulizia e trasporto del materiale riversato sulla pubblica strada	Comune di Lacco Ameno	Eseguito	12.487,24 €	100%
CD-LA-1-005	LACCO AMENO	Messa in sicurezza e consolidamento del costone orientale di Montevico , Primi interventi di messa in sicurezza	Comune di Lacco Ameno	Lavori da affidare	229.500,00 €	10%
CD-LA-1-006	LACCO AMENO	Opere di messa in sicurezza e consolidamento del costone settentrionale di Montevico ,Primi interventi di messa in sicurezza	Comune di Lacco Ameno	In corso Progettazione	109.700,00 €	5%
CD-LA-1-007	LACCO AMENO	Messa in sicurezza e consolidamento del costone retrostante la tribuna del campo sportivo comunale , Primi interventi	Comune di Lacco Ameno	In corso Progettazione	204.013,25 €	5%
CD-LA-1-008	LACCO AMENO	Messa in sicurezza e consolidamento del costone meridionale al campo sportivo comunale ,Primi interventi	Comune di Lacco Ameno	Eseguito	39.786,75 €	100%
CD-LA-1-009	LACCO AMENO	Messa in sicurezza e consolidamento del costone incumbente su via Casamonte, vico I Torre, vico II Torre	Comune di Lacco Ameno /Commissario Delegato	In corso Progettazione	500.000,00 €	0%
CD-LA-1-017	LACCO AMENO	sistemazione / realizzazione opere di contenimento,	Citta Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Da avviare	300.000,00 €	0%
CD-LA-2-018	LACCO AMENO	Ripristino delle condotte sfilate dalle pareti dei pozzetti di sezionamento della rete fognaria a causa della sovrappressione idraulica causata dall'evento calamitoso	EVI	In corso Lavori	200.000,00 €	10%
CD-LA-2-019	LACCO AMENO	Sistemazione / realizzazione opere di contenimento	Citta Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade/Casamicciola Terme	In corso Progettazione	600.000,00 €	5%
CD-LA-2-020	LACCO AMENO	Ripristino della funzionalita della rete fognaria bianca e nera	EVI	Lavori da affidare	590.000,00 €	10%
CD-LA-2-021	LACCO AMENO	Dissabbiamento e pulizia della rete fognaria bianca e nera	EVI	Lavori da affidare	320.000,00 €	10%
CD-LA-2-022	LACCO AMENO	Risanamento strutturale dei giunti delle condotte fognarie bianche e nere	EVI	Lavori da affidare	250.000,00 €	10%
CD-LA-2-023	LACCO AMENO	Pulizia e ripristino della fogna pluviale in via Montevico	EVI	Lavori da affidare	200.000,00 €	10%
CD-LA-3-024	LACCO AMENO	Riattivazione del derivatore reflui sul terminale alveo La Rita (dissabbiamento e disotruzione)	EVI	Eseguito	80.000,00 €	100%



Piano interventi ODPC 948/22 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI Comune di Forio

Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		

CODICE IDENTIFICATIVO	COMUNE	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO
CD-FO-0-001	FORIO	RIMOZIONE DEI MATERIALI FRANATI, PULIZIA SEDE STRADALE E SMALTIMENTO DEGLI STESSI	Comune di Forio	Eseguito	25.473,03 €	100%
CD-FO-0-002	FORIO	RIMOZIONE DEI MATERIALI FRANATI, PULIZIA SEDE STRADALE E SMALTIMENTO DEGLI STESSI	Comune di Forio	Eseguito	10.370,00 €	100%
CD-FO-0-005	FORIO	INTERDIZIONE SEDE STRADALE CON IDONEE DELIMITAZIONI	Comune di Forio	Eseguito	5.724,24 €	100%
CD-FO-0-006	FORIO	CUCI E SCUCI DELLA MURATURA ESISTENTE	Comune di Forio	Eseguito	6.903,81 €	100%
CD-FO-0-007	FORIO	RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E RICOSTRUZIONE SEZIONE CANALE	Comune di Forio	Eseguito	3.608,76 €	100%
CD-FO-0-008	FORIO	RIEMPIMENTO CAVITA' SOTTERRANEA E RIPRISTINO SEDE STRADALE	Comune di Forio	Eseguito	4.486,64 €	100%
CD-FO-0-009	FORIO	RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO	Comune di Forio	Eseguito	17.096,52 €	100%
CD-FO-0-010	FORIO	RILIEVO DEI DISSESTI FRANOSI CON GEOREFERENZIAZIONE, RAPPORTO DESCRITTIVO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO SULLE TENDENZE EVOLUTIVE GENERALI	Comune di Forio	Eseguito	10.000,00 €	100%
CD-FO-0-011	FORIO	RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO	Comune di Forio	In corso Lavori	30.000,00 €	10%
CD-FO-1-001	FORIO	RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO	Comune di Forio	Eseguito	68.000,00 €	100%
CD-FO-1-002	FORIO	REALIZZAZIONE BRIGLIE A FESSURA, CONSOLIDAMENTO CORTICALE COSTONI	Comune di Forio	Eseguito	180.932,40 €	100%
CD-FO-1-003	FORIO	DISGAGGIO PARETI, RIMOZIONE MATERIALI BARRIERE PARADEBRIS, BRIGLIE A FESSURA	Comune di Forio	Eseguito	185.817,29 €	100%
CD-FO-1-005	FORIO	PRIME OPERE RIPRISTINO CONTINUITA' IDRAULICA	Comune di Forio	In corso Progettazione	301.018,35 €	5%
CD-FO-1-006	FORIO	REALIZZAZIONE BRIGLIE A FESSURA, CONSOLIDAMENTO CORTICALE COSTONI ,Primi interventi di messa in sicurezza	Comune di Forio	Lavori da affidare	800.000,00 €	5%



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		

CODICE IDENTIFICATIVO	COMUNE	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO
CD-FO-1-008	FORIO	DISGAGGIO PARETI,RIMOZIONE MATERIALI BARRIERE PARADEBRIS, BRIGLIE A FESSURA , Primi interventi di messa in sicurezza	Comune di Forio	Eseguito	153.782,00 €	100%
CD-FO-1-009	FORIO	MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI MONTENUOVO E CHIGNOLE INCOMBENTI SULL'ABITATO MONTERONE , Primi interventi di messa in sicurezza	Comune di Forio	In corso Progettazione	200.000,00 €	5%
CD-FO-1-010	FORIO	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO AFFERENTE IL BACINO PIELLERO ,CAVA CAMPO , primi interventi di messa in sicurezza	Comune di Forio	In corso Progettazione	172.000,00 €	5%
CD-FO-1-011	FORIO	MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE VERSANTE LOCALITA' PASSAVENTO ,Primi interventi di messa in sicurezza	Comune di Forio	Eseguito	422.000,00 €	100%
CD-FO-1-013	FORIO	OPERE DIFESA PROVVISORIALE IN ATTESA INTERVENTO DEFINITIVO , stralcio funzionale 1	Comune di Forio	Eseguito	133.199,76 €	100%
CD-FO-1-015	FORIO	RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO	Comune di Forio	Lavori da affidare	250.000,00 €	10%
CD-FO-2-016	FORIO	Ripristino impermeabilizzazione del Palazzetto dello sport Palacasale	Comune di Forio	In corso Lavori	98.500,00 €	15%
CD-FO-2-017	FORIO	opere di consolidamento muro di sostegno Via Mortola	Comune di Forio	In corso Progettazione	90.000,00 €	5%
CD-FO-2-018	FORIO	taglio vegetazionale, disgaggio, stabilizzazione e trasporto dei materiali litoidi e biomasse ai siti	Comune di Forio	In corso Progettazione	1.500.000,00 €	5%
CD-FO-2-019	FORIO	Opere di difesa provvisoriale in attesa intervento definitivo , localita Soccorso , stralcio funzionale 3	Comune di Forio	Lavori da affidare	1.465.000,00 €	10%
CD-FO-2-020	FORIO	Primi interventi di messa in sicurezza e sistemazione versante in localita Passavento	Comune di Forio	In corso Progettazione	850.000,00 €	10%
CD-FO-2-021	FORIO	Opere di pulizia dei fossi di guardia e delle vasche di laminazione ExSS270	Comune di Forio	In corso Progettazione	300.000,00 €	2%
CD-FO-2-003	FORIO	DISGAGGIO PARETI-RIMOZIONE MATERIALI BARRIERE PARADEBRIS- BRIGLIE A FESSURA - Intervento ripristino muro di sostegno	Comune di Forio	Eseguito	59.109,00 €	100%
CD-FO-3-003	FORIO	DISGAGGIO PARETI-RIMOZIONE MATERIALI BARRIERE PARADEBRIS- BRIGLIE A FESSURA-- Intervento ripristino continuità idraulica,	Comune di Forio	In corso Progettazione	490.074,00 €	2%



Piano interventi ODPC 948/22 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

Comune di Serrara Fontana

Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia

Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		

CODICE IDENTIFICATIVO	COMUNE	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO
CD-SF-0-001	SERRARA FONTANA	Ex SS 270 , Isola verde, vari tratti sommano ml 100, rimozione materiali e delimitazioni (tra Serrara Fontana e Barano d'Ischia)	Citta Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Eseguito	6.000,00 €	100%
CD-SF-0-002	SERRARA FONTANA	Movimentazione terreno smottato sulle strade per il ripristino della circolazione.	Comune di Serrara Fontana	Eseguito	7.320,00 €	100%
CD-SF-0-003	SERRARA FONTANA	Ripristino tratto di strada crollato	Comune di Serrara Fontana	Eseguito	5.310,51 €	100%
CD-SF-0-004	SERRARA FONTANA	Sp 202, nei pressi del cimitero di Serrara Fontana, diversi interventi di pulizia della sede viaria comprese griglie	Citta Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Eseguito	2.000,00 €	100%
CD-SF-0-005	SERRARA FONTANA	SP478, disgaggio e prime rimozioni di materiale a tergio della scarpata e delimitazione provvisoria	Citta Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Eseguito	8.000,00 €	100%
CD-SF-0-006	SERRARA FONTANA	Sp 112, rimozione rete, rimozione materiale accumulato/detriti nel tempo e in occasione degli ultimi eventi, oltre alla pulizia di una parte della scarpata.	Citta Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Eseguito	4.000,00 €	100%
CD-SF-0-007	SERRARA FONTANA	Sp 112, disgaggio e rimozione materiale detritico, oltre alla pulizia della porzione di scarpata interessata.	Citta Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Eseguito	3.000,00 €	100%
CD-SF-0-008	SERRARA FONTANA	Ex SS 270 Isola Verde altezza km 9+850	Citta Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Eseguito	2.000,00 €	100%
CD-SF-1-001	SERRARA FONTANA	Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio, dal monte della Torre di Sant'Angelo posto a ridosso di proprieta private sgomberate ed in adiacenza dell'area portuale.Demolizioni in situ di	Comune di Serrara Fontana	In corso Lavori	1.207.668,85 €	15%
CD-SF-1-002	SERRARA FONTANA	Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio, latistanti la via comunale via Pendio Oscuro. Trasporto a discarica dei materiali.	Comune di Serrara Fontana	Da avviare	450.000,00 €	0%
CD-SF-1-003	SERRARA FONTANA	Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio, latistanti la via comunale Casale. Traspoto a discarica dei materiali.	Comune di Serrara Fontana	Da avviare	150.000,00 €	0%
CD-SF-1-004	SERRARA FONTANA	Intervento di rimozione detriti da vasca e pozzetti realizzati dal Genio Civile per regimentare le acque. Opere di sistemazione idraulica al fine di evitare erosione al piede del costone su cui poggiano vari fabbricati in bilico e oggetto di sgombero.	Comune di Serrara Fontana /Commissario Delegato	In corso Progettazione	500.000,00 €	2%
CD-SF-1-005	SERRARA FONTANA	Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti, ecc.) instabili ed in precario equilibrio, latistanti la via comunale via Martofa. Trasporto a discarica dei materiali.	Comune di Serrara Fontana	Lavori da affidare	100.000,00 €	5%
CD-SF-1-006	SERRARA FONTANA	Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione dei detriti dal letto dell'Alveo Martofa Cuotto, con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezz	Comune di Serrara Fontana /Commissario Delegato	In corso Progettazione	150.000,00 €	2%
CD-SF-1-007	SERRARA FONTANA	Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc.) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione terreno dall'alveo di Cava Ruffano, con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali	Comune di Serrara Fontana	Eseguito	147.248,00 €	100%



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA

 LAVORI IN CORSO	 PROGETTAZIONE IN CORSO
 CONCLUSO	 DA AVVIARE
 LAVORI DA AFFIDARE	

CODICE IDENTIFICATIVO	COMUNE	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO
CD-SF-1-008	SERRARA FONTANA	Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione detriti Alveo Fondolillo con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali Trasporto a di	Comune di Serrara Fontana	Eseguito	200.000,00 €	100%
CD-SF-1-009	SERRARA FONTANA	Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione detriti dall'Alveo di Carovana con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali. Traspor	Comune di Serrara Fontana	Lavori da affidare	200.000,00 €	5%
CD-SF-1-010	SERRARA FONTANA	Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) e disostruzione dell'Alveo Cavapontina, con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali	Comune di Serrara Fontana /Commissario Delegato	In corso Progettazione	400.000,00 €	2%
CD-SF-1-011	SERRARA FONTANA	Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio, latistanti la via comunale via Sant'Angelo. Trasporto a discarica dei materiali.	Comune di Serrara Fontana	Eseguito	155.082,68 €	100%
CD-SF-1-012	SERRARA FONTANA	Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio, latistanti la via comunale via Martofa. Trasporto a discarica dei materiali.	Comune di Serrara Fontana	Lavori da affidare	100.000,00 €	5%
CD-SF-1-013	SERRARA FONTANA	Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione dei detriti dal letto dell'Alveo, con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali Trasp	Comune di Serrara Fontana /Commissario Delegato	In corso Progettazione	200.000,00 €	2%
CD-SF-1-014	SERRARA FONTANA	Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione dei detriti dal letto dell'Alveo, con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali Trasp	Comune di Serrara Fontana /Commissario Delegato	In corso Progettazione	200.000,00 €	2%
CD-SF-1-015	SERRARA FONTANA	Attrezzature per realizzare recinzione, interdizioni ecc.	Comune di Serrara Fontana	Lavori da affidare	12.500,00 €	0%
CD-SF-1-016	SERRARA FONTANA	sistemazione / realizzazione opere di contenimento, rafforzamento corticale	Comune di Serrara Fontana /Commissario Delegato	In corso Progettazione	400.000,00 €	2%
CD-SF-1-017	SERRARA FONTANA	Lavori di messa in sicurezza costone via Falanga	Comune di Serrara Fontana /Commissario Delegato	In corso Progettazione	500.000,00 €	0%
CD-SF-2-019	SERRARA FONTANA	Lavori di disostruzione della parte terminale di Cava Pontina in località Fontana	Serrara Fontana	Eseguito	1.830,00 €	100%
CD-SF-2-020	SERRARA FONTANA	Lavori di disostruzione della parte terminale dell'alveo di Fondolillo in località Sant'Angelo	Serrara Fontana	Eseguito	5.978,00 €	100%
CD-SF-2-021	SERRARA FONTANA	Sistemazione/realizzazione opere di contenimento, ripristino corticale	Sistemazione/realizzazione opere di contenimento, ripristino corticale	In corso Progettazione	1.500.000,00 €	5%



Piano interventi ODPC 948/22 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI Comune di Ischia

Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia

Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA

 LAVORI IN CORSO	 PROGETTAZIONE IN CORSO
 CONCLUSO	 DA AVVIARE
 LAVORI DA AFFIDARE	

CODICE IDENTIFICATIVO	COMUNE	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO
CD-IS-0-001	TUTTI I COMUNI	Ex SS 270 - Isola verde, + SP ricadenti sull'isola d'Ischia	Città Metropolitana	Eseguito	20.000,00 €	100%
CD-IS-0-002	ISCHIA	Disostruzione e Pulizia Canale deflusso acque	Comune di Ischia	Eseguito	653,92 €	100%
CD-IS-0-003	ISCHIA	Pulizia e rimozione sabbia	Comune di Ischia	Eseguito	1.659,20 €	100%
CD-IS-0-004	ISCHIA	Pulizia e rimozione sabbia	Comune di Ischia	Eseguito	829,60 €	100%
CD-IS-0-005	ISCHIA	Rimozione materiale per ripristino viabilità	Comune di Ischia	Eseguito	1.061,40 €	100%
CD-IS-0-006	ISCHIA	Rimozione materiale per ripristino viabilità	Comune di Ischia	Eseguito	1.415,20 €	100%
CD-IS-0-007	ISCHIA	Rimozione materiale per ripristino viabilità	Comune di Ischia	Eseguito	2.049,60 €	100%
CD-IS-0-008	ISCHIA	Rimozione materiale per ripristino viabilità	Comune di Ischia	Eseguito	1.238,30 €	100%
CD-IS-0-009	ISCHIA	Rimozione materiale per ripristino viabilità	Comune di Ischia	Eseguito	884,50 €	100%
CD-IS-0-010	ISCHIA	Rimozione materiale per ripristino viabilità	Comune di Ischia	Eseguito	652,70 €	100%
CD-IS-0-011	ISCHIA	Rimozione materiale per ripristino viabilità	Comune di Ischia	Eseguito	2.732,80 €	100%
CD-IS-0-012	ISCHIA	Rimozione materiale per ripristino viabilità	Comune di Ischia	Eseguito	1.146,80 €	100%
CD-IS-0-013	ISCHIA	Estensione contratto manutenzione ed assistenza impianti di sollevamento per smaltimento acque meteoriche in scadenza il 31.12.2022	Comune di Ischia	Eseguito	12.505,00 €	100%
CD-IS-0-014	ISCHIA	Messa in sicurezza con opere provvisoriale e ripristino muro di contenimento della strada	Comune di Ischia	Eseguito	36.038,80 €	100%
CD-IS-1-002	ISCHIA	Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e intervento di contenimento del terrapieno mediante geostuoia e rete armata a doppia torsione ancorata	Comune di Ischia /Commissario Delegato	In corso Progettazione	115.900,00 €	2%
CD-IS-1-003	ISCHIA	Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e realizzazione di muro di contenimento in pietrame con fondazione in cls	Comune di Ischia	In corso Progettazione	55.000,00 €	2%
CD-IS-1-005	ISCHIA	Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e progettazione per la realizzazione di muro di contenimento con fondazione in cls , I lotto	Comune di Ischia /Commissario Delegato	In corso Progettazione	169.600,00 €	2%



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA

 LAVORI IN CORSO	 PROGETTAZIONE IN CORSO
 CONCLUSO	 DA AVVIARE
 LAVORI DA AFFIDARE	

CODICE IDENTIFICATIVO	COMUNE	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO
CD-IS-1-006	ISCHIA	Impianti di sollevamento acque meteoriche di Via De Rivaz, Via F. Buonocore, Via Pontano: primi interventi di riqualificazione e potenziamento	EVI	In corso Lavori	106.914,00 €	5%
CD-IS-1-007	ISCHIA	Primi interventi di messa in sicurezza presso il versante di Monte Vezzi	Comune di Ischia /Commissario Delegato	In corso Progettazione	1.496.000,00 €	0%
CD-IS-1-010	ISCHIA	Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria dell'alveo denominato RIO CORBORE (in parte tombato)	EVI	Lavori da affidare	300.000,00 €	5%
CD-IS-1-012	ISCHIA	Primi interventi di pulizia degli alvei siti nel territorio del Comune di Ischia e Progettazione di intervento di manutenzione straordinaria: alveo ubicato presso ZONA PIANO LIGUORI (VIA CARAUCIO)	Comune di Ischia /Commissario Delegato	In corso Progettazione	350.000,00 €	0%
CD-IS-1-013	ISCHIA	Primi interventi di pulizia degli alvei siti nel territorio del Comune di Ischia e Progettazione di intervento di manutenzione straordinaria: alveo ubicato presso CAVONE VIA CAMPAGNANO , SPIAGGIA CARTAROMANA	Comune di Ischia	In corso Progettazione	460.000,00 €	0%
CD-IS-1-015	ISCHIA	Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria dell'alveo ubicato presso TRAVERSA MONTAGNONE	Comune di Ischia /Commissario Delegato	Eseguito	51.352,75 €	100%
CD-IS-1-016	ISCHIA	Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria dell'alveo ubicato presso VIA DELLE VIGNE e denominato CAVONE DEL PANZESE	Comune di Ischia	In corso Progettazione	250.000,00 €	0%
CD-IS-1-017	ISCHIA	Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria dell'alveo ubicato presso VIA PENDIO DEL LAPILLO	Comune di Ischia /Commissario Delegato	Eseguito	200.000,00 €	100%
CD-IS-1-018	ISCHIA	manutenzione straordinaria immobile in locazione Guardia di Finanza , Tenenza di Ischia a seguito degli interventi	Comune di Ischia	Eseguito	123.039,97 €	100%
CD-IS-1-019	ISCHIA	Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e realizzazione muro di sostegno del terrapieno in muratura di cemento	Regione Campania	In corso Progettazione	137.000,00 €	0%
CD-IS-1-020	ISCHIA	Lavori di decespugliamento,taglio arbusti e realizzazione muri di contenimento in pietrame con fondazione in cemento armato	Regione Campania	In corso Progettazione	60.000,00 €	0%
CD-IS-1-021	ISCHIA	Lavori di pulizia della vegetazione e disgaggio masse instabili, messa in sicurezza del versante mediante posa in opera di geo,stuoia e rete armata a doppia torsione ancorata con barre auto,perforanti e realizzazione muretto di scarpa alla base del costo	Regione Campania	Da avviare	300.000,00 €	0%
CD-IS-1-023	ISCHIA	Lavori di decespugliamento e taglio degli arbusti sulla scarpata, realizzazione muro di contenimento in calcestruzzo e ripristino della sede stradale	Regione Campania	Da avviare	160.000,00 €	0%
CD-IS-2-024	ISCHIA	Rifacimento muro di contenimento e intervento corticale in Via Ca Mormile	Comune di Ischia	In corso Progettazione	470.593,00 €	5%
CD-IS-2-025	ISCHIA	interventi di messa in sicurezza nell'area a valle da Via Pendio del Lapillo a Via delle Ginestre fino a Rio Corbore	Comune di Ischia	Da avviare	915.000,00 €	0%



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

Piano interventi ODPC 948/22 – STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI Comune di Barano d'Ischia

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		

CODICE IDENTIFICATIVO	COMUNE	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO
CD-BI-0-001	BARANO	Lavori di rimozione di materiale franato, rimozione del materiale franato con un mezzo meccanico e rimozione del masso roccioso previa frantumazione dello stesso in sito	Comune di Barano d'Ischia	Eseguito	1.220,00 €	100%
CD-BI-0-002	BARANO	SP 155, messa in sicurezza provvisoria	Citta Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Eseguito	3.000,00 €	100%
CD-BI-1-001	BARANO	Fornitura di transennamento con elementi delimitanti ed eventualmente, contenitivi, a protezione di smottamenti prospicienti strade pubbliche	Comune di Barano d'Ischia	Eseguito	5.000,00 €	100%
CD-BI-1-002	BARANO	Lavori di Rimozione inerti	Comune di Barano d'Ischia	Lavori da affidare	70.000,00 €	10%
CD-BI-1-003	BARANO	Lavori di Rimozione albero caduto con mezzi meccanici	Comune di Barano d'Ischia	Lavori da affidare	3.000,00 €	10%
CD-BI-1-005	BARANO	Sistemazione del materiale franato e distaccato	Comune di Barano d'Ischia	Lavori da affidare	50.000,00 €	10%
CD-BI-1-006	BARANO	Mitigazione del rischio consistente in interventi di decespugliamento, taglio arbusti ed eventuale sistemazione/realizzazione opere di contenimento dei fronti prospicienti strada carrabile	Commissario Delegato	In corso Progettazione	870.000,00 €	2%
CD-BI-1-009	BARANO	rinforzo del paramento murario a contenimento del terrazzamento	Comune di Barano d'Ischia	Lavori da affidare	120.000,00 €	10%
CD-BI-1-010	BARANO	Mitigazione del rischio consistente in interventi di decespugliamento, taglio arbusti ed eventuale sistemazione/realizzazione opere di contenimento dei fronti prospicienti strada carrabile	Comune di Barano d'Ischia	In corso Progettazione	180.000,00 €	5%
CD-BI-1-011	BARANO	Lavori per la messa in sicurezza dei costoni latitanti la strada pubblica di Via Schiappone (ripristino muri preesistenti) fase 1	Comune di Barano d'Ischia	In corso Progettazione	80.000,00 €	5%
CD-BI-1-012	BARANO	Pulizia delle rete paramassi presistenti	Comune di Barano d'Ischia	Lavori da affidare	1.100.000,00 €	5%



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		

CODICE IDENTIFICATIVO	COMUNE	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO
CD-BI-1-013	BARANO	Lavori volti all' mitigazione del rischio presso l'Alveo Cava Zaffarano, Prima pulizia di un tratto	Commissario Delegato	In corso Progettazione	820.000,00 €	5%
CD-BI-1-014	BARANO	Lavori volti alla mitigazione del rischio presso il canale Spigadosso	Comune di Barano d'Ischia	In corso Progettazione	456.000,00 €	5%
CD-BI-1-015	BARANO	Lavori volti alla mitigazione del rischio presso Cava Pallarito	Commissario Delegato	Eseguito	70.000,00 €	100%
CD-BI-1-016	BARANO	Lavori volti alla mitigazione del rischio presso i costoni prospicienti la Pubblica via Cufa	Comune di Barano d'Ischia	Lavori da affidare	100.000,00 €	5%
CD-BI-1-017	BARANO	Lavori volti alla mitigazione del rischio presso i costoni prospicienti la strada Pubblica P. Le Cretaio	Comune di Barano d'Ischia	In corso Progettazione	160.000,00 €	5%
CD-BI-1-019	BARANO	Lavori volti alla mitigazione del rischio presso i costoni dei cavoni	Comune di Barano d'Ischia	Lavori da affidare	200.000,00 €	10%
CD-BI-1-020	BARANO	Lavori volti alla mitigazione del rischio presso i costoni prospicienti la Via Vecchia Pallarito	Commissario Delegato	Lavori da affidare	70.000,00 €	5%
CD-BI-1-021	BARANO	SP143, messa in sicurezza provvisoria	Citta Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Eseguito	5.000,00 €	100%
CD-BI-1-022	BARANO	Sistemazione / realizzazione opere di contenimento	Citta Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade / Strutt. Commissariale	Da avviare	140.000,00 €	0%



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA




	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		

CODICE IDENTIFICATIVO	COMUNE	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO
CD-BI-1-023	BARANO	Rimozioni materiali detritico, rifacimento parapetti, sistemazione opere di contenimento, ecc.	Comune di Barano d'Ischia	In corso lavori	200.000,00 €	20%
CD-BI-1-024	BARANO	Sistemazione / realizzazione opere di contenimento	Comune di Barano d'Ischia	Lavori da affidare	200.000,00 €	10%
CD-BI-1-025	BARANO	Lavori per la messa in sicurezza dei muri latitanti la strada pubblica via Pendio del Gelso	Comune di Barano d'Ischia	Lavori da affidare	250.000,00 €	10%
CD-BI-2-026	BARANO	Pulizia e rimozione di materiale sciolto presso la Via Monte Cotto	Comune di Barano d'Ischia	In corso Progettazione	130.000,00 €	5%
CD-BI-2-027	BARANO	Lavori volti alla mitigazione del rischio presso i costoni prospicienti la via Vecchia Pallarito	Comune di Barano d'Ischia/Commissario Delegato	In corso Progettazione	1.610.000,00 €	0%
CD-BI-2-028	BARANO	Lavori di messa in sicurezza dei costoni prospicienti la strada pubblica Via Benedetto Migliaccio	Comune di Barano d'Ischia	In corso Progettazione	1.150.000,00 €	5%
CD-BI-2-029	BARANO	Lavori di messa in sicurezza dei costoni di Cava Pallarito sottostanti la strada pubblica P.le Via Angelo Michelangelo	Comune di Barano d'Ischia/Commissario Delegato	In corso Progettazione	1.100.000,00 €	0%
CD-BI-2-030	BARANO	Lavori di messa in sicurezza del muro laterale della strada P.le Via Duca degli Abruzzi	Comune di Barano d'Ischia	In corso Progettazione	800.000,00 €	2%
CD-BI-2-032	BARANO	Ripristino della stradina comunale presso Via Chiummano	Comune di Barano d'Ischia	In corso Progettazione	200.000,00 €	2%




Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
 Commissario Delegato emergenza Ischia

Sintesi attuazione Piano di Protezione Civile

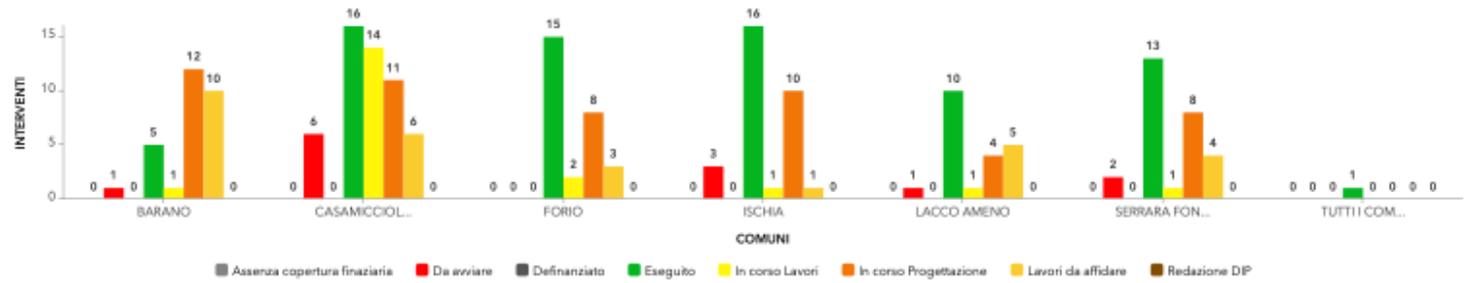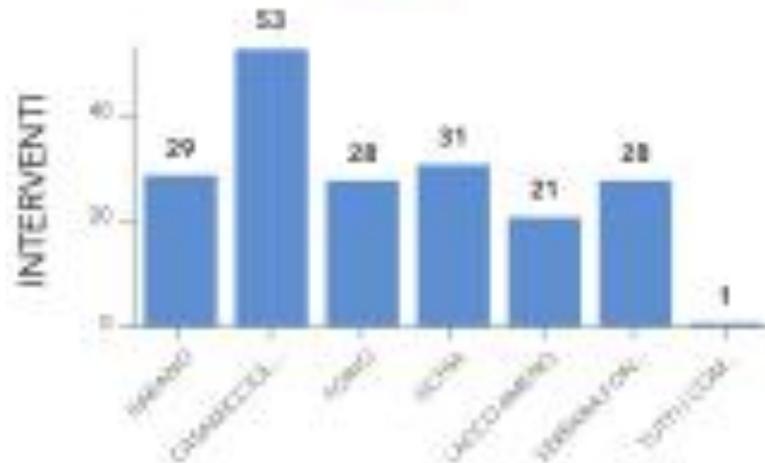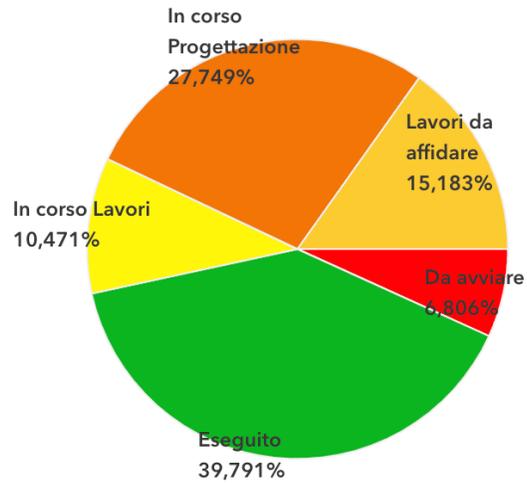


Sintesi dello stato di attuazione degli interventi del Piano di Protezione Civile ripartiti per comune di ubicazione

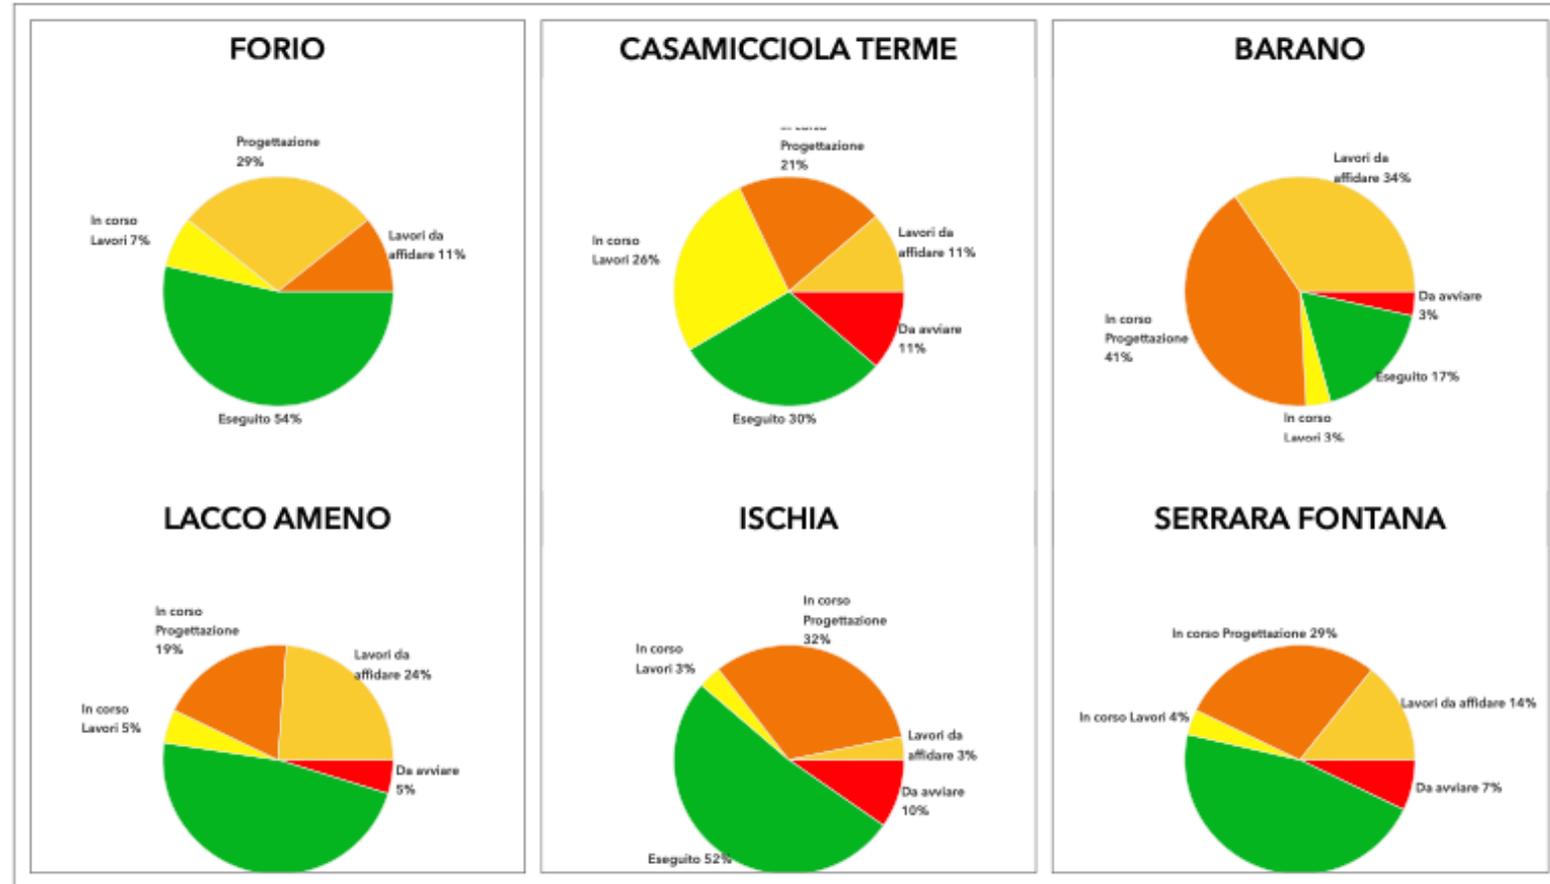



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
 Commissario Delegato emergenza Ischia

Interventi Piano di Protezione Civile	TABELLA A – Soggetto attuatore degli interventi che si trovano allo stato "da avviare"								
	Commissario Delegato	Regione Campania	Comune di Serrara Fontana	EVI	Comune di Ischia	Comune di Casamicciola Terme	SMA Campania	Città Metropolitana	TOTALE
Casamicciola Terme	1			1		3	1		6
Lacco Ameno								1	1
Serrara Fontana			2						2
Ischia		2			1				3
Barano d'Ischia								1	1
TOTALE	1	2	2	1	1	3	1	2	13

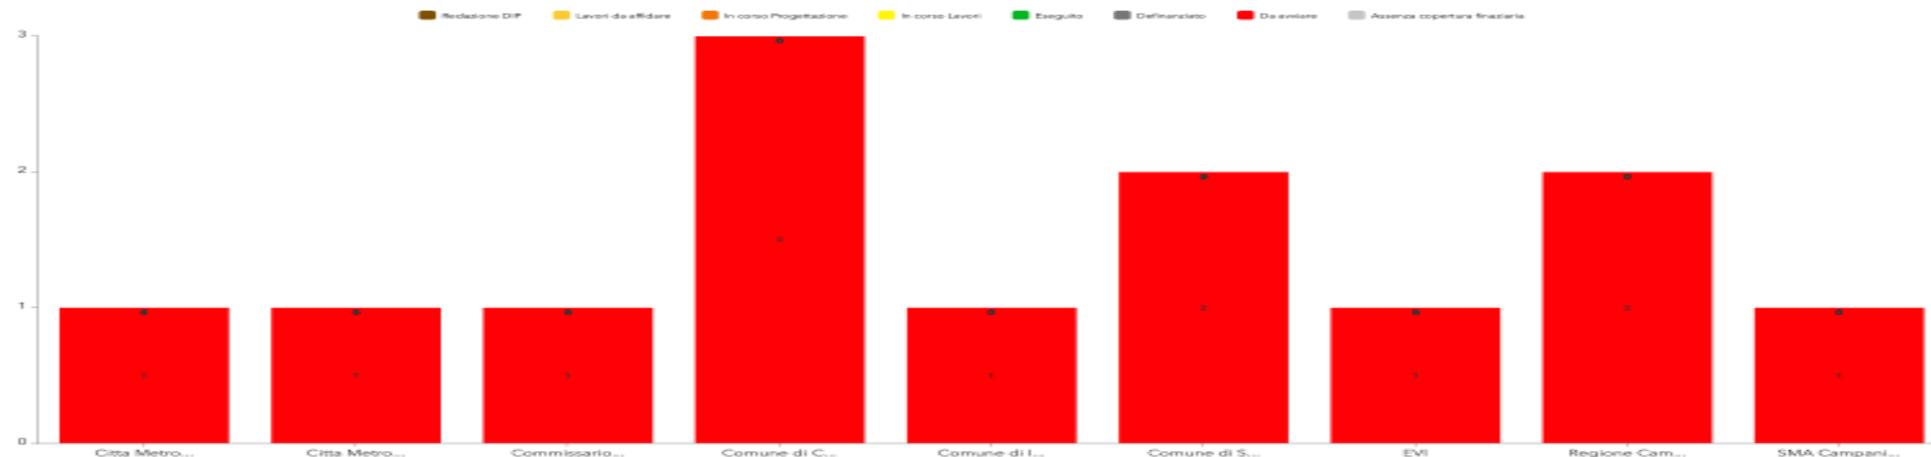


In Tabella A, e nel grafico corrispondente, sono evidenziati gli Enti Soggetti attuatori titolari dei 13 interventi che si trovano ad uno stato di avanzamento definito «Da avviare», ossia per i quali deve ancora essere redatto il DIP e che, pertanto, non hanno avviato la progettazione. Diversi, tra questi, sono stati assegnati solo con le ultime rimodulazioni di marzo e giugno 2024.



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
 Commissario Delegato emergenza Ischia


Interventi Piano di Protezione Civile	TABELLA B – Interventi che si trovano nello stato "in corso progettazione"	
		TOTALE interventi nello stato "In corso Progettazione"
	Casamicciola Terme	11
	Lacco Ameno	4
	Forio	8
	Serrara Fontana	8
	Ischia	10
	Barano d'Ischia	12
	TOTALE	53

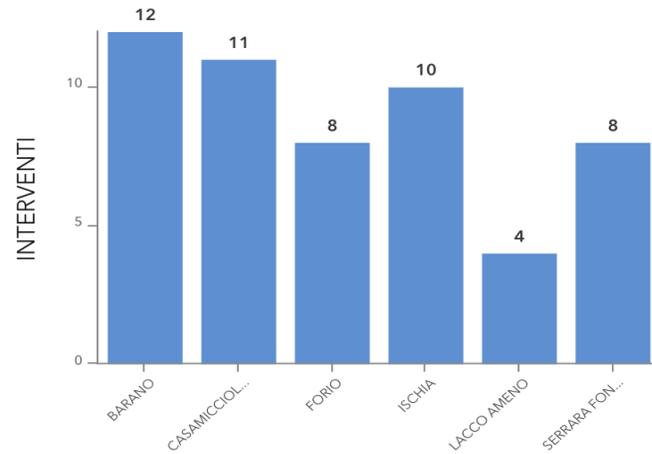

In Tabella B, e nel grafico corrispondente, sono evidenziati gli interventi che si trovano ad uno stato di avanzamento definito «In corso progettazione».

In Tabella C, e nel grafico corrispondente, sono evidenziati gli interventi che sono nelle condizioni di andare a gara o di iniziare i lavori nel breve termine.

Interventi Piano di Protezione Civile	TABELLA C – Soggetto attuatore degli Interventi che si trovano nello stato «lavori da affidare»								
	Commissario Delegato	EVI	Comune di Serrara Fontana	Comune di Lacco Ameno	Comune di Forio	Comune di Casamicciola Terme	Comune di Barano	TOTALE	
	Casamicciola Terme	1	1				4		6
	Lacco Ameno		4		1				5
	Forio					3			3
	Serrara Fontana			4					4
	Ischia		1						1
	Barano d'Ischia	1						9	10
	TOTALE	2	6	4	1	3	4	9	29

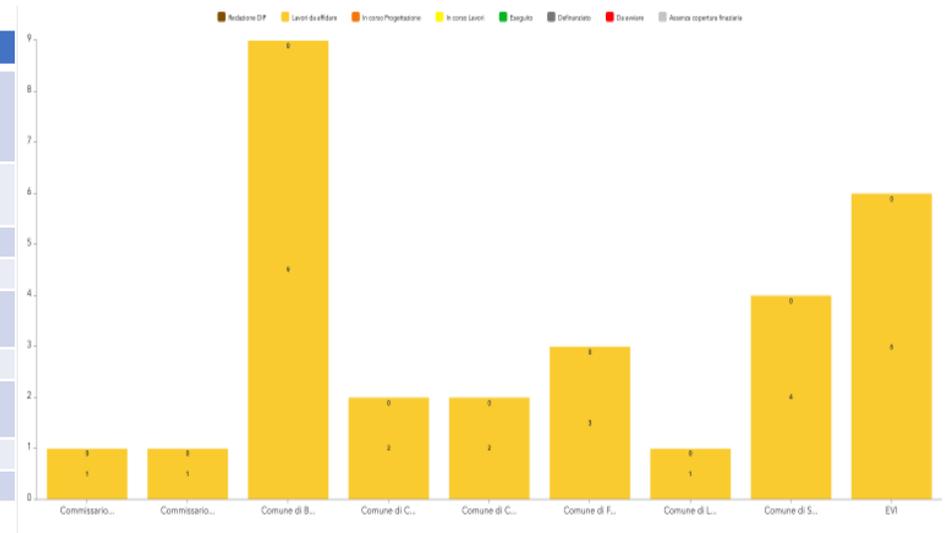



Piano fanghi - O.S. n.7 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

Comune di Casamicciola Terme

Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia

Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		

CODICE IDENTIFICATIVO	COMUNE	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO
CD-CT-F-021	CASAMICCIOLA TERME	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell'alveo Cava Fontana Vallone Selva , Primi interventi di messa in sicurezza	SMA Campania Spa	Eseguito	214.138,31 €	100%
CD-CT-F-022	CASAMICCIOLA TERME	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica degli alvei Negroponte (foce), Fasaniello o Ervaniello , Primi interventi di messa in sicurezza	SMA Campania Spa	Eseguito	267.961,63 €	100%
CD-CT-F-023	CASAMICCIOLA TERME	Intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell'Alveo Pozzillo o Cava Baino	SMA Campania Spa	Eseguito	222.334,05 €	100%
CD-CT-F-040	CASAMICCIOLA TERME	Rimozione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all'evento calamitoso del 26 novembre 2022 e trasporto dello stesso presso i siti di stoccaggio provvisorio individuati sull'isola di Ischia	SMA Campania Spa	Eseguito	3.781.904,97 €	100%
CD-CT-F-041	CASAMICCIOLA TERME	Trasporto e smaltimento presso siti di recupero al di fuori dell'isola di Ischia dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata rimosso a seguito degli eventi calamitosi del giorno 26 novembre 2022 e seguenti	SMA Campania Spa	Eseguito	4.885.482,24 €	100%
CD-CT-F-042	CASAMICCIOLA TERME	Ulteriore Rimozione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all'evento calamitoso del 26 novembre 2022 e trasporto dello stesso presso i siti di stoccaggio provvisorio individuati sull'isola di Ischia	SMA Campania Spa	Eseguito	2.000.000,00 €	100%
CD-CT-F-043	CASAMICCIOLA TERME	Pulizia, dissabbiamento e ripristino del tratto terminale dell'alveo tombato Pio Monte della Misericordia lungo il tratto che parte da via Monte della Misericordia	EVI	Eseguito	258.323,51 €	100%
CD-CT-F-044	CASAMICCIOLA TERME	Pulizia e disabbiamento della centrale di sollevamento delle acque reflue denominata "Rittmann" nonchè del pozzetto di confluenza posto immediatamente a monte della stessa, nei pressi di Piazza Marina	EVI	Eseguito	21.773,95 €	100%
CD-CT-F-052	CASAMICCIOLA TERME	ULTERIORE PULIZIA E DISSABBIAMENTO ALVEO TOMBATO TERMINALE PIO MONTE DELLA MISERICORDIA	EVI	In corso Lavori	162.226,05 €	10%
CD-CT-F-053-A	CASAMICCIOLA TERME	REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI COLMATA DA RIEMPIERE CON MATERIALE SCIOLTO DA FRANA (1° LOTTO)	Comune di Casamicciola Terme	In corso Lavori	1.191.784,11 €	65%
CD-CT-F-053-B	CASAMICCIOLA TERME	REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI COLMATA DA RIEMPIERE CON MATERIALE SCIOLTO DA FRANA (2° LOTTO)	Comune di Casamicciola Terme	In corso Progettazione	1.229.743,57 €	0%
CD-CT-F-050	CASAMICCIOLA TERME/LACCO AMENO	Intervento di pulizia e rimozione materiale detritico sull'Alveo La Rita	Commissario Straordinario	Eseguito	810.000,00 €	100%
CD-CT-F-051	CASAMICCIOLA TERME/LACCO AMENO	Intervento di pulizia e rimozione materiale detritico sull'Alveo Il Monaco	Commissario Straordinario	Eseguito	900.000,00 €	100%
CD-LA-F-028	CASAMICCIOLA TERME/LACCO AMENO/FORIO	Intervento di pulizia e rimozione materiale detritico sull'Alveo Scialicco	Commissario Straordinario	In corso Lavori	290.000,00 €	0%



Piano fanghi - O.S. n.7 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia

Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		

Comune di Forio


CODICE IDENTIFICATIVO	COMUNE	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO
CD-FO-F-022	FORIO	Recupero fanghi e realizzazione del Parco urbano attrezzato e delle opere complementari	Comune di Forio	Lavori da affidare	2.619.266,00 €	0%

Comune di Lacco Ameno

CODICE IDENTIFICATIVO	COMUNE	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO
CD-LA-F-024	LACCO AMENO	Rimozione di sabbia, pietrisco e fanghi rinvenuti lungo l'asse longitudinale della condotta fognaria mista, in materiale ceramico DN500	EVI	Eseguito	286.788,00 €	100%
CD-LA-F-025	LACCO AMENO	Interventi di pulizia e smaltimento fanghi sulla centrale ubicata sul corso Angelo Rizzoli angolo via Pannella mc30	EVI	Eseguito	49.117,00 €	100%
CD-LA-F-026	LACCO AMENO	Interventi di pulizia e smaltimento fanghi sulla centrale denominata "piazza Salvatore Giardi" localita Capitello	EVI	In corso Lavori	338.176,00 €	10%
CD-LA-F-027	LACCO AMENO	Interventi di pulizia e smaltimento fanghi sulla centrale denominata Sombrero che capta i reflui misti provenienti dall'alveo limitrofo denominato "La Rita"	EVI	Eseguito	470.979,00 €	100%




Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
 Commissario Delegato emergenza Ischia

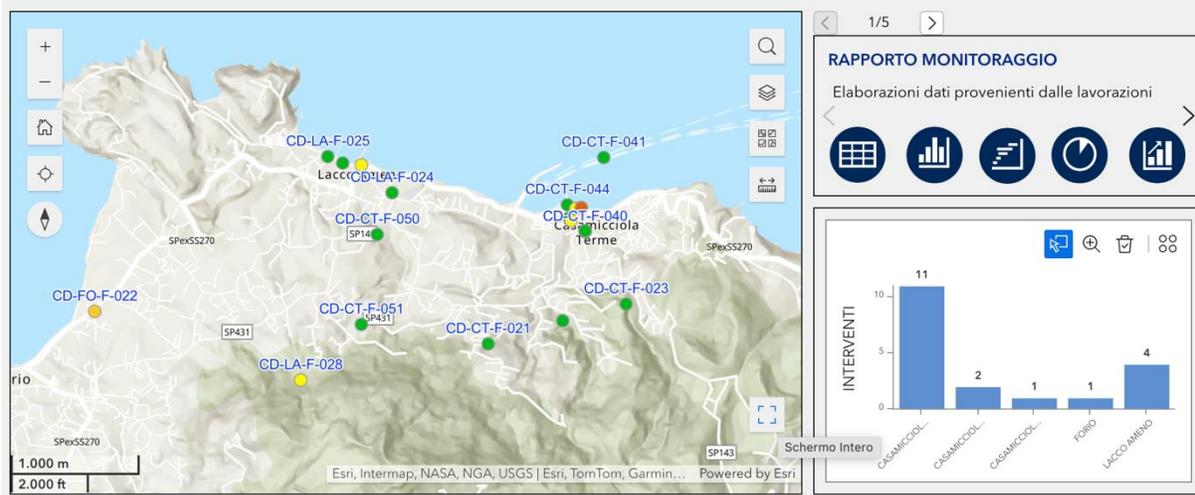

Sintesi dello stato di attuazione degli interventi «Piano fanghi» contenuti in Ordinanze Speciali nn. 5 e 7 e ripartiti per comune di ubicazione


CASAMICCIOLA TERME



FORIO




LACCO AMENO




Sintesi dello stato di attuazione degli interventi «Piano fanghi» contenuti in Ordinanze Speciali nn. 5 e 7 e ripartiti per Soggetto attuatore

■ Redazione DIP
 ■ Lavori da affidare
 ■ In corso Progettazione
 ■ In corso Lavori
 ■ Eseguito
 ■ Definito
 ■ Da avviare
 ■ Assenza copertura finanziaria

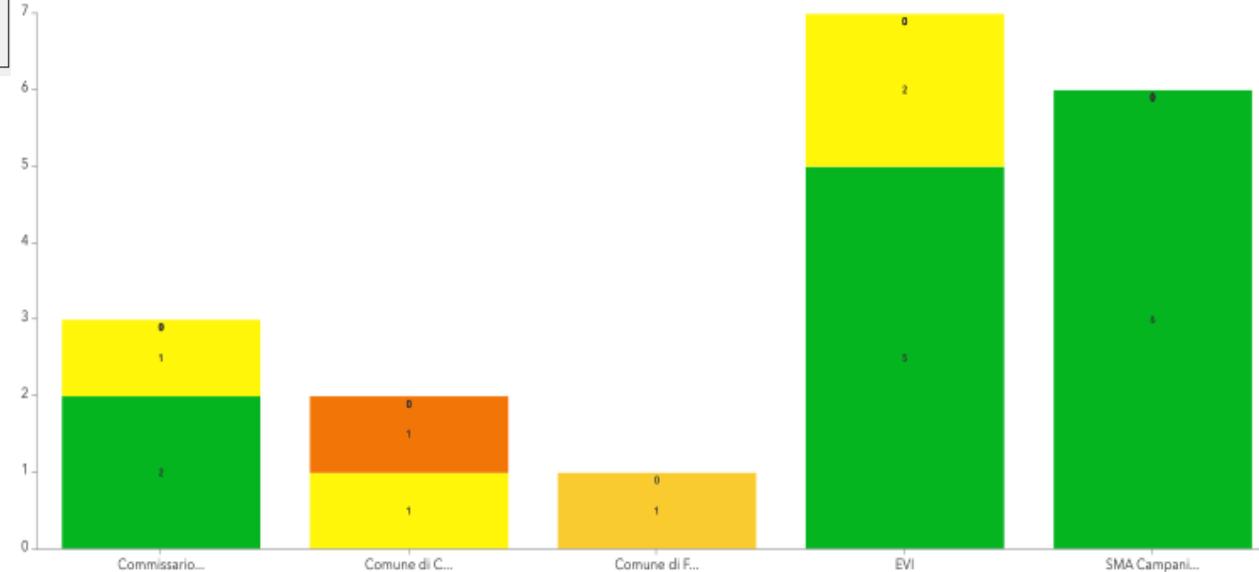

Sintesi complessiva dello stato di attuazione degli interventi «Piano fanghi» contenuti in Ordinanze Speciali nn. 5 e 7

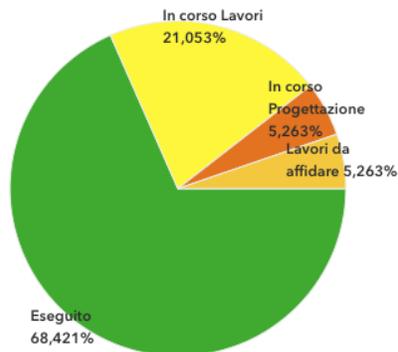



Interventi di competenza del Commissario Delegato e finanziati con fondi Regione Campania

STATO DI ATTUAZIONE

Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGGENDA



■	LAVORI IN CORSO	■	PROGETTAZIONE IN CORSO
■	CONCLUSO	■	DA AVVIARE
■	LAVORI DA AFFIDARE		

CODICE IDENTIFICATIVO	COMUNE	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO
CD-CT-1-006	CASAMICCIOLA TERME	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone al di sopra della via Eddomade, Casa Siano per una lunghezza di circa mt ed un'altezza di circa mt 40,00 ,Primi interventi di messa in sicurezza	SMA Campania Spa	In corso Lavori	583.095,00 €	10%
CD-CT-1-007	CASAMICCIOLA TERME	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento del costone sottostante la strada Viale Paradisiello e soprastante la strada Rampe Paradisiello, per una lunghezza di circa mt 80,00 ed un'altezza di mt 40,00 , Primi interventi	SMA Campania Spa	In corso Lavori	547.000,00 €	20%
CD-CT-1-008	CASAMICCIOLA TERME	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone sottostante la strada via Selva Pera, per una lunghezza di circa mt 50,00 ed un'altezza di circa , Primi interventi di messa in sicurezza	SMA Campania Spa	In corso Lavori	848.000,00 €	20%
CD-CT-1-031	CASAMICCIOLA TERME	Rimozione dei fanghi e del materiale inerte di liquefazione e colata conseguente agli eventi calamitosi del 26 novembre 2022 mediante dragaggio del porto di Casamicciola Terme e lato banchina esterna	Lacco Ameno Capofila dei comuni dell'isola d'Ischia	Eseguito	3.212.000,00 €	100%
CD-CT-2-046	CASAMICCIOLA TERME	Esecuzione Cassoni localita Celario	Comune di Casamicciola Terme	Lavori da affidare	1.486.786,00 €	0%



CASAMICCIOLA TERME




In corso Lavori 60%

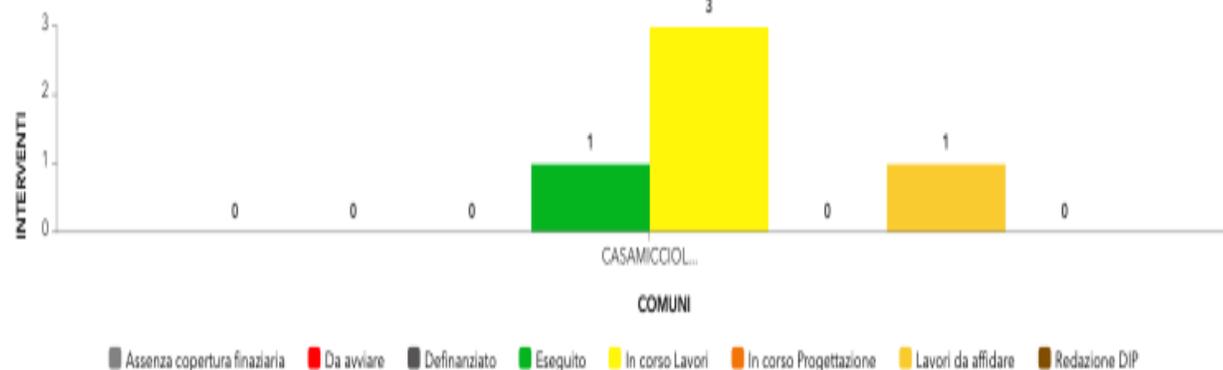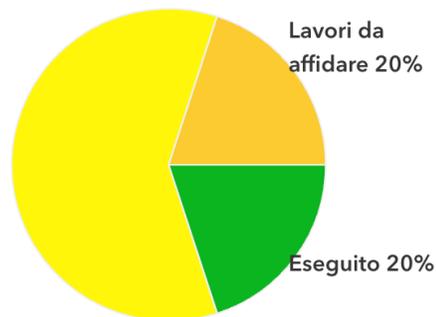



Sintesi stato di attuazione degli interventi post-frana Commissario Delegato

	Interventi Piano di Protezione Civile						Interventi di competenza del Commissario Delegato e finanziati con fondi Regione Campania						Piano fanghi – Ordinanza Speciale Commissario Straordinario n.5 e 7						TOTALE COMPLESSIVO
	Conclusi	Con lavori in corso	Lavori da affidare	In fase progettuale	Da avviare	Totale	Conclusi	Con lavori in corso	Lavori da affidare	In fase progettuale	Da avviare	Totale	Conclusi	Con lavori in corso	Lavori da affidare	In fase progettuale	Da avviare	Totale	
Casamicciola Terme	16	14	6	11	6	53	1	3		1		5	10	3		1		14	72
Lacco Ameno	10	1	5	4	1	21							3	1				4	25
Forio	15	2	3	8	0	28									1			1	29
Serrara Fontana	13	1	4	8	2	28													28
Ischia	16	1	1	10	3	31													31
Barano d'Ischia	5	1	10	12	1	29													29
Tutti i comuni dell'isola	1					1													1
TOTALE	76	20	29	53	13	191	1	3	0	1	0	5	13	4	1	1	0	19	215

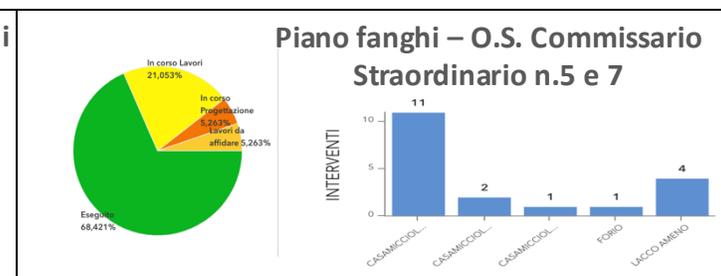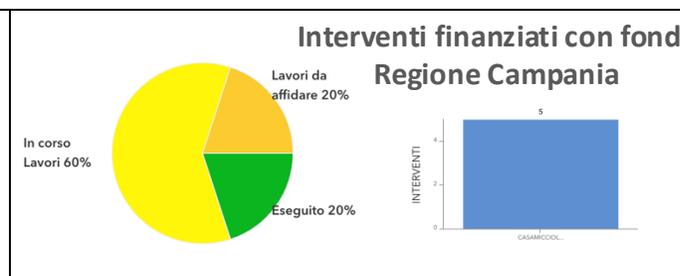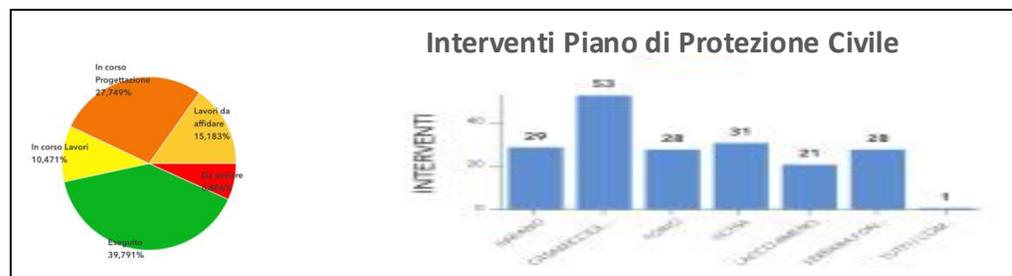

Gli interventi programmati ed avviati a seguito dell'evento franoso del 26 novembre 2022, finanziati per complessivi **€ 93.684.270,55**, sono suddivisi sulla base delle fonti di finanziamento, come di seguito indicato:

A) **191** Interventi del Piano del Dipartimento di Protezione Civile ODCPC 948/22 (stesura iniziale, 1° rimodulazione ottobre 2023, 2° rimodul. Dicembre 2023, 3° rimodul. marzo 2024, 4° rimodul. giugno 2024): **€ 78.241.174,94**;

B) **5** interventi finanziati con fondi Regione Campania (Deliberazione n. 624 del 29/11/2022) + economie dall'appalto di progettazione del ripascimento spiagge isola d'Ischia : **€ 6.676.881,00**;

C) **19** interventi finanziati con i fondi di cui all'art. 5-sexies, c. 1, del D.L. 186/2022 (Ordinanza Speciale n.5/23 – allegato 1, confluiti in Ordinanza Speciale n.7): **€ 20.000.000,00**;

TOTALE INTERVENTI: 218 di cui:
 CONCLUSI:90
 CON LAVORI IN CORSO:27
 LAVORI DA AFFIDARE:30
 IN FASE PROGETTUALE:55
 DA AVVIARE:13





Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

Ordinanza Speciale n.4 – Art. 5-ter STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI Comune di Casamicciola Terme

Elenco interventi piano commissariale di interventi urgenti

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG		IN CORSO GARA PER PROGETTAZIONE

	CODICE INTERVENTO	DESCRIZIONE_INTERVENTO	Stato	IMPORTO FINANZIATO	NOTE	ESEC LAV %
1	CS-01-S01	Vasca di espansione di circa 5000 mc, pulizia biomassa ed eventuali disaggi	In corso affidamento progettazione	6.000.000,00 €	Inseriti in gara opera 2	0
2	CS-02-S03	Realizzazione briglie a pettine	In corso affidamento progettazione	1.000.000,00 €		0
3	CS-03-S04	Realizzazione briglie, recupero briglie esistenti e briglia a gradoni	In corso affidamento progettazione	7.000.000,00 €		0
4	CS-04-S05	Vasca di espansione con briglia selettiva	In corso affidamento progettazione	1.000.000,00 €		0
5	CS-05-S06	Realizzazione vasca espansione con briglia selettiva e recupero briglie esistenti	In corso affidamento progettazione	2.000.000,00 €		0
6	CS-08-CE02a-b	Intervento di riduzione del rischio da flussi detritici in località Celario	In corso affidamento progettazione	9.000.000,00 €		0
7	CS-09-CE03	Inalveazione della cava a valle della località Celario fino all'incrocio con via Celario	In corso affidamento progettazione	4.000.000,00 €		0
8	CS-10-FO01	Inalveazione della cava a valle dell'incrocio con via Celario	In corso affidamento progettazione	3.000.000,00 €		0
9	CS-11-FO02	Realizzazione di una vasca di laminazione e di dissipazione nel tratto medio della cava Fontana	In corso affidamento progettazione	4.000.000,00 €		0
10	CS-12-FO03	Sistemazione del collegamento idraulico tra la via Santa Barbara e la cava Fontana.	In corso affidamento progettazione	2.000.000,00 €		0
11	CS-13-FO04	Ripristino e consolidamento delle briglie esistenti nella cava Fontana a monte dell'intersezione con la cava Sinigallia.	In corso affidamento progettazione	4.000.000,00 €		0
12	CS-14-CU02	Interventi di mitigazione dell'impatto dei flussi detritici della cava Cuccufriddo.	In corso affidamento progettazione	4.000.000,00 €	Inseriti in gara opera 1	0
13	CS-15-CU03	Miglioramento dell'officiosità idraulica del tratto tombato alla foce della cava Cuccufriddo	In corso affidamento progettazione	2.000.000,00 €		0
14	CS-16-CU04	Sistemazione idraulica della cava Cuccufriddo a valle fino alla tombatura	In corso affidamento progettazione	2.000.000,00 €		0
15	CS-17-MO02	Sistemazione idraulica della cava Del Monaco fino alla confluenza con la cava La Rita	In corso affidamento progettazione	4.000.000,00 €		0
16	CS-18-MO03	Briglie aperte nel tratto della cava Del Monaco subito a monte della confluenza con la cava La Rita	In corso affidamento progettazione	5.000.000,00 €		0
17	CS-47-M005		In corso affidamento progettazione	14.000.000,00 €		0
18	CS-19-F01	Intervento di rinforzo di circa 250 metri lungo l'asse longitudinale del fondo alveo; asportazione di circa 2000 mc di materiale, installazione di briglie.	In corso affidamento progettazione	5.000.000,00 €	Inseriti in gara opera 3	0
19	CS-20-F03	Intervento di realizzazione briglie su circa 200 metri di alveo	In corso affidamento progettazione	3.000.000,00 €		0
20	CS-21-F04	Realizzazione vasca di accumulo	In corso affidamento progettazione	1.000.000,00 €		0
21	CS-22-F06	Pulizia alveo e realizzazione briglie; ripristino briglie esistenti qualora possibile	In corso affidamento progettazione	3.000.000,00 €		0
22	CS-23-F08	Realizzazione vasca di accumulo	In corso affidamento progettazione	1.000.000,00 €		0
23	CS-24-F09	Realizzazione barriera e soglie	In corso affidamento progettazione	3.000.000,00 €		0
24	CS-25-C01	Ripristino terrazzamenti e regimentazione acque con briglie	In corso affidamento progettazione	2.000.000,00 €		0
25	CS-26-C02	Realizzazione di briglia a pettine e interventi corticali	In corso affidamento progettazione	1.000.000,00 €		0
26	CS-27-N01	Rifacimento briglia, rimozione materiale e sistemazioni	In corso affidamento progettazione	2.000.000,00 €		0
27	CS-28-N02	Realizzazione gradonata, briglie, stabilizzazione versanti e pulizia biomassa con eventuali disaggi	In corso affidamento progettazione	6.000.000,00 €		0



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE ENTRO I PROSSIMI 90GG		IN CORSO GARA PER PROGETTAZIONE

	CODICE INTERVENTO	DESCRIZIONE_INTERVENTO	Stato	IMPORTO FINANZIATO	NOTE	ESEC LAV %
28	CS-29-P01	Sistemazione del reticolo idraulico e vasca di espansione di circa 1000 mc	In corso affidamento progettazione	3.000.000,00 €	Inseriti in gara opera 4	0
29	CS-30-P02a	Intervento con 10 soglie;	In corso affidamento progettazione	3.000.000,00 €		0
30	CS-31-P03	Vasca con griglie a pettine sul lato di valle	In corso affidamento progettazione	1.000.000,00 €		0
31	CS-32-MO01	Pulizia e ripristino delle briglie nel tratto montano della cava Del Monaco	In corso affidamento progettazione	2.000.000,00 €	Inseriti in gara opera 5	0
32	CS-33-MO04	Sistemazione dei fossi minori presenti nel bacino della cava La Rita-Cuccufreddo-Del Monaco	In corso affidamento progettazione	2.000.000,00 €		0
33	CS-34-S02	Stabilizzazione alveo e ripristino viabilità	In corso affidamento progettazione	2.000.000,00 €	Inserito in gara opera 6	0
34	CS-35-F02	Intervento di rinforzo corticale con estensione di circa 100 metri di lunghezza e circa 50 metri di sviluppo di pendio, pulizia biomassa ed eventuali disaggi	In corso affidamento progettazione	2.000.000,00 €	Inseriti in gara opera 7	0
35	CS-36-F07	Interventi di consolidamento di circa 4000 mq di pendio	In corso affidamento progettazione	1.000.000,00 €		0
36	CS-37-F10	Pulizia alveo, rimozione materiale ed interventi di stabilizzazione pendii	In corso affidamento progettazione	2.000.000,00 €		0
37	CS-38-P02b	Sistemi soil nailing con reti aderenti per i pendii maggiormente acclivi, rinverdimento incluso.	In corso affidamento progettazione	2.000.000,00 €	Inserito in gara opera 8	0
38	CS-39-P02c	Intervento di rinforzo lungo circa 200 metri circa di fondo alveo e altezza di pendii fino a 20 metri comprensivo di pulizia biomassa e disaggi.	In corso affidamento progettazione	2.000.000,00 €		0
39	CS-40-IC02	Sistemazione agronomico-forestale del tratto di cornice sommitale	In corso progettazione	1.000.000,00 €	Affidamento diretto – opera 13	0
40	CS-41-IC04	Regimazione del deflusso superficiale a monte del centro abitato	In corso affidamento progettazione	2.000.000,00 €	Inserito in gara opera 9	0
41	CS-42-IC05	Interventi per la riduzione del rischio delle frazioni alle pendici dell'Epomeo	In corso affidamento progettazione	6.000.000,00 €	Inserito in gara opera 10	0
42	CS-43-CU01	Sistemazione e pulizia del tratto montano della cava Cuccufreddo	In corso affidamento progettazione	1.000.000,00 €	Affidamento diretto	0
43	CS-44-F05	Intervento di disaggio e trasporto della biomassa	In corso affidamento progettazione	1.000.000,00 €	Inserito in gara opera 11	0
44	CS-45-IC01	Cartografia di base	In corso progettazione	100.000,00 €	Affidamento al corpo forestale dei carabinieri	0
45	CS-46-IC03	Interventi di mitigazione del rischio da caduta di blocchi dai costoni delle zone sommitali	In corso affidamento progettazione	4.000.000,00 €	Inserito in gara opera 12	0
46	CS-48-IC06	Interventi per il miglioramento fognario nell'area dell'abitato di Casamicciola	Da avviare	4.000.000,00 €	Inserito in gara opera 14	0
47	CS-49-IC07	Interventi per la riduzione del rischio frana nell'area del centro abitato di Casamicciola	Da avviare	12.000.000,00 €	Inserito in gara opera 15	0



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

Ulteriori interventi da eseguire sul territorio del Comune di Casamicciola
compresi nel piano approvato con l'Ordinanza Speciale n.4
Aggiornamento di agosto 2024
(PFTE redatto da SMA)

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		

CODICE INTERVENTO	DESCRIZIONE_INTERVENTO	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CD-CT-2-010	Completamento consolidamento via Vicinale Castanito località Piccola Sentinella	Redatto PFTE dl50/2016	496.967,77 €	5
CD-CT-2-019	Completamento risistemazione marciapiedi e parapetti via Santa Barbara e parcheggio Celario e risistemazione canalone di captazione delle acque meteoriche	Da avviare	1.400.000,00 €	0
CD-CT-2-020	Completamento intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell'alveo Senigallia	Redatto PFTE dl50/2016	1.710.072,53 €	5
CD-CT-2-021	Completamento intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell'alveo Cava Fontana – Vallone Selva	Redatto PFTE dl50/2016	2.713.746,24 €	5
CD-CT-2-022	Completamento intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica degli alvei Negroponte (foce), Fasaniello o Ervaniello	Redatto PFTE dl50/2016	1.435.476,35 €	5
CD-CT-2-029	Completamento : consolidamento delle scarpate laterali del torrente cuccufriddo incrocio con via Arenale e via Montecito, nonché messa in sicurezza delle strade coinvolte	Da avviare	1.222.423,39 €	0
CD-CT-2-039	Completamento intervento di consolidamento costone sovrastante via Mortito	Redatto PFTE dl36/2023	1.057.426,19 €	5
CD-CT-2-009	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone località Valle del Cotto per una lunghezza di circa mt 50,00 ed un'altezza di circa mt 20,00 -Primi interventi di messa in sicurezza	Redatto PFTE dl50/2016	473.945,75 €	5
CD-CT-2-101	consolidamento delle scarpate laterali dell'alveo la Rita e cava del Monaco	Redatto PFTE dl36/2023	2.500.000,00 €	5
CD-CT-2-102	intervento di messa in sicurezza del cotone a ridosso abitazioni su via Tommaso Morgera	Da avviare	500.000,00 €	0
CD-CT-2-103	intervento di messa in sicurezza del cotone su via Dott. Mennella incombente sulle abitazioni Piazza Marina	Da avviare	500.000,00 €	0



Ulteriori interventi da eseguire sul territorio degli altri Comuni dell'isola e
compresi nel piano approvato con l'Ordinanza Speciale n.4 –
Aggiornamento di marzo 2024

Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia

Commissario Delegato emergenza Ischia

Comune di Lacco Ameno

CODICE_INTERVENTO	COMUNE	TITOLO_INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Stato
CS-LA-2-004	Lacco Ameno	Completamento dell'intervento di messa in sicurezza e consolidamento del Costone incombente su via nuova Montevico	2.509.852,66 €	Da finanziare
CS-LA-2-005	Lacco Ameno	Completamento dell'intervento di messa in sicurezza e consolidamento del costone orientale di Montevico	3.665.910,96 €	Da finanziare
CS-LA-2-006	Lacco Ameno	Completamento delle opere di messa in sicurezza e consolidamento del costone settentrionale di Montevico	1.075.800,00 €	Da finanziare
CS-LA-2-007	Lacco Ameno	Completamento dell'intervento di messa in sicurezza e consolidamento del costone retrostante la tribuna del campo sportivo comunale	1.075.800,00 €	Da finanziare
CS-LA-2-008	Lacco Ameno	Completamento dell'intervento di messa in sicurezza e consolidamento del costone meridionale al campo sportivo comunale	492.500,00 €	Da finanziare
CS-LA-2-015	Lacco Ameno	Completamento dell'intervento di messa in sicurezza e consolidamento del costone incombente sulla spiaggia di Varuliello	885.000,00 €	Da finanziare
CS-LA-3-101	Lacco Ameno	Messa in sicurezza e consolidamento del costone incombente su via Cava Pannella	2.650.000,00 €	Da finanziare
CS-LA-3-102	Lacco Ameno	Messa in sicurezza e consolidamento del costone incombente su via Circumvallazione	1.570.000,00 €	Da finanziare
CS-LA-3-103	Lacco Ameno	Messa in sicurezza e consolidamento del costone incombente sulla spiaggia di Varulo	3.080.000,00 €	Da finanziare
CS-LA-3-104	Lacco Ameno	Messa in sicurezza e consolidamento di Cava Scialicco	9.400.000,00 €	Da finanziare
CS-LA-3-105	Lacco Ameno	Messa in sicurezza e consolidamento di Cava La Rita	5.600.000,00 €	Da finanziare
CS-LA-3-107	Lacco Ameno	Progettazione dell'intervento presso il costone di Montevico lato baia di san montano	2.013.220,28 €	Da finanziare



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

Comune di Barano d'Ischia

CODICE_INTERVENTO	COMUNE	TITOLO_INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Stato
CS-BI-2-011	Barano d'Ischia	Lavori per la messa in sicurezza dei costoni latitanti la strada pubblica di Via Schiappone (fase 2)	700.000,00 €	Da finanziare
CS-BI-2-012	Barano d'Ischia	I STRALCIO FUNZIONALE - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei costoni spiaggia dei Maronti	2.000.000,00 €	Da finanziare
CS-BI-2-013	Barano d'Ischia	Completamento dei lavori di Somma urgenza per il ripristio della funzionalità idraulica dell'Alveo Cava Zaffarano	2.205.000,00 €	Da finanziare
CS-BI-3-012	Barano d'Ischia	II STRALCIO FUNZIONALE - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei costoni spiaggia dei Maronti	2.470.000,00 €	Da finanziare
CS-BI-3-102	Barano d'Ischia	Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo Rio Corbore, con pulizia del bacino idrico, posa di briglie e messa in sicurezza degli argini	991.666,67 €	Da finanziare
CS-BI-3-103	Barano d'Ischia	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei costoni e ripristino della funzionalità idraulica Alveo Cava Ponte/Nitrodi/Olmitello	6.076.666,67 €	Da finanziare
CS-BI-3-104	Barano d'Ischia	Lavori di Somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica dell'Alveo Cava Rosato/ Cavone Martoccio	1.595.833,33 €	Da finanziare
CS-BI-3-105	Barano d'Ischia	Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica dell'Alveo Piano San Paolo loc. Buceto	4.293.750,00 €	Da finanziare
CS-BI-3-106	Barano d'Ischia	Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza della scala di accesso alla Spiaggia dei Maronti	1.200.000,00 €	Da finanziare
CS-BI-3-108	Barano d'Ischia	lavori di ripristino della funzionalità idraulica e sistemazioni Alveo Cava Li Massi /Licciesi/Candiano	2.642.500,00 €	Da finanziare
CS-BI-3-109	Barano d'Ischia	lavori di ripristino della funzionalità idraulica e sistemazioni costoni laterali Alveo Cava San Pietro/Olmitello	885.000,00 €	Da finanziare
CS-BI-4-101	Barano d'Ischia	Sistemazione, opere di contenimento, ecc (Tra i comuni di Barano e Casamicciola)	1.000.000,00 €	Da finanziare
CS-BI-4-102	Barano d'Ischia	sistemazione, opere di contenimento, ecc	1.000.000,00 €	Da finanziare



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

Comune di Forio

CODICE_INTERVENTO	COMUNE	TITOLO_INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Stato
CS-FO-2-008	Forio	CONSOLIDAMENTO VERSANTI INCOMBENTI SULLA LOCALITA' CORBARO	3.500.000,00 €	Da finanziare
CS-FO-2-012	Forio	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ALVEO PUNTA CHIARITO SOTTOSTANTE ALL'AREA ARCHEOLOGICA	2.542.400,00 €	Da finanziare
CS-FO-2-013	Forio	MESSA IN SICUREZZA COSTONE E STRADA SOVRASTANTE - stralcio funzionale 1	5.000.000,00 €	Da finanziare
CS-FO-3-006	Forio	sistemazione idrogeologica del reticolo idrografico afferente il bacino pennanova-stennecchia	5.500.000,00 €	Da finanziare
CS-FO-3-007	Forio	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO AFFERENTE IL BACINO CAVA SCIALICCO	3.000.000,00 €	Da finanziare
CS-FO-3-009	Forio	MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI MONTENUOVO E CHIGNOLE INCOMBENTI SULL'ABITATO MONTERONE	5.000.000,00 €	Da finanziare
CS-FO-3-010	Forio	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO AFFERENTE IL BACINO PIELLERO -CAVA CAMPO	4.000.000,00 €	Da finanziare
CS-FO-3-014	Forio	MESSA IN SICUREZZA COSTONE E STRADA SOVRASTANTE - stralcio funzionale 2	13.000.000,00 €	Da finanziare
CS-FO-3-101	Forio	MESSA IN SICUREZZA COSTONI	1.200.000,00 €	Da finanziare
CS-FO-3-101	Forio	Località pietre Rosse- Costone sottostante parcheggio omonimo ed incombente parzialmente sulla spiaggia Cava dell'Isola	2.500.000,00 €	Da finanziare
CS-FO-3-102	Forio	Località Sorgeto - Costoni incombenti omonima baia	3.000.000,00 €	Da finanziare
CS-FO-3-103	Forio	Località Pomicione- Costone sottostante via Belvedere	2.500.000,00 €	Da finanziare
CS-FO-3-104	Forio	Località Punta imperatore - tratto di costone sottostante Via Costa	1.000.000,00 €	Da finanziare
CS-FO-3-105	Forio	Località Citara - tratto via Mazzella ricompreso tra piazzale Pietre Rosse ed incrocio ss270 - muro di sostegno della sede stradale	800.000,00 €	Da finanziare
CS-FO-3-106	Forio	Dissesti diffusi ss270 e del sistema viario comunale	1.500.000,00 €	Da finanziare
CS-FO-3-107	Forio	Opere di Consolidamento e barriera paramassi costoni incombenti baia di Sorgeto	700.000,00 €	Da finanziare
CS-FO-3-108	Forio	Dragaggio Porto di Forio	500.000,00 €	Da finanziare
CS-FO-3-109	Forio	Consolidamento costone punta Imperatore	350.000,00 €	Da finanziare



Comune di Ischia

CODICE_INTERVENTO	COMUNE	TITOLO_INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Stato
CS-IS-2-005	Ischia	Realizzazione di muro di contenimento con fondazione in cls	848.000,00 €	Da finanziare
CS-IS-2-007	Ischia	IL STRALCIO FUNZIONALE - Verifica della stabilità del costone, indagini e rilievi. lavori di decespugliamento e taglio arbusti. Opere di mitigazione del rischio idrogeologico mediante:	7.000.000,00 €	Da finanziare
CS-IS-2-008	Ischia	Verifica della stabilità del costone e lavori di decespugliamento e taglio arbusti e intervento di contenimento del costone mediante geostuoia e rete armata a doppia torsione ancorata	1.700.000,00 €	Da finanziare
CS-IS-2-009	Ischia	Lavori di manutenzione straordinaria alvei presenti sul territorio comunale: alvei ubicati presso TRAVERSA VIA ARENELLA / VIA TIRABELLA	960.000,00 €	Da finanziare
CS-IS-2-011	Ischia	Lavori di manutenzione straordinaria alvei presenti sul territorio comunale: alveo ubicato presso VIA CRETAIO	2.220.000,00 €	Da finanziare
CS-IS-2-012	Ischia	Lavori di manutenzione straordinaria alvei presenti sul territorio comunale: alveo ubicato presso ZONA PIANO LIGUORI (VIA CARAUCIO)	1.650.000,00 €	Da finanziare
CS-IS-2-013	Ischia	Lavori di manutenzione straordinaria alvei presenti sul territorio comunale: alveo ubicato presso CAVONE VIA CAMPAGNANO - SPIAGGIA CARTAROMANA	2.540.000,00 €	Da finanziare
CS-IS-3-007	Ischia	IL STRALCIO FUNZIONALE - Verifica della stabilità del costone, indagini e rilievi. lavori di decespugliamento e taglio arbusti. Opere di mitigazione del rischio idrogeologico mediante:	7.500.000,00 €	Da finanziare
CS-IS-3-101	Ischia	LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DI VIA ARENELLA IN LOCALITÀ PILASTRI DEL COMUNE DI ISCHIA (NA)	600.000,00 €	Da finanziare
CS-IS-3-101	Ischia	Verifica della stabilità del costone e lavori di decespugliamento e taglio arbusti e intervento di contenimento del terrapieno mediante geostuoia e rete armata a doppia torsione ancorata	1.600.000,00 €	Da finanziare
CS-IS-3-102	Ischia	Verifica della stabilità del costone ed Interventi di mitigazione del rischio frana mediante realizzazione di rinforzo corticale con applicazione rete paramassi ed opere di captazione e convogliamento delle acque meteoriche	3.000.000,00 €	Da finanziare
CS-IS-3-102	Ischia	Lavori urgenti per la sistemazione idrogeologica di via TIRABELLA in l.tà pilastri	600.000,00 €	Da finanziare
CS-IS-3-103	Ischia	MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE OPERE DI SOSTEGNO, INTERVENTI DI DISGAGGIO E RETE PARAMASSI SUL COSTONE E CUNETTA IN PIETrame PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE SUPERFICIALI - LOCALITA' PIANO LIGUORI NEL COMUNE DI ISCHIA.	1.000.000,00 €	Da finanziare
CS-IS-3-103	Ischia	Sistemazione idrogeologica (if11) nel comune di Ischia -bordo settentrionale dell'alto morfologico denominato "TORONE - II LOTTO	3.271.519,00 €	Da finanziare
CS-IS-3-104	Ischia	MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE OPERE DI SOSTEGNO, INTERVENTI DI DISGAGGIO E RETE PARAMASSI SUL COSTONE E CUNETTA IN PIETrame PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE SUPERFICIALI - LOCALITA' PIANO LIGUORI NEL COMUNE DI ISCHIA.	1.000.000,00 €	Da finanziare
CS-IS-3-105	Ischia	Mitigazione rischio idrogeologico mediante realizzazione di muro di sostegno in c.a., tiranti di ancoraggio, interventi di disgaggio e rete paramassi sul costone VIA QUERCIA".	2.620.000,00 €	Da finanziare
CS-IS-3-106	Ischia	Lavori di Regimentazione delle acque nella zona di via Campagnano "STRADA VICINALE DI CARTA ROMANA"	2.000.000,00 €	Da finanziare
CS-IS-3-107	Ischia	Realizzazione di n.19 alloggi di edilizia residenziale pubblica in località Campagnano (Ischia).	3.800.000,00 €	Da finanziare



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

Comune di Serrara Fontana

CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO_INTERVENTO	IMPOR TO INTERVENTO	Stato
CD-SF-3-110	Serrara Fontana	Realizzazione di muri di contenimento alla base dei costoni e sovrastante applicazione di rete paramassi con geostuoia sulla parte superior e fino alla sommità del crinale.	1.700.000,00 €	Da finanziare
CD-SF-3-112	Serrara Fontana	sistemazione / realizzazione opere di contenimento, rafforzamento corticale	1.500.000,00 €	Da finanziare
CD-SF-4-101	Serrara Fontana	sistemazione, opere di contenimento, ecc	400.000,00 €	Da finanziare
CD-SF-4-103	Serrara Fontana	sistemazione, opere di contenimento, ecc	3.500.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-2-001	Serrara Fontana	Opere di contenimento del costone con applicazioni di reti paramassi con ancoraggi con profondità media, compresa applicazione di geostuoia ed utilizzo di elicottero per collocazione delle reti in sommità al costone.	1.105.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-2-002	Serrara Fontana	Realizzazioni di pareti di contenimento spondale in cls armato e rivestimento murario con pietre locali; applicazione di reti paramassi con relativa geostuoia per successivo inverdimento, lungo tutto il tratto e nelle due diramazioni.	2.430.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-2-003	Serrara Fontana	Realizzazione di tratti di muri di contenimento spondali, realizzazione di micropali a consolidamento di tratti viari e di costoni, installazione di reti paramassi.	3.500.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-2-004	Serrara Fontana	Lavori di manutenzione straordinaria, opere di regimentazione delle acque, completo ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo	2.000.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-2-005	Serrara Fontana	Realizzazione di muri di contenimento alla base dei costoni e sovrastante applicazione di rete paramassi con geostuoia sulla parte superiore fino alla sommità del crinale.	1.510.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-2-006	Serrara Fontana	Lavori di manutenzione straordinaria, opere di regimentazione delle acque, completo ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo	300.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-2-007	Serrara Fontana	Lavori di manutenzione straordinaria, opere di regimentazione delle acque, completo ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo	800.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-2-008	Serrara Fontana	Lavori di manutenzione straordinaria, opere di regimentazione delle acque, completo ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo.	700.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-2-009	Serrara Fontana	Lavori di manutenzione straordinaria, opere di regimentazione delle acque, completo ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo.	1.500.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-2-010	Serrara Fontana	Lavori di manutenzione straordinaria, opere di regimentazione delle acque, completo ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo.	2.500.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-2-011	Serrara Fontana	Realizzazione di muretti spondali, installazione di reti paramassi con chiodature profonde e non, applicazione di geostuoia per successivo inverdimento. Sottostante l'abitato di via Iesca.	2.500.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-2-012	Serrara Fontana	Realizzazione di reti paramassi con geostuoia per successivo rinverdimento, con realizzazione di parte dei muretti spondali alla base per evitare fenomeni di scavo per ruscellamento.	450.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-3-101	Serrara Fontana	Realizzazione di opere di contenimento a protezione del piede del costone da fenomeni erosivi alla base, installazione di reti paramassi con geostuoia e chiodatura profonda.	3.000.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-3-102	Serrara Fontana	Realizzazione di muri in cls armato e rivestimento in pietra a consolidamento del terreno, installazione di reti paramassi e geostuoia per alcuni tratti e realizzazione di palificata a sostegno del primo tratto di strada	2.000.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-3-103	Serrara Fontana	Consolidamento dei costoni con reti paramassi e realizzazione di scogliere per la difesa delle coste	7.000.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-3-104	Serrara Fontana	Installazione di reti paramassi con chiodature profonde ed applicazione di geostuoia per successivo rinverdimento. Tratto di costone a sostegno di via Quadro.	1.500.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-3-105	Serrara Fontana	Realizzazione di palificata in cls armato a sostegno di muro di contenimento in cls armato e rivestimento in pietra locale; applicazione di rete paramassi e geostuoia. Località Cavamare.	405.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-3-106	Serrara Fontana	Recupero della banchina esistente fortemente danneggiata, mediante realizzazione di palificata, riempimento e ripavimentazione	250.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-3-107	Serrara Fontana	Realizzazione di muri in pietra spondali a contenimento dei piccoli costoni presenti, realizzazione di briglie lungo il percorso e di viminate a contenimento dei piccoli dislivelli presenti.	1.750.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-3-108	Serrara Fontana	Realizzazione di muri in pietra spondali a contenimento dei piccoli costoni presenti, realizzazione di briglie lungo il percorso e di viminate a contenimento dei piccoli dislivelli presenti.	3.500.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-3-109	Serrara Fontana	Lavori di manutenzione straordinaria, opere di regimentazione delle acque, completo ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo.	1.500.000,00 €	Da finanziare



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

Tutti i comuni dell'isola

CODICE_INTERVENTO	COMUNE	TITOLO_INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Stato
CD-TC-2-001	Tutti i Comuni di Ischia	Interventi di messa in sicurezza dei sentieri sull'isola di Ischia danneggiati a seguito dell'alluvione del 26 novembre	600.000,00 €	Da finanziare

Gli interventi urgenti per la sicurezza e la ricostruzione previsti dal Piano commissariale (Ai sensi dell'art.5 – ter della Legge n.9 del 2023), così come aggiornato nel marzo 2024 consistono in:

- A) 47 Interventi nel comune di Casamicciola Terme, suddivisi in 15 opere, di cui 12 già a gara per affidamento servizi di progettazione, per complessivi:€ 168.600.000,00;
- B) 11 ULTERIORI INTERVENTI LETT. D COMMA 2 ART. 25 DEL D.LGS 1 2018 da eseguire nel comune di Casamicciola Terme, per complessivi:€ 14.010.058,22;
- C) 87 interventi da eseguire negli altri comuni dell'isola (Lacco Ameno, Forio, Ischia, Serrara Fontana, Barano d'Ischia). Per complessivi.....€ 208.480.419,57;



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA COMMISSARIO STRAORDINARIO POST SISMA

Ord. Speciali n. 1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 8 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI Comune di Casamicciola Terme

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CS-OS-CT-01	Casamicciola Terme	Edificio Casa Comunale denominato "Palazzo Bellavista o Napoleon" - Miglioramento / adeguamento sismico, efficientamento termico ed adeguamento funzionale.	Comune di Casamicciola Terme	Lavori da affidare	5.359.768,47 €	10
CS-OS-CT-02	Casamicciola Terme	Lavori di miglioramento/adeguamento sismico, ripristino e riqualificazione dell'ex Osservatorio Geodinamico, già sede del museo civico e della piazzola antistante	Comune di Casamicciola Terme	In corso Progettazione	3.195.409,42 €	5
CS-OS-CT-03	Casamicciola Terme	Consolidamento del versante sito in località Piccola Sentinella di interazione geologico-tecnica con l'area su cui è ubicato l'edificio scolastico Ibsen.	Commissario Straordinario	In corso Progettazione	1.968.118,40 €	5
CS-OS-CT-04	Casamicciola Terme	Miglioramento/adeguamento sismico e adeguamento funzionale del Plesso Scolastico Sanseverino con abbattimento e ricostruzione.	Comune di Casamicciola Terme	In corso Lavori	1.927.252,80 €	15
CS-OS-CT-05	Casamicciola Terme	Intervento di miglioramento/adeguamento sismico e adeguamento funzionale del Plesso Scolastico A. Manzoni.	Agenzia del Demanio	In corso Progettazione	7.512.535,73 €	5
CS-OS-CT-06	Casamicciola Terme	Lavori di Miglioramento / adeguamento sismico e adeguamento con abbattimento e ricostruzione del plesso scolastico Lembo	Comune di Casamicciola Terme	In corso lavori	4.428.999,92 €	10
CS-OS-CT-07	Casamicciola Terme	Consolidamento del versante denominato Collinetta Paradisiello di interazione geologico-tecnica con le aree di sedime degli interventi Palazzo Bellavista (Napoleon), Plesso Scolastico Manzoni e Plesso scolastico San Severino.	Commissario Straordinario	In corso Progettazione	5.239.280,00 €	5
CS-OS-CT-08	Casamicciola Terme	Intervento di adeguamento sismico Plesso Scolastico Ibsen con abbattimento e ricostruzione	Comune di Casamicciola Terme	Da avviare	12.044.419,20 €	0
CS-OS-CT-09	Casamicciola Terme	Lavori di messa in sicurezza e ripristino del Cimitero Monumentale, nonché adeguamento sismico e messa in sicurezza del muro di cinta su via Vicinale Bagnitiello	Comune di Casamicciola Terme	Lavori da affidare	1.082.058,70 €	10
CS-OS-CT-10	Casamicciola Terme	Edificio in via Marina n.13 adibito a sede provvisoria della Casa Comunale denominato "ex Capricho" - Lavori di adeguamento, ripristino e riqualificazione del fabbricato	Comune di Casamicciola Terme	In corso Progettazione	3.139.421,57 €	5



Ord. Spec. n. 1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 8 STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI Comune di Casamicciola Terme

Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CS-OS-CT-11	Casamicciola Terme	REALIZZAZIONE A MARE DELL'ESTENSIONE DELL'ALVEO TOMBATO DENOMINATO "PIO MONTE DELLA MISERICORDIA" CON RELATIVI ADEGUAMENTI URBANISTICI (WATERFRONT)	Comune di Casamicciola Terme	In corso Progettazione	3.544.564,25 €	5
CS-OS-CT-12	Casamicciola Terme	Ripristino del sistema fognario di via De Rivaz	Comune di Casamicciola Terme	Eseguito	545.095,20 €	100

Comune di Forio

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CS-OS-FO-01	Forio	Lavori di miglioramento sismico e funzionale del Palazzo municipale di Forio (NA), ex convento di San Francesco.	Comune di Forio	In corso Progettazione	2.200.000,00 €	5
CS-OS-FO-03-A	Forio	Lavori di messa in sicurezza del tratto di costa a rischio idrogeologico, compresa tra il Promontorio del Soccorso e la località Pietre Rosse - 1 ♦ Lotto ♦ 2 ♦ Stralcio ♦ Lavori di somma urgenza	Comune di Forio	Eseguito	6.585.196,25 €	100
CS-OS-FO-03-B	Forio	Lavori di messa in sicurezza del tratto di costa a rischio idrogeologico, compresa tra il Promontorio del Soccorso e la località Pietre Rosse - 1 ♦ Lotto	Comune di Forio	In corso Progettazione	536.000,00 €	5
CS-OS-FO-04	Forio	Lavori di miglioramento sismico del Plesso Scolastico Istituto Nautico "Cristofaro Mennella"	Comune di Forio	In corso Progettazione	1.320.158,38 €	5
CS-OS-FO-05	Forio	Progetto di adeguamento funzionale della palestra della scuola media in via parroco Leonardo D'Abundo per realizzazione aule scolastiche provvisorie	Comune di Forio	Concluso	489.864,2 €	100



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

Ordinanze Speciali n. 1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 8 STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		

Comune di Lacco Ameno

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CS-OS-LA-01	Lacco Ameno	Intervento di demolizione e ricostruzione della scuola media comunale Istituto Mennella danneggiata dal sisma.	Comune di Lacco Ameno	In corso Progettazione	5.113.147,24 €	5
CS-OS-LA-02	Lacco Ameno	Intervento di miglioramento/adequamento sismico dell'edificio scolastico Liceo scientifico G. Buchner di via Provinciale (ex Liceo scientifico Einstein)	Comune di Lacco Ameno	In corso Progettazione	4.600.000,00 €	5
CS-OS-LA-03	Lacco Ameno	Progettazione, lavori, fornitura, trasporto e posa in opera di moduli definitivi ad uso scolastico provvisorio (MODUSP), nonché recupero per finalità scolastiche provvisorie di un immobile esistente sullo stesso sito.	Comune di Lacco Ameno	In corso Progettazione	6.658.000,00 €	5
CS-OS-LA-04-A	Lacco Ameno	Intervento di miglioramento/adequamento sismico della sede comunale, dei locali della diocesi e dell'area archeologica di Santa Restituta, colpiti dal sisma. PROGETTAZIONE	Agenzia del Demanio	In corso Progettazione	1.738.197,21 €	5
CS-OS-LA-04-B	Lacco Ameno	Intervento di miglioramento/adequamento sismico della sede comunale, dei locali della diocesi e dell'area archeologica di Santa Restituta, colpiti dal sisma. CUSTODIA REPERTI ARCHEOLOGICI	Diocesi di Ischia	In corso Progettazione	215.722,24 €	0
CS-OS-LA-04-C	Lacco Ameno	Intervento di miglioramento/adequamento sismico della sede comunale, dei locali della diocesi e dell'area archeologica di Santa Restituta, colpiti dal sisma. ESECUZIONE LAVORI	Comune di Lacco Ameno	In corso Progettazione	9.263.208,56 €	5
CS-OS-LA-05A	Lacco Ameno	Lavori di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria della Torre costiera aragonese danneggiata dal sisma – Lotto torre	Comune di Lacco Ameno	Lavori da affidare	1.429.964,44 €	10
CS-OS-LA-05B	Lacco Ameno	Lavori di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria alle strutture cimiteriali ed al limitrofo costone danneggiati dal sisma	Comune di Lacco Ameno	Lavori da affidare	1.973.669,81 €	10
CS-OS-LA-06	Lacco Ameno	Opere complementari per l'adequamento sismico dell'edificio scolastico "Principe di Piemonte" danneggiato a seguito del sisma	Comune di Lacco Ameno	In corso lavori	732.000,00 €	45




Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
 Commissario Delegato emergenza Ischia

Demolizioni (su tutti i comuni dell'isola)

LEGENDA			
	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
CS-TC-D-01	CASAMICCIOLA TERME	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE MANUFATTI GIA' DESTINATI A IMPIANTI TERMALI IN LOCALITA' LA RITA	Commissario Straordinario	Eseguito	502.516,22 €	100%
CS-TC-D-02	CASAMICCIOLA TERME	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE MANUFATTI GRAVEMENTE DANNEGGIATI ALLA VIA NIZZOLA	Commissario Straordinario	Lavori da affidare	110.693,93 €	2%
CS-TC-D-03	CASAMICCIOLA TERME	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE MANUFATTI GRAVEMENTE DANNEGGIATI PRESSO VIA SPEZIERIA	Commissario Straordinario	In corso Lavori	745.782,99 €	20%
CS-TC-D-04	LACCO AMENO	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE MANUFATTI GRAVEMENTE DANNEGGIATI PIAZZA FANGO	Commissario Straordinario	In corso Lavori	247.699,31 €	15%
CS-TC-D-05	CASAMICCIOLA TERME	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE MANUFATTI GRAVEMENTE DANNEGGIATI VIA OTTORINGOLO	Commissario Straordinario	In corso Progettazione	1.733.004,16 €	2%
CS-TC-D-06	CASAMICCIOLA TERME	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE MANUFATTI GRAVEMENTE DANNEGGIATI PRESSO VIA SPEZIERIA + LATO NORD	Commissario Straordinario	In corso Progettazione	Da definire	0%

Ubicazione interventi di demolizione e relativo stato di attuazione

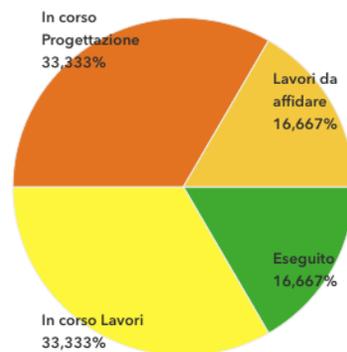



INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA COMMISSARIO STRAORDINARIO POST SISMA

Ord. Speciale n. 1 – 7 - Focus sullo stato di avanzamento degli interventi

Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia

Comune di Casamicciola Terme

Commissario Delegato emergenza Ischia

		QUADRO FINANZIARIO		PROGRAMMAZIONE e QUADRO ESIGENZIALE		PROGETTAZIONE					ESECUZIONE			CONCLUSIONE
CODICE IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE	Importi complessivi stanziati	Importi erogati	Materia Soggetto Attuatore	Riferimento DIF	Procedura di scelta del contraente per il servizio di progettazione ed esecuzione integrati	PRTI in attesa di progetto associativo		Progettazione conclusa		Procedura scelta ditta	Cantieri avviati	Collaudo	Opere concluse
							concluso	approvato in CdS	concluso	approvato in CdS				
CS-OS-CT-01	Edificio Casa Comunale denominato "Palazzo Bellavista o Napoleone" - Miglioramento / adeguamento sismico, efficientamento termico ed adeguamento funzionale.	5.359.769,47 €	64.279,00 €	100%	100%	100%	100%	100%	50%					
CS-OS-CT-02	Lavori di miglioramento/adeguamento sismico, ripristino e riqualificazione dell'ex Osservatorio Geodinamico, già sede del museo civico e della piazzola antistante	3.195.409,42 €	- €	100%	100%	100%	50%							
CS-OS-CT-03	Consolidamento del versante sito in località Piccola Sentinella di intenzione geologico-tecnica con l'area su cui è ubicato l'edificio scolastico Ibsen.	1.999.116,40 €	- €	100%	100%	100%								
CS-OS-CT-04	Miglioramento/adeguamento sismico e adeguamento funzionale del Plesso Scolastico Saraceno con abbattimento e ricostruzione.	1.927.252,80 €	192.725,28 €	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	15%		
CS-OS-CT-05	Intervento di miglioramento/adeguamento sismico e adeguamento funzionale del Plesso Scolastico A. Manzoni.	7.512.695,78 €	- €	100%	100%	100%								
CS-OS-CT-06	Lavori di Miglioramento / adeguamento sismico e adeguamento con abbattimento e ricostruzione del plesso scolastico Lonita - CUP: G34H19999748991	4.428.999,92 €	442.899,99 €	100%	100%	100%			100%	100%	100%			
CS-OS-CT-07	Consolidamento del versante denominato Colonna Paradisiello di intenzione geologico-tecnica con le aree di sedime degli interventi Palazzo Bellavista (Napoleone), Plesso Scolastico Manzoni e Plesso Scolastico San Saverio.	5.239.290,90 €	- €	100%	100%	100%								
CS-OS-CT-08	Intervento di adeguamento sismico Plesso Scolastico Ibsen con abbattimento e ricostruzione.	12.944.419,20 €	- €	100%	100%									
CS-OS-CT-09	Lavori di messa in sicurezza e ripristino del Cimbero Monumentale, nonché adeguamento sismico e messa in sicurezza del muro di cinta su via Vicinale Bagriola - CUP: G31B21001420001	1.082.059,70 €	108.205,67 €	100%	100%	100%			100%	100%				
CS-OS-CT-10	Edificio in via Marina n.13 adibito a sede provvisoria della Casa Comunale denominato "ex Capriccio" - Lavori di adeguamento, ripristino e riqualificazione del fabbricato.	3.139.421,57 €	83.831,28 €	100%	100%	100%	50%							
CS-OS-CT-11	REALIZZAZIONE A MARE DELL'ESTENSIONE DELL'ALVEDO DENOMINATO "PRO MONTE DELLA MISERICORDIA" CON RELATIVI ADEGUAMENTI URBANISTICI (VATERRONT).	3.544.694,90 €	586.892,00 €	100%	100%		100%	50%						
CS-OS-CT-12	Ripristino del sistema fognario di via De Riva.	545.095,90 €	272.547,60 €	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%



INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA COMMISSARIO STRAORDINARIO POST SISMA Ord. Speciale n. 2 - Comune di Lacco Ameno

Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

CODICE IDENTIFICATIVO		DENOMINAZIONE	QUADRO FINANZIARIO		PROGRAMMAZIONE e QUADRO ESIGENZIALE		PROGETTAZIONE				ESECUZIONE			CONCLUSIONE	
			Importi complessivi stanziati	Importi erogati	Minima Soggetta Attuatore	Perfezione DIP	Procedura di scelta del contrattista per il servizio di progettazione ed esecuzione (inadgn)		PATE in attesa di progetto esecutivo		Progettazione conclusa		Procedura scelta ditta	Cantieri Avviati	Collaudo
								concluso	approvato in C&S	concluso	approvato in C&S				
CS-OS-LA-01		Intervento di demolizione e ricostruzione della scuola media comunale Istituto Merello danneggiata dal sisma.	5.113.147,24 €	88.343,37 €	100%	100%	100%	100%	100%	50%					
CS-OS-LA-02		Intervento di miglioramento/adeguamento sismico dell'edificio scolastico Liceo scientifico Giorgio Bachelet di via Provinciale (ex Liceo scientifico Einstein) - Lacco Ameno colpito dal sisma.	4.699.000,00 €	88.713,38 €	100%	100%	100%	50%							
CS-OS-LA-03		Progettazione, lavori, fornitura, trasporto e posa in opera di moduli definitivi ad uso scolastico provvisorio (MODUSP), nonché recupero per finalità scolastiche provvisoria di un immobile esistente sullo stesso sito.	6.658.000,00 €	364.900,00 €	100%	100%	100%	100%	100%						
CS-OS-LA-04A		Intervento di miglioramento/adeguamento sismico della sede comunale, dei locali della diocesi e dell'area archeologica di Santa Restituta, colpiti dal sisma. PROGETTAZIONE	1.738.197,21 €	695.279,88 €	100%	100%	100%	50%							
CS-OS-LA-04B		Intervento di miglioramento/adeguamento sismico della sede comunale, dei locali della diocesi e dell'area archeologica di Santa Restituta, colpiti dal sisma. CUSTODIA, REPERTI ARCHEOLOGICI	215.722,24 €	- €	100%					50%					
CS-OS-LA-04C		Intervento di miglioramento/adeguamento sismico della sede comunale, dei locali della diocesi e dell'area archeologica di Santa Restituta, colpiti dal sisma. ESECUZIONE LAVORI	9.263.208,56 €	- €	100%										
CS-OS-LA-05A		Lavori di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria della Torre costiera aragonese danneggiata dal sisma	1.429.904,44 €	- €	100%	100%	100%			100%	100%				
CS-OS-LA-05B		Lavori di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria alle strutture limitate ed al limitrofo costone danneggiati dal sisma	1.973.669,81 €	- €	100%	100%	100%								
CS-OS-LA-06		Opere complementari per l'adeguamento sismico dell'edificio scolastico "Principe di Piemonte" danneggiato a seguito del sisma del 21 agosto 2017	792.000,00 €	- €	100%	100%	100%			100%	100%	100%	45%		



INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA COMMISSARIO STRAORDINARIO POST SISMA Ord. Speciale n. 3 - Comune di Forio

Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

		QUADRO FINANZIARIO		PROGRAMMAZIONE e QUADRO ESIGENZIALE		PROGETTAZIONE					ESECUZIONE			CONCLUSIONE	
CODICE IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE	Importi complessivi stanziati	Importi erogati	Materia Soggetta Attuatore	Definizione DIP	Procedura di scelta del contraente per il servizio di progettazione ed esecuzione inaffidati	PRTI in attesa di progetto esecutivo		Progettazione conclusa		Procedura scelta edita	Cantieri avviati	Collaudo	Opere concluse	
							conclusa	approvata in CdS	conclusa	approvata in CdS					
CS-08-FO-01	Lavori di miglioramento sismico e funzionale del Palazzo municipale di Forio (NA), ex convento di San Francesco.	2.288.000,00-€	- €	100%	100%	100%	100%	100%							
CS-08-FO-03A	Lavori di messa in sicurezza del tratto di costa a rischio idrogeologico, compresa tra il Promontorio del Soccorso e la località Pietra Rossa - 1° Lotto - 2° Stralcio - Lavori di somma urgenza	538.000,00-€	- €	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
CS-08-FO-03B	Lavori di messa in sicurezza del tratto di costa a rischio idrogeologico, compresa tra il Promontorio del Soccorso e la località Pietra Rossa - 1° Lotto	6.585.198,25-€	- €	100%	100%	100%	100%								
CS-08-FO-04	Lavori di miglioramento sismico del Plezzo Scolastico Istituto Nautico "Cristoforo Colombo"	1.320.158,38-€	- €	100%	100%	100%	50%								
CS-08-FO-05	Progetto di adeguamento funzionale della palestra della scuola media in via parroco Leonardo D'Abundo per realizzazione aula scolastiche provvisoria	488.864,20-€	- €	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%



Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia



INTERVENTI DI DEMOLIZIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO POST SISMA Ord. Speciale n. 8

		QUADRO FINANZIARIO		PROGRAMMAZIONE e QUADRO ESIGENZIALE		PROGETTAZIONE				ESECUZIONE			CONCLUSIONE	
CODICE IDENTIFICATIVO	DENOMINAZIONE	Importi complessivi stanziati	Importi erogati	Materia soggetta Attuatore	Revisione DIP	Procedura di scelta del contraente per il servizio di progettazione ed esecuzione inaffidati	PATE in attesa di progetto esecutivo		Progettazione conclusa		Procedura scelta d'urto	Cantieri avviati	Collaudo	Opere concluse
							concluso	approvato	concluso	approvato				
CS-TC-D-01	Fondo per le demolizioni e messa in sicurezza degli edifici colpiti dal sisma e dalla frana, per il recupero o lo smaltimento delle relative macerie - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE MANUFATTI GIÀ DESTINATI A IMPIANTI TERMALI IN LOCALITÀ LA RITA.	592.616,22 €	- €	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%		100%
CS-TC-D-02	Fondo per le demolizioni e messa in sicurezza degli edifici colpiti dal sisma e dalla frana, per il recupero o lo smaltimento delle relative macerie - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE MANUFATTI GRAVEMENTE DANNEGGIATI ALLA VIA NIZZOLA.	119.693,99 €	- €	100%	100%	100%			100%	100%	100%			
CS-TC-D-03	Fondo per le demolizioni e messa in sicurezza degli edifici colpiti dal sisma e dalla frana, per il recupero o lo smaltimento delle relative macerie - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE MANUFATTI GRAVEMENTE DANNEGGIATI PRESSO VIA SPEZIERIA.	745.782,99 €	- €	100%	100%	100%			100%	100%	100%	20%		
CS-TC-D-04	Fondo per le demolizioni e messa in sicurezza degli edifici colpiti dal sisma e dalla frana, per il recupero o lo smaltimento delle relative macerie - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE MANUFATTI GRAVEMENTE DANNEGGIATI PIAZZA FANGO.	247.699,31 €	- €	100%	100%	100%			100%	100%	100%	15%		
CS-TC-D-05	Fondo per le demolizioni e messa in sicurezza degli edifici colpiti dal sisma e dalla frana, per il recupero o lo smaltimento delle relative macerie - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE MANUFATTI GRAVEMENTE DANNEGGIATI VIA OTTORINGOLO.	1.733.004,16 €	- €	100%	100%	100%			100%	90%				
CS-TC-D-06	Fondo per le demolizioni e messa in sicurezza degli edifici colpiti dal sisma e dalla frana, per il recupero o lo smaltimento delle relative macerie - INTERVENTO DI DEMOLIZIONE MANUFATTI GRAVEMENTE DANNEGGIATI PRESSO VIA SPEZIERIA - LATO NORD.	in corso di definizione	- €	100%	100%	100%			50%					




Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
 Commissario Delegato emergenza Ischia

Ordinanze Speciali n. 1 – 2 – 3 – 5 – 7 – STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

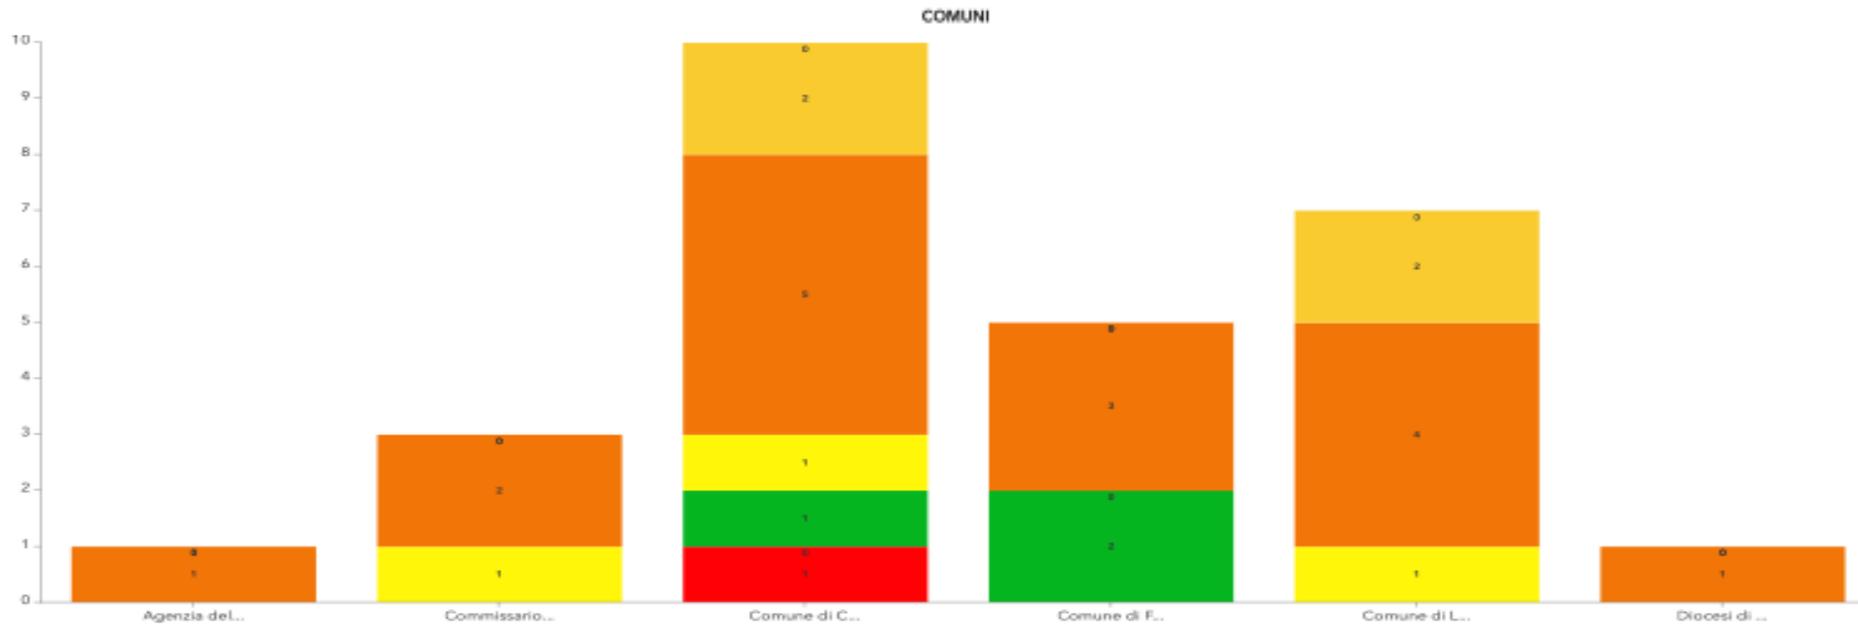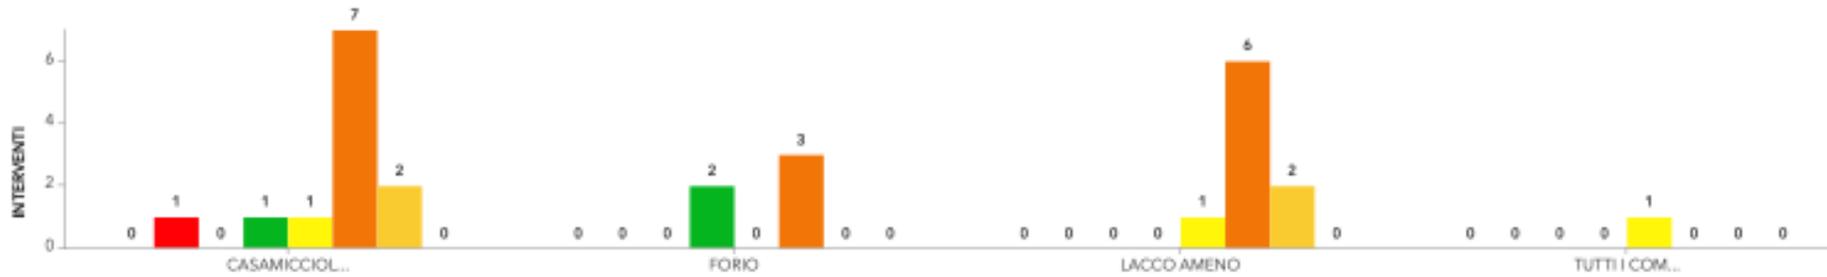

SINTESI ATTUAZIONE INTERVENTI POST FRANA E POST SISMA

Sintesi dello stato di attuazione degli interventi post sisma contenuti nelle Ordinanze Speciali e ripartiti per comune di ubicazione

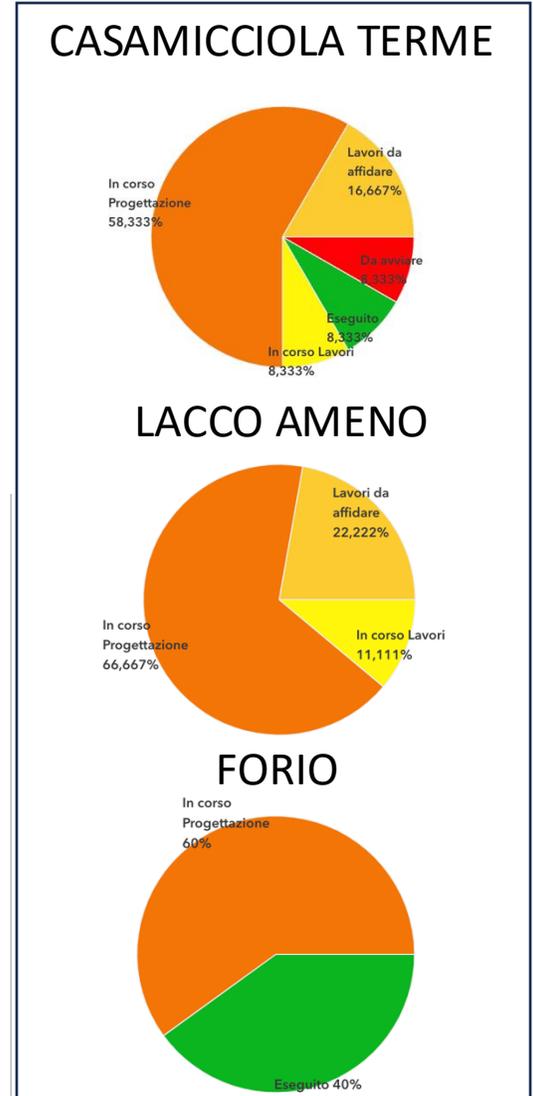

Ischia, agosto 2024



Ordinanze n. 9 – 11 – 14 – STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia

Commissario Delegato emergenza Ischia


LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		


CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	ESEC LAV %
OP-LA-04	Lacco Ameno	Messa in sicurezza del sentiero naturalistico della collina di Monteveico	Comune di Lacco Ameno	In corso Progettazione	535.218,00 €	0
PS-LA-03 *	Lacco Ameno	Istituto comprensivo Mennella (Scuola elementare + scuola materna) di via Pannella		Da avviare	1.978.755,00 €	0
OP-CM-01-1	Casamicciola Terme	Lavori di ricostruzione del muro di contenimento posto a confine con la ex S.S. 270 (Isola Verde) KM 25 + 700	Città Metropolitana	In corso Progettazione	3.520.000,00 €	0
OP-CM-01-2	Casamicciola Terme	Camera di Manovra adiacente il Serbatoio idrico di Casamicciola scheda Aedes Esito EF	Comune di Casamicciola Terme	Eseguito	362.690,00 €	100
OP-RC-01	Casamicciola Terme	Rimozione macerie edificio crollato Via Serrato (completamento intervento urgente 01/U/01-)	Comune di Casamicciola Terme	Eseguito	506.181,14 €	100
OP-CT-03	Casamicciola Terme	Ripristino e messa in sicurezza di via Gran Sentinella e via lasolino	Comune di Casamicciola Terme	In corso lavori	72.000,00 €	50
PS-CAS-04	Casamicciola Terme	Scuola elementare De Gasperi	Comune di Casamicciola Terme	Eseguito	309.356,73 €	100
PS-CAS-07	Casamicciola Terme	Edificio ex sede Centro per l'impiego	Comune di Casamicciola Terme	Da avviare	737.328,00 €	0
PS-CAS-02	Casamicciola Terme	Istituto superiore Mattei	Città Metropolitana	In corso Progettazione	6.120.000,00 €	0
PS-FOR-01	Forio	Istituto comprensivo Forio 2 - D'Abundo	Comune di Forio	In corso lavori	1.997.456,48 €	40
PS-FOR-02	Forio	Istituto comprensivo Forio 1 - Luca Bassofiore	Comune di Forio	In corso lavori	4.120.794,84 €	10

Sintesi dello stato di attuazione degli interventi post sisma contenuti nelle Ordinanze n. 9 – 11 e 14 e ripartiti per comune di ubicazione


CASAMICCIOLA TERME



FORIO



LACCO AMENO



* Per l'intervento PS-LA-03 si valuta la revoca del finanziamento



Ordinanza Speciale n.6 – STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI EDIFICI DI CULTO

Commissario Straordinario ricostruzione post-sisma Ischia
Commissario Delegato emergenza Ischia

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	Note	ESEC LAV %
BC-CA-05	Casamicciola Terme	Chiesa Sant'Antonio da Padova		Lavori da affidare entro i prossimi 90gg	703.984,56 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	0
BC-CA-03	Casamicciola Terme	Chiesa San Pasquale Baylon		Lavori da affidare entro i prossimi 90gg	1.003.422,96 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	0
BC-FO-01	Forio	Chiesa Santa Lucia		Lavori da affidare entro i prossimi 90gg	440.000,00 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	0
BC-FO-05	Forio	Chiesa San Domenico		Lavori da affidare entro i prossimi 90gg	300.000,00 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	0
BC-LA-02	Lacco Ameno	Chiesa San Giuseppe al Fango		Lavori da affidare entro i prossimi 90gg	2.594.297,79 €	Stazione appaltante: Comune di Lacco Ameno poi Diocesi di Ischia	0
BC-CA-01	Casamicciola Terme	Chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio		In corso Progettazione	890.646,32 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	0
BC-CA-02	Casamicciola Terme	Chiesa di Santa Maria della Pietà		In corso Progettazione	1.332.522,12 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	0
BC-CA-07	Casamicciola Terme	Chiesa Santa Maria del Suffragio detta del Purgatorio		Da avviare	514.938,00 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	0
BC-FO-03	Forio	Chiesa parrocchiale di San Sebastiano		In corso Progettazione	714.721,65 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	0
BC-FO-04	Forio	Chiesa di San Michele Arcangelo detta del Purgatorio		In corso Progettazione	1.527.487,58 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	0
BC-LA-01	Lacco Ameno	Chiesa della SS. Annunziata		In corso Progettazione	825.646,01 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	0
BC-CA-05	Casamicciola Terme	Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maddalena		Da avviare	5.550.361,00 €	Stazione appaltante: Comune C.T.	0
BC-CA-06	Casamicciola Terme	Chiesa dell'Immacolata		In corso Progettazione	1.450.000,00 €	Stazione appaltante: Segretariato regionale del MIC	0
BC-FO-02	Forio	Chiesa di Santa Maria di Loreto		In corso Progettazione	1.900.000,00 €	Stazione appaltante: Segretariato regionale del MIC	0
BC-CA-000	Casamicciola Terme	Chiesa di San Giuseppe - Don Orione		Da avviare	1.303.549,87 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	0
BC-LA-000	Lacco Ameno	Chiesa Maria Assunta in cielo		Da avviare	820.579,11 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	0
BC-FO-000	Forio	Chiesa di San Francesco d'Assisi		Da avviare	603.433,05 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	0
