

Stato attuazione interventi post frana e post sisma



Aggiornamento: AGOSTO 2025



TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI FINANZIATI

A seguito della frana del 26 novembre 2022:

- Con OCDPC n. 948/2022 il Commissario straordinario veniva nominato **Commissario delegato** per l'emergenza, al quale è stata affidata la ricognizione degli interventi urgenti, la predisposizione e l'attuazione del piano degli interventi di somma e di estrema urgenza,
- Con il Decreto legge n. 186/2022, convertito con la legge n. 9 del 27 gennaio 2023, sono state attribuite al Commissario straordinario specifiche funzioni relative agli interventi sul dissesto post-frana ed in particolare la definizione del Piano degli interventi urgenti di cui all'articolo 5-ter del decreto, riguardante le aree e gli edifici colpiti dall'evento franoso nel comune di Casamicciola Terme nonché la ricognizione degli interventi e delle risorse impiegate e disponibili per il contrasto al dissesto idrogeologico relativo agli altri comuni dell'Isola di Ischia.
- Con la Legge di Bilancio per il 2025 (legge n. 207 del 30 /12/2024), art. 1 comma 685, è stato disposto che il Commissario Straordinario provvede all'attuazione degli interventi di cui all'art. 5-ter del d.l. 186/2022 per tutti i comuni dell'isola di Ischia.



COMPETENZE ATTRIBUITE AL COMMISSARIO DELEGATO E AL COMMISSARIO STRAORDINARIO

COMPETENZE COMMISSARIO DELEGATO

L'**Ordinanza OCDPC n. 948/2022** ha previsto all'art. 1, comma 3, che il **Commissario Delegato**, deve predisporre un primo piano degli interventi urgenti da sottoporre al DPC.

a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi compresi i contributi di autonoma sistemazione, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

COMPETENZE COMMISSARIO STRAORDINARIO

L'**art. 5-ter del d.l. 186/2022**, ha stabilito «*che al fine di garantire nell'isola di Ischia il necessario coordinamento tra gli interventi urgenti di messa in sicurezza idrogeologica del territorio e di ripristino delle infrastrutture e degli edifici pubblici, con particolare riferimento agli istituti scolastici, e degli immobili privati, a seguito degli eventi calamitosi verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, e quelli di ricostruzione degli edifici colpiti dall'evento sismico del 21 agosto 2017, il Commissario Straordinario agisce anche con riferimento agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022, limitatamente ai compiti regolati dallo stesso articolo. Conseguentemente, gli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere d), e) e f), del codice della protezione civile, sono esclusi dall'ambito di operatività del Commissario delegato.*»



PREMESSA: STRUTTURE COMMISSARIALI E COMPETENZE

Settembre 2018- Dicembre 2024


COMMISSARIO STRAORDINARIO

per la Ricostruzione dei Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio a seguito degli eventi sismici di Agosto 2017

Novembre 2022 - Dicembre 2024

COMMISSARIO DELEGATO

a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 26 novembre 2022



Gennaio 2025

COMMISSARIO STRAORDINARIO

(articolo 1, comma 685 della legge 30 dicembre 2024, n. 207)

per gli interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del giorno 21 agosto

+

Organo competente alla prosecuzione, in via ordinaria, delle funzioni del Commissario delegato - con l'OCDPC n. 1130 del 21 febbraio 2025, è stata disposta la possibilità di estendere il regime derogatorio per ulteriori sei mesi regolando le modalità di svolgimento di tale nuova funzione



SINTESI DEGLI INTERVENTI POST - FRANA

INTERVENTI DI SOMMA ED ESGTREMA URGENZA

Gli interventi programmati ed avviati a seguito dell'evento franoso del 26 novembre 2022 sono suddivisi sulla base delle fonti di finanziamento, come di seguito indicato:

- A) 185 Interventi del Piano del Dipartimento di Protezione Civile **OCDPC 948/22** (stesura iniziale, 1° rimodulazione ottobre 2023, 2° rimodulazione dicembre 2023, 3° rimodulazione marzo 2024, 4° rimodulazione giugno 2024, 5° rimodulazione novembre 2024, 6° rimodulazione dicembre 2024): **€ 78.191.174,95**;
- B) 5 interventi finanziati con fondi Regione Campania (Deliberazione n. 624 del 29/11/2022) + economie dall'appalto di progettazione del ripascimento spiagge isola d'Ischia : **€ 6.676.881,00**;
- C) 16 interventi finanziati con i fondi di cui all'art. 5-sexies, c. 1, del D.L. 186/2022 (Ordinanza Speciale n.5/23 – allegato 1, confluiti in Ordinanza Speciale n.7): **€ 19.805.451,33**;

IL TOTALE DEGLI INTERVENTI DI SOMMA ED ESTREMA URGENZA FINORA AVVIATI (A+ B + C) E' PARI A € 104.673.507,00




INTERVENTI URGENTI (strutturali)

- D) 60 interventi piano art. 5 ter D.L. 186/2022 nel comune di Casamicciola Terme, il cui importo complessivo ammonta ad € **178.000.000,00**, così ripartiti:
 - 17 definiti «prioritari per la messa in sicurezza strutturale» e finanziati per **€ 43.913.090,45**. Sono inoltre finanziate per **€ 6.225.617,71** le progettazioni e le indagini relative agli interventi ricompresi nella programmazione quinquennale Art.5-ter, per un finanziamento complessivo di **€ 50.138.708,16**;
 - 43 Interventi ricompresi nella programmazione quinquennale Art.5-ter, per importi complessivi pari ad € 127.374.382,29, non ancora finanziati;
- E) Ricognizione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per gli altri comuni dell'isola di Ischia, per un importo complessivo di **€ 209.000.000,00**



SINTESI STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI POST-FRANA EX COMMISSARIO DELEGATO

	Interventi Piano OCDPC 948/22						Interventi di competenza del Commissario Delegato e finanziati con fondi Regione Campania						Piano fanghi – Ordinanza Speciale Commissario Straordinario n.5 e 7						TOTALE COMPLESSIVO	
	Eseguiti	Con lavori in corso	Lavori da affidare	In fase progettuale	Da avviare	Totale	Eseguiti	Con lavori in corso	Lavori da affidare	In fase progettuale	Da avviare	Totale	Eseguiti	Con lavori in corso	Lavori da affidare	In fase progettuale	Da avviare	Totale		
Casamicciola Terme	26	14	9	5		54	1	3		1		5	9	1	1				11	70
Lacco Ameno	12	5	2	1		20							4						4	24
Forio	19	4	2	3		28								1					1	29
Serrara Fontana	11	1	4	8		24														24
Ischia	17	2	1	8		28														28
Barano d'Ischia	8	2	6	14		30														30
Tutti i comuni dell'isola	1					1														1
TOTALE	94	28	24	39	0	185	1	3	0	1	0	5	13	2	1	0	0	16	206	

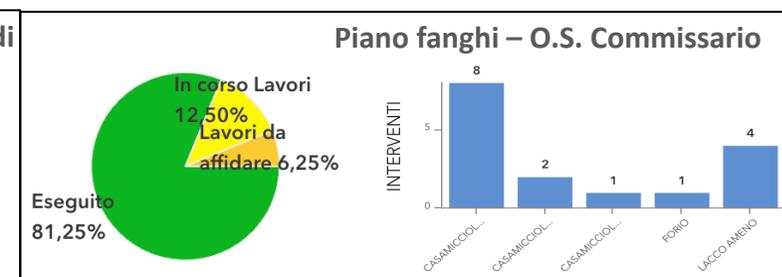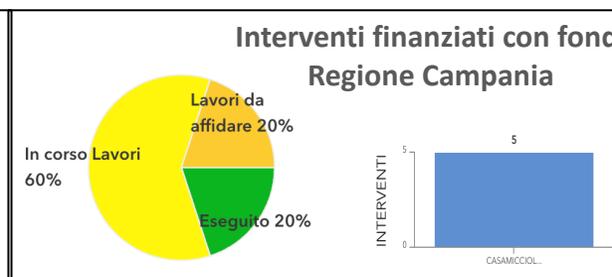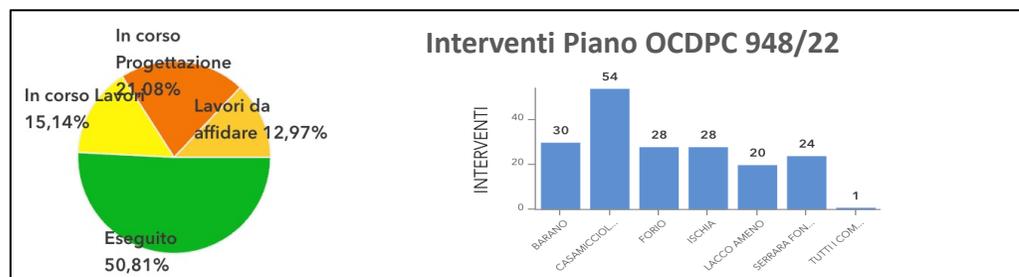


Sintesi stato di attuazione degli interventi post-frana

ESEGUITI		Con lavori in corso	Lavori da affidare	In fase progettuale	Da avviare	Totale
Eseguiti	di cui rendicontati					
108	57	33	25	40	0	206







SINTESI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMMISSARIO DELEGATO IN RELAZIONE AGLI IMPORTI FINANZIATI




Ripartizione risorse per stato di avanzamento



SINTESI STATO DI ATTUAZIONE EX PIANO OCDPC 948/2022

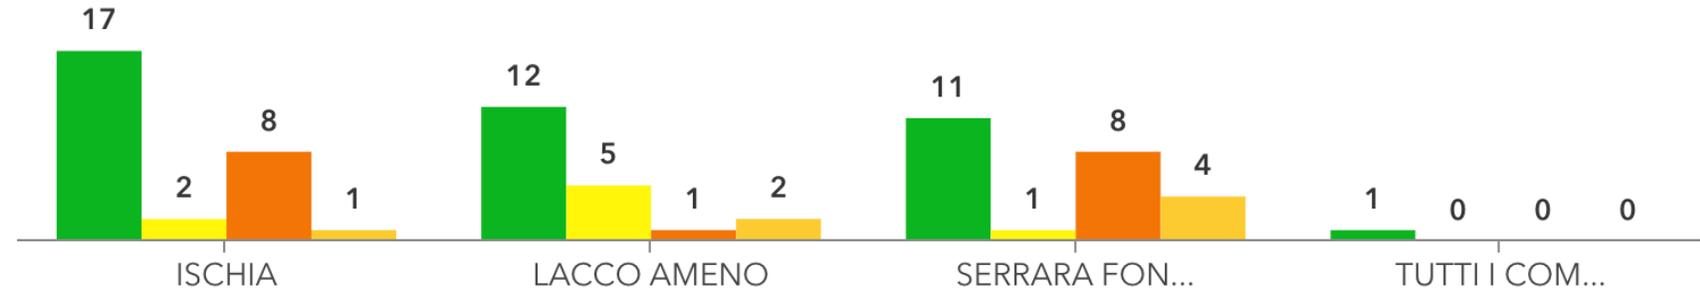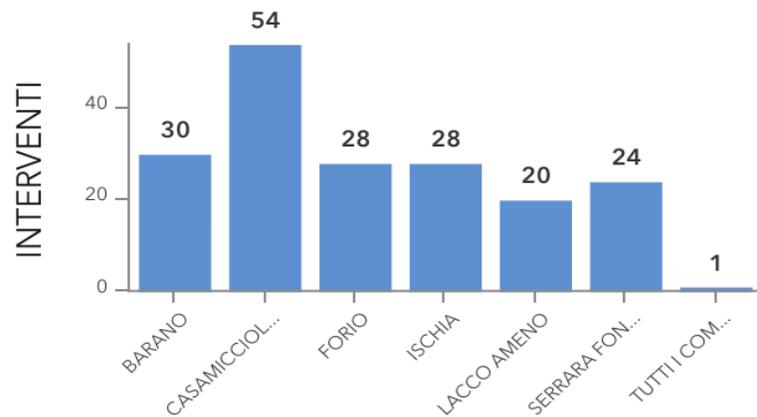
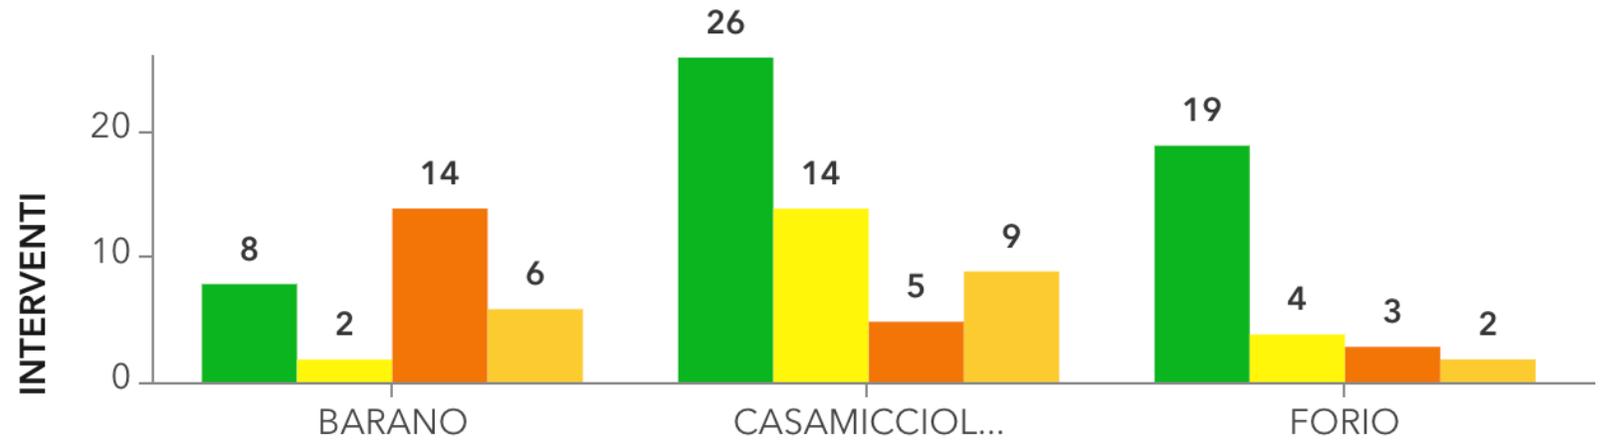
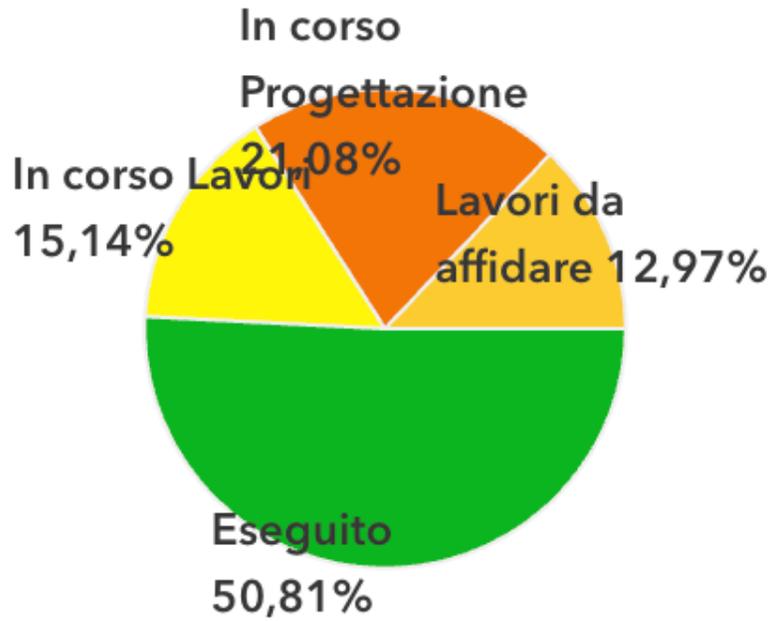


SINTESI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO OCDPC 948/2022 RIPARTITI PER COMUNE DI UBICAZIONE

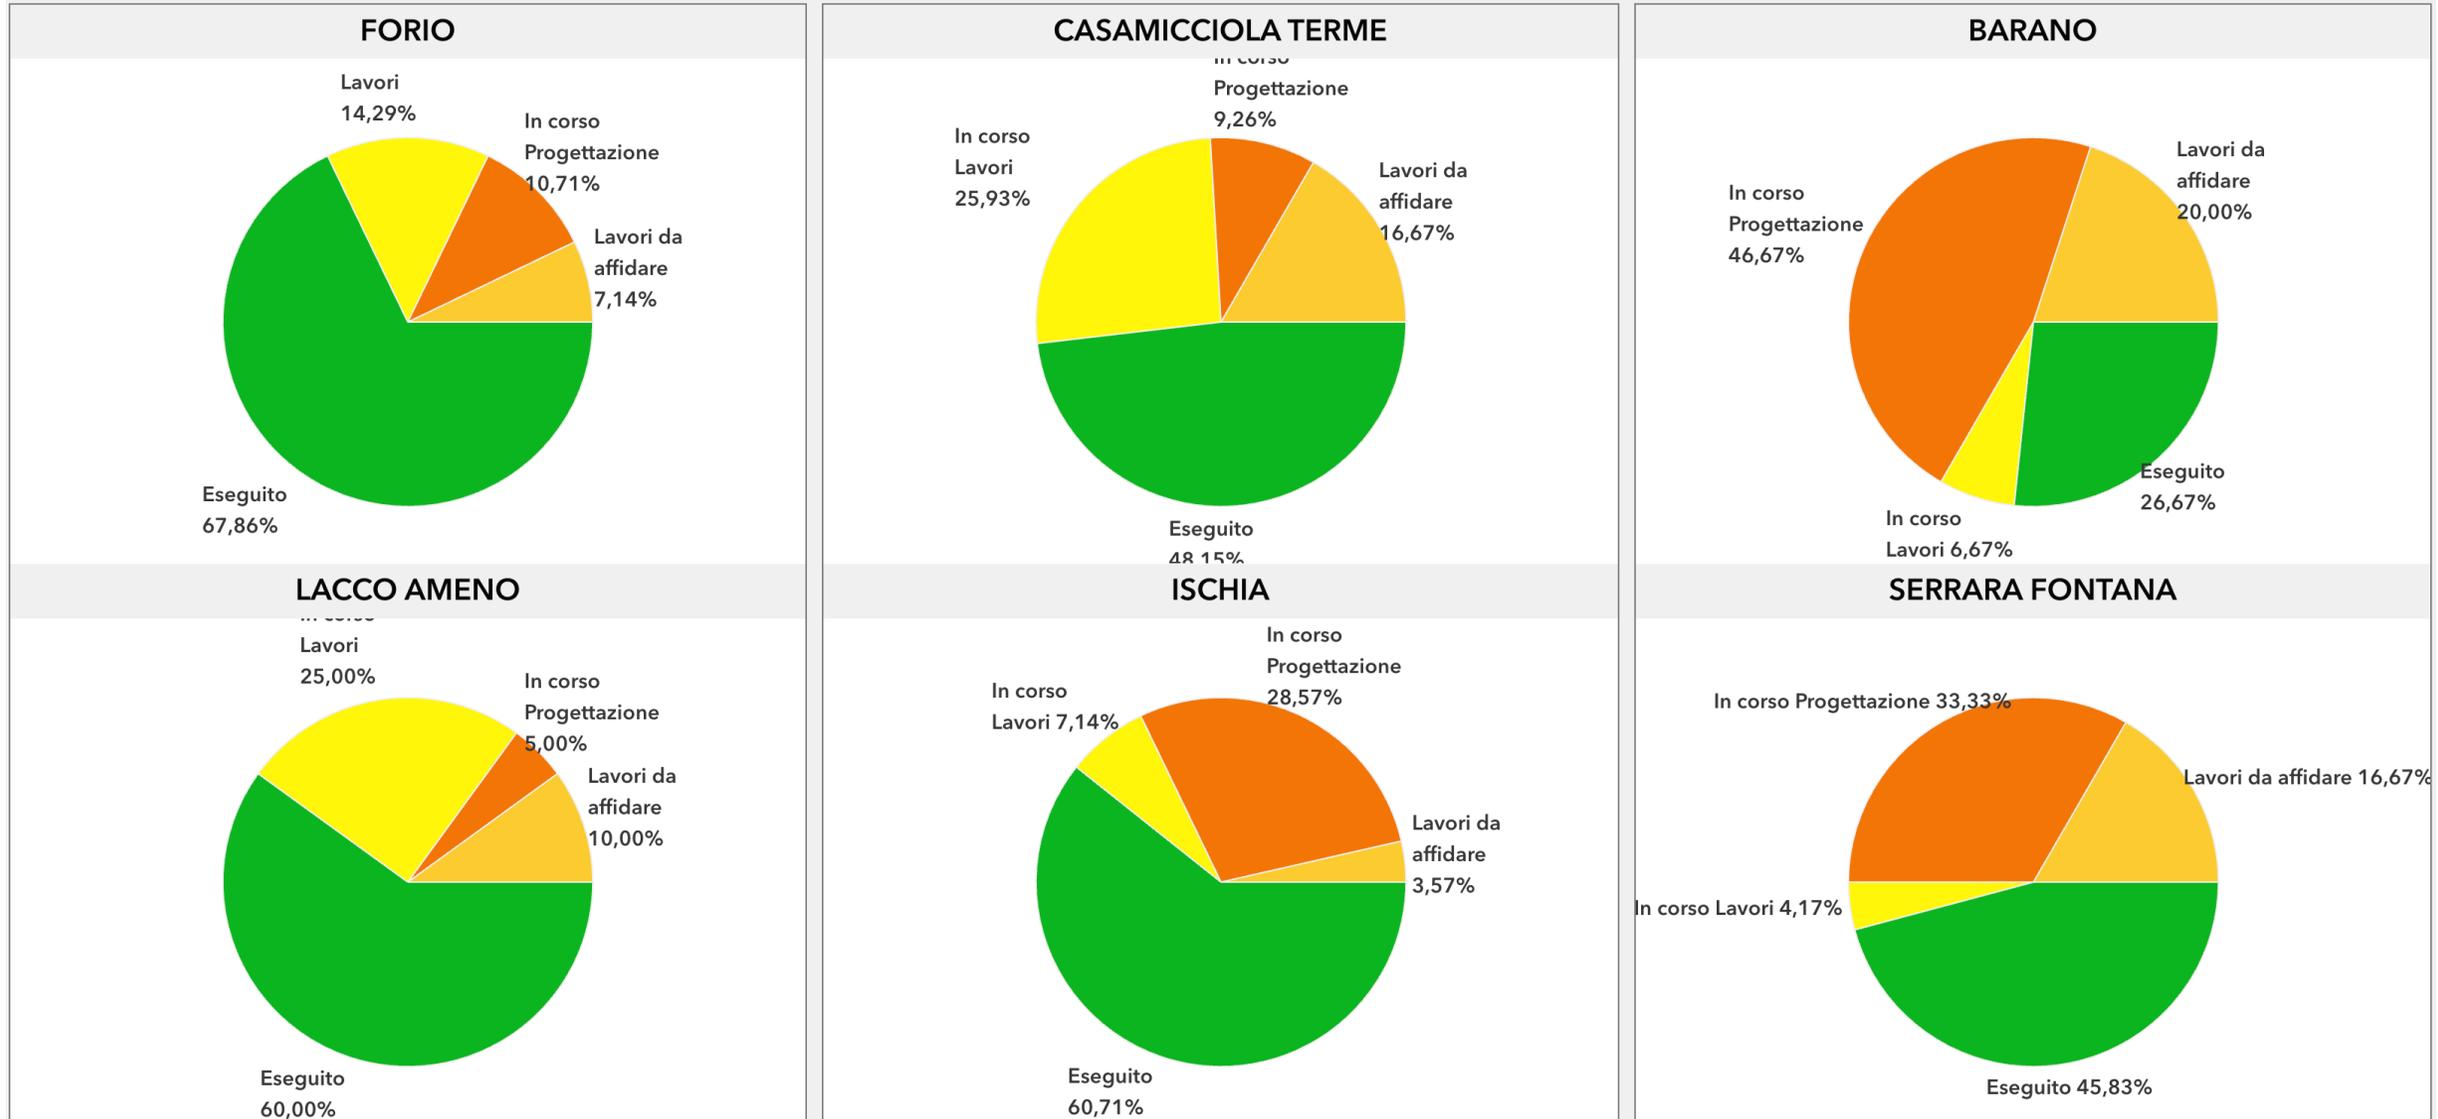

SINTESI DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO OCDPC 948/2022

COLLOCAZIONE SUL TERRITORIO

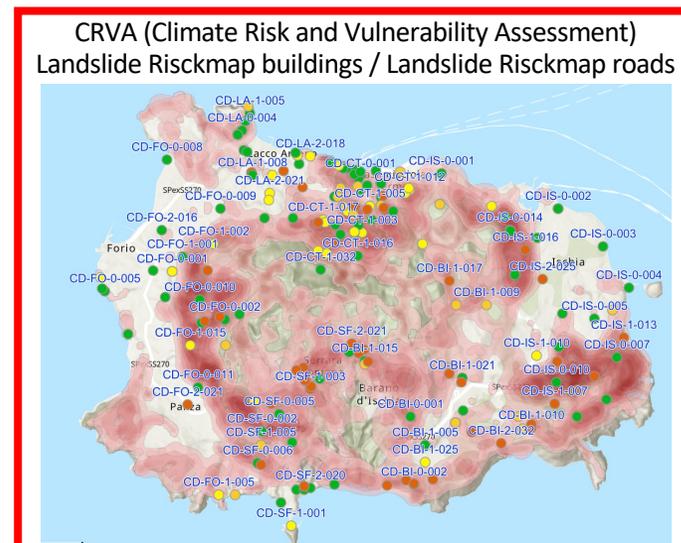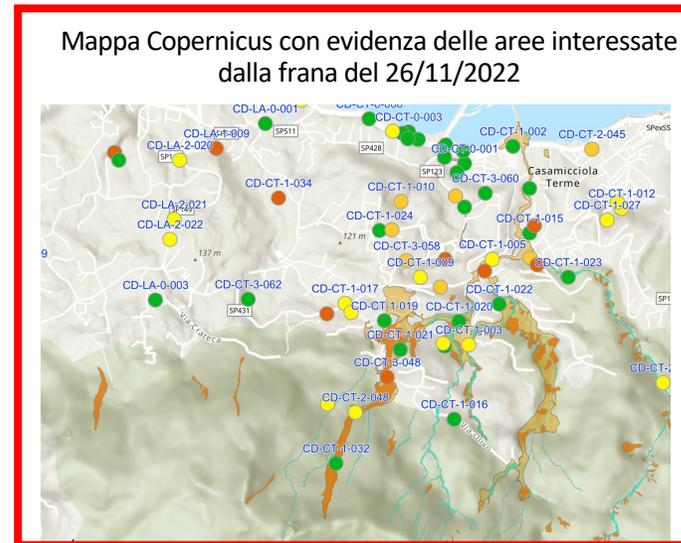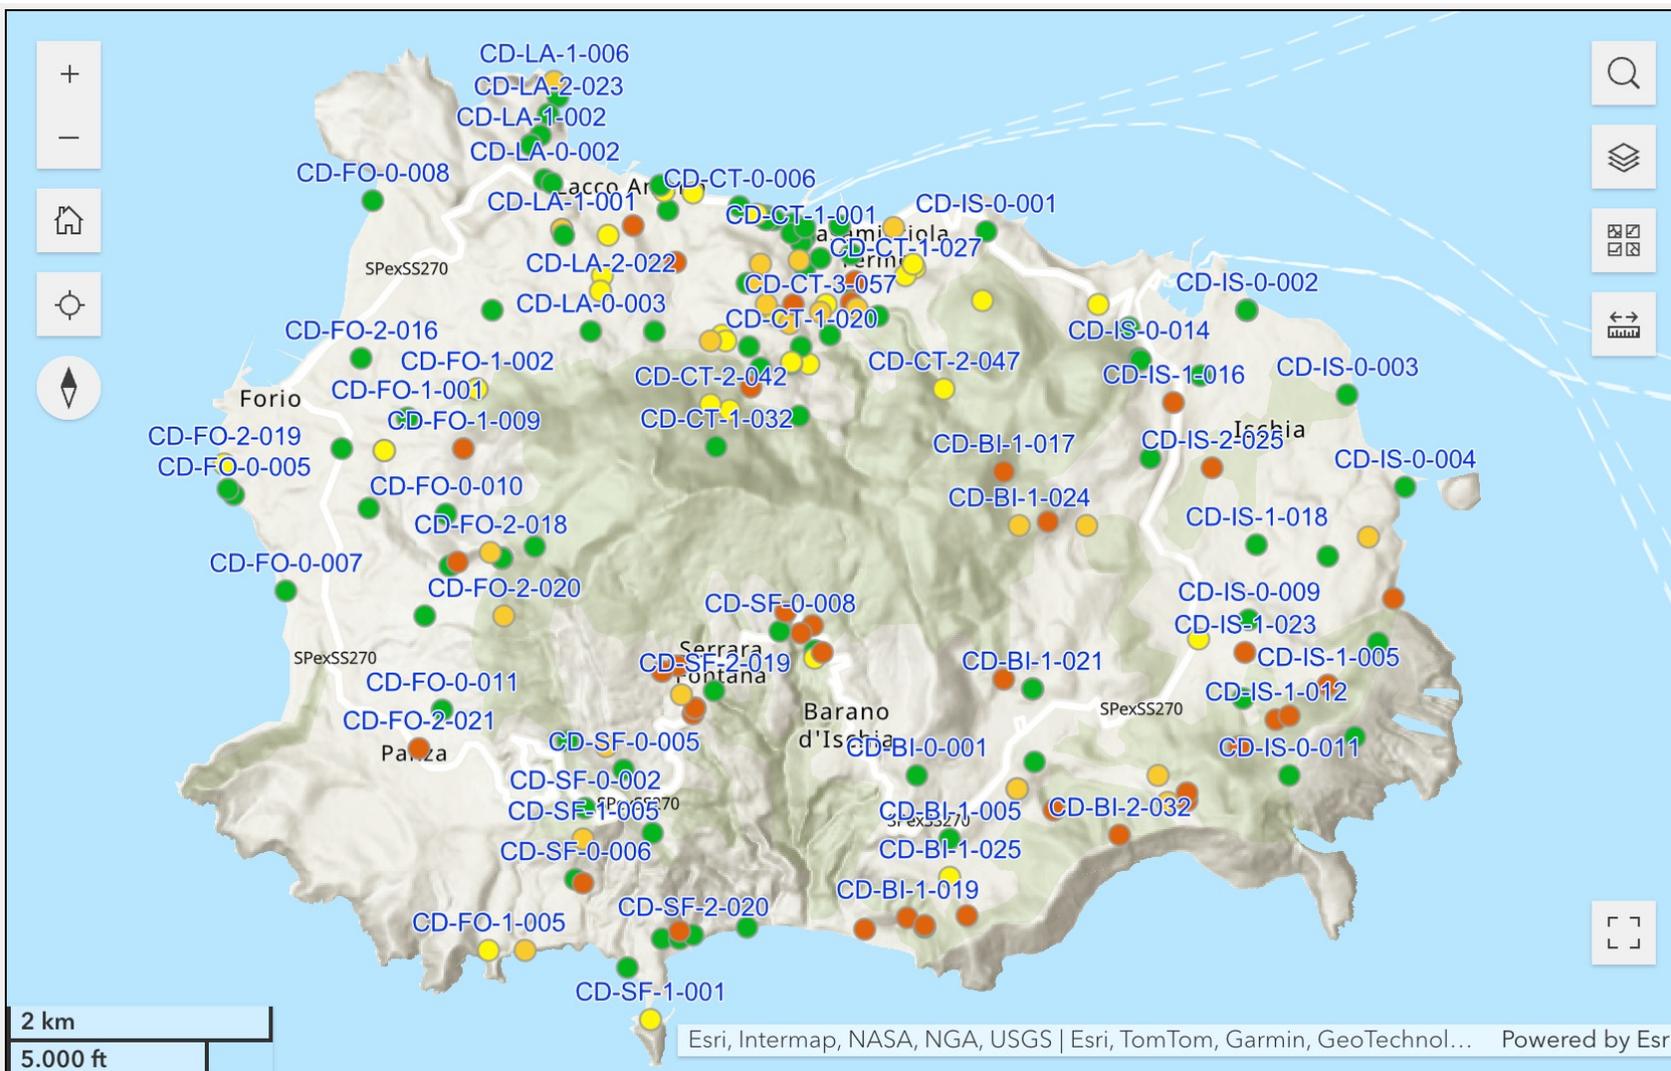

Piano interventi OCDPC 948/22 – STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

Comune di Casamicciola Terme

LEGENDA STATO DI AVANZAMENTO

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO E RENDICONTATO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		ESEGUITO

CODICE IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO %	NOTE/CRITICITA'
CD-CT-0-001	Assistenza operatori	Comune di Casamicciola Terme	Eseguito	59.665,41 €	100	
CD-CT-0-003	Delimitazione della sede viaria, 1° disaggio della scarpata al km 26+000 relativa alla frana in direz Lacco	Citta Metropolitana di Napoli	Concluso e rendicontato	245.664,14 €	100	
CD-CT-0-005	Ex SS 270 Isola Verde altezza km 28+800, rimozione rete, taglio arbusti, disaggio parti di costone, rimozione materiale accumulato/detriti nel tempo e in occasione degli ultimi eventi, oltre pulizia di una parte della scarpata.	Citta Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Concluso e rendicontato	15.459,59 €	100	
CD-CT-0-006	Sp 123 Circumv.ne in Casamicciola	Citta Metropolitana di Napoli	Concluso e rendicontato	5.614,05 €	100	
CD-CT-1-001	Ulteriori interventi, espletati e in corso, di rimozione e trasporto ai siti di stoccaggio provvisorio delle strade e spazi pubblici e privati dal fango e dai detriti a seguito della frana del ed interventi provvisionali di messa in sicurezza 26/11/22	Comune di Casamicciola Terme	Eseguito	2.073.547,27 €	100	
CD-CT-1-002	Intervento da attuare nell'immediatezza per il rifacimento impianto di pubblica illuminazione con sostituzione delle linee di alimentazione invase dai fanghi, dai pali danneggiati, dei corpi illuminanti, dei quadri elettrici in via SS270, piazzale Ancora	Comune di Casamicciola Terme	Eseguito	318.143,11 €	100	
CD-CT-1-003	Ripristino condizioni ante eventi alluvionali tratto viario Piazza Bagni- Via Monte della Misericordia- Piazzale Anna de Felice (Piazzale Ancora) Piazza e via Marina - C.so L. Manzi - agg. Rione in località Perrone, Via Oneso, Via Pendio Lacco, Via casa Mennella, Via lasolino, Rione Regina Margherita in località Sentinella, Rione in località Marina (Via Cagliari, Via Palermo, Via Elena, ecc. Ripristino fontana decorativa, rifacimento aiuole, marciapiedi, muri di cinta, parapetti, ringhiere ed arredi urbani divelti	SMA Campania Spa	In corso Lavori	955.795,73 €	70	In corso redazione PE della terza fase (Appalto integrato)
CD-CT-1-004	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento versante a monte ed a valle Il traversa Santa Barbara, per un fronte di circa mt 300 ed un'altezza di mt 30,00, I fase	SMA Campania Spa	Eseguito	695.103,58 €	100	
CD-CT-1-005	Ripristino condizioni ante eventi alluvionali tratto viario Piazza Bagni, Via Monte della Misericordia, Piazzale Anna de Felice (Piazzale Ancora), Ripristino fontana decorativa, rifacimento aiuole, marciapiedi, muri di cinta, parapetti, ringhiere ed arredo urbano.	Comune di Casamicciola Terme	In corso Lavori	1.515.024,04 €	60	
CD-CT-1-009	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone località Valle del Cotto per una lunghezza di circa mt 50,00 ed un'altezza di circa mt 20,00. Primi interventi di messa in sicurezza	Comune di Casamicciola Terme	In corso Lavori	87.206,98 €	95	IN CORSO DI REVOCA E RIASSEGNAZIONE CON RIMODULAZIONE
CD-CT-1-010	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento via Vicinale Castanito località Piccola Sentinella	SMA Campania Spa	Lavori da affidare	116.267,77 €	10	In fase di verifica e validazione
CD-CT-1-011	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone sovrastante via Monte della Misericordia per una lunghezza di circa mt 30,00 ed un'altezza media di circa mt. 10,00. Primi interventi di messa in sicurezza	SMA Campania Spa	Eseguito	669.560,32 €	100	
CD-CT-1-012	Intervento da attuare nell'immediatezza già previsto un primo intervento dal Genio Civile di Napoli, vedi nota prot. 14384 del 21/12/2022, che prevede la realizzazione una barriera paramassi per un importo complessivo stimato di € 105.850,00	Comune di Casamicciola Terme	In corso Lavori	1.420.000,00 €	90	



Piano interventi OCDPC 948/22 – STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

Comune di Casamicciola Terme

LEGENDA STATO DI AVANZAMENTO

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO E RENDICONTATO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		ESEGUITO

CODICE IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO %	NOTE/CRITICITA'
CD-CT-1-015	Intervento di ricostruzione muro di contenimento sovrastante Corso Vittorio Emanuele tra il civico 68 e 74 per una lunghezza di circa m. 15,00 ed un'altezza di circa m. 3,00 , Primi interventi di messa in sicurezza	SMA Campania Spa	Eseguito	10.506,64 €	100	
CD-CT-1-016	Intervento di ricostruzione muro di contenimento alla strada via Celario (oltre frana)	Comune di Casamicciola Terme/ Commissario Delegato	Eseguito	350.000,00 €	100	
CD-CT-1-017	Intervento di ricostruzione muro di contenimento con sovrastante parapetto alla strada via Epomeo nel tratto in prossimità dell'Alveo Torrente Cuccufriddo, per una lunghezza di circa mt 40,00 ed un'altezza media di circa mt 3,00	Comune di Casamicciola Terme/ Commissario Delegato	In corso Lavori	850.000,00 €	70	In corso di approvazione perizia suppletiva e di variante
CD-CT-1-019	Intervento da attuare nell'immediatezza di risistemazione marciapiedi e parapetti via Santa Barbara e parcheggio Celario e risistemazione canale di captazione delle acque meteoriche , Incluso gli oneri per la progettazione finalizzata al completamento	Citta Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Concluso e rendicontato	115.728,46 €	100	
CD-CT-1-020	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell'alveo Senigallia - Primi interventi di messa in sicurezza	Comune di Casamicciola Terme	Eseguito	122.488,46 €	100	
CD-CT-1-021	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell'alveo Cava Fontana - Vallone Selva , Primi interventi di messa in sicurezza	SMA Campania Spa	Eseguito	926.390,39 €	100	
CD-CT-1-022	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica degli alvei Negroponte (foce), Fasaniello o Ervaniello , Primi interventi di messa in sicurezza	SMA Campania Spa	Eseguito	611.178,67 €	100	
CD-CT-1-023	Intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell'Alveo Pozzillo o Cava Baino	SMA Campania Spa	Eseguito	40.519,94 €	100	
CD-CT-1-024	Intervento da attuare nell'immediatezza ripristino ed implementazione impianto fognario per regimentazione acque meteoriche Via Roma, Piazza dott. Verde, Via Sassolo, Via Castanito, via dott. Morgera, Via De Rivaz	EVI	Eseguito	200.000,00 €	100	
CD-CT-1-025	Implementazione impianto fognario per regimentazione acque a monte della scarpata di via Eddomade. Intervento in via vicinale castanito, via Eddomade via principessa margherita piazza marina	EVI	Eseguito	40.639,82 €	100	
CD-CT-1-026	Implementazione impianto fognario per regimentazione acque ss270 e piazza marina , Primi interventi di messa in sicurezza	EVI	Eseguito	228.000,00 €	100	
CD-CT-1-027	Adeguamento impianto fognario per regimentazione acque di via Mortito , captazione acque da Monte Tabor	EVI	In corso Lavori	200.000,00 €	60	
CD-CT-1-028	Bonifica Pineta del Bosco della Maddalena da piante pericolanti	Comune di Casamicciola Terme	In corso Lavori	80.000,00 €	10	
CD-CT-1-029	Intervento da attuare nell'immediatezza: consolidamento delle scarpate laterali del torrente Cuccufriddo incrocio con via Arenale e via Montecito, nonché messa in sicurezza delle strade coinvolte - Primi interventi di messa in sicurezza	SMA Campania Spa	In corso Lavori	264.118,27 €	40	



Piano interventi OCDPC 948/22 – STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

Comune di Casamicciola Terme

LEGENDA STATO DI AVANZAMENTO

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO E RENDICONTATO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		ESEGUITO

CODICE IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO %	NOTE/CRITICITA'
CD-CT-1-030	Interventi di ricostruzione muri e sistemazione scarpate lungo via Nizzola ed implementazione impianto di smaltimento delle acque	Commissario Delegato – Comune di Casamicciola Terme	Lavori da affidare	1.750.000,00 €	10	Sarà affidato nel mese di agosto
CD-CT-1-032	Disgaggio massi pericolanti e relativa messa in sicurezza dei costoni con tecniche di rimozione del materiale superficiale instabile - categoria SOA OS12	SMA Campania Spa	Eseguito	3.856.917,14 €	100	
CD-CT-1-034	Interventi vari di messa in sicurezza Plessi Scolastici La Rita e De Gasperi (rifacimento impermeabilizzazione manto di copertura, pulizia ecc)	Comune di Casamicciola Terme	In corso Progettazione	15.000,00 €	10	IN CORSO DI REVOCA E RIASSEGNAZIONE CON RIMODULAZIONE
CD-CT-1-035	Rifacimento segnaletica stradale orizzontale e verticale	Comune di Casamicciola Terme	Eseguito	67.811,87 €	100	
CD-CT-1-036	Realizzazione opere provvisionali connesse alla zonizzazione di Protezione Civile	Comune di Casamicciola Terme	Eseguito	50.000,00 €	100	
CD-CT-1-037	Intervento di messa in sicurezza ex SS270,C.so Luigi Manzi con rifacimento dei sottoservizi danneggiati	Citta Metropolitana di Napoli – Direz. Tecnica Strade	Concluso e rendicontato	67.438,54 €	100	
CD-CT-1-038	Intervento di messa in sicurezza del costone sulla ex SS270 (tratto Casa Cantoniera , Eliporto)	Comune di Casamicciola Terme	Eseguito	1.890.000,00 €	100	
CD-CT-1-039	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone sovrastante via Mortito Primi interventi di messa in sicurezza	Comune di Casamicciola Terme	In corso Lavori	40.478,51 €	10	IN CORSO DI REVOCA E RIASSEGNAZIONE CON RIMODULAZIONE
CD-CT-1-041	Rimozioni materiali detritico, rifacimento marciapiedi, parapetti, sistemazione opere di contenimento, ecc, ecc. (via Vittorio Emanuele)	Comune di Casamicciola Terme	In corso progettazione	750.000,00 €	10	IN CORSO DI REVOCA E RIASSEGNAZIONE CON RIMODULAZIONE
CD-CT-2-004	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento versante a monte ed a valle II traversa Santa Barbara, per un fronte di circa mt 300 ed un'altezza di mt 30,00 ,II fase	Comune di Casamicciola Terme	In corso Lavori	1.550.000,00 €	30	
CD-CT-2-045	Interventi vari di messa in sicurezza Sede Comunale Provvisoria Via Girardi", in quanto la sede provvisoria di Piazza Marina divenuta inagibile ed stato preso in locazione l'ex Convento in via S. Gilardi, Piazza Marina	Comune di Casamicciola Terme	Lavori da affidare	20.000,00 €	10	i lavori saranno affidati entro agosto
CD-CT-2-047	Rimozione rifiuti Cava Pozzillo	Commissario Delegato	In corso Lavori	990.092,98 €	20	



Piano interventi OCDPC 948/22 – STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

Comune di Casamicciola Terme

LEGENDA STATO DI AVANZAMENTO

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO E RENDICONTATO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		ESEGUITO

CODICE IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO %	NOTE/CRITICITA'
CD-CT-2-048	Ripristino dell'Alveo Celario da quota sul liv m circa 300 m fino alla sezione di imbocco di Cava Fontana e altri interventi di completamento	Commissario Delegato	In corso Lavori	3.466.234,89 €	20	
CD-CT-2-049	Sistemazione / realizzazione opere di contenimento	Comune di Casamicciola Terme	In corso Lavori	1.400.000,00 €	20	
CD-CT-3-048	Interventi di ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo Celario consequenziali alle operazioni di pulizia in corso (da quota s.l.m. circa 300m fino alla sezione di imbocco cava Fontana) II fase	Commissario Delegato	In corso Progettazione	600.000,00 €	5	
CD-CT-3-054	Ripristino e rifunionalizzazione idraulica della rete fognaria Via Castanito	Comune di Casamicciola Terme	Lavori da affidare	603.720,17 €	10	PE CONCLUSO e approvato Determina a contrarre
CD-CT-3-055	Ripristino e rifunionalizzazione idraulica della rete fognaria Via Principessa Margherita con ripristino della sede viaria	Comune di Casamicciola Terme	Lavori da affidare	937.409,67 €	10	PE concluso, sarà trasmesso al tavolo tecnico
CD-CT-3-056	Ripristino funzionalità delle strade e messa in sicurezza dei muri incombenti via Principessa Margherita , corso Garibaldi e Via Vittorio Emanuele	Comune di Casamicciola Terme	In corso Progettazione	350.000,00 €	5	La progettazione sarà affidata entro settembre
CD-CT-3-057	Interventi sulle strade e rifacimento muro c.so V. Emanuele e ripristino sottoservizi II trav Ombrasco	Comune di Casamicciola Terme	Lavori da affidare	518.090,00 €	10	PROGETTO ESECUTIVO CONCLUSO e APPROVATO
CD-CT-3-058	Ripristino e rifunionalizzazione idraulica della rete fognaria Via Sassolo interdotta	Comune di Casamicciola Terme	Lavori da affidare	145.676,40 €	10	PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO. In corso affidamento dei lavori



Piano interventi OCDPC 948/22 – STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI Comune di Casamicciola Terme

LEGENDA STATO DI AVANZAMENTO

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO E RENDICONTATO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		ESEGUITO

CODICE IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO %	NOTE/CRITICITA'
CD-CT-3-059	Sistemazione muro Via Montecito	Comune di Casamicciola Terme	In corso Progettazione	331.266,88 €	5	PE in fase di ultimazione
CD-CT-3-060	Primi interventi di messa in sicurezza scalinata rampe Paradisiello di collegamento area scolastica e area residenziale	Comune di Casamicciola Terme	Eseguito	250.000,00 €	100	
CD-CT-3-026	Rifunzionalizzazione del tratto fognario esistente in Piazza Marina e aree attigue	EVI	Eseguito	168.000,00 €	100	
CD-CT-2-042	Ripristino della funzionalità idraulica degli alvei Cuccufriddu, Negroponte, Fasaniello, Fontana e Via Ombrasco	Comune di Casamicciola Terme	In corso Lavori	10.000.000,00 €	30	
CD-CT-3-062	Intervento reti paramassi Cava il Monaco	Commissario Delegato	Eseguito	200.000,00 €	100	
CD-CT-3-063	Ripristino e rifunzionalizzazione idraulica della rete fognaria Via Roma con ripristino della sede viaria	Comune di Casamicciola Terme	In corso Progettazione	603.620,17 €	0	La progettazione sarà affidata entro settembre
CD-CT-3-064	Messa in sicurezza e ripristino delle condizioni ante alluvionali del 26 novembre 2022 alla salita Tresta	Comune di Casamicciola Terme	Lavori da affidare	229.651,65 €	5	PROGETTO ESECUTIVO CONCLUSO e APPROVATO in corso affidamento lavori





Piano interventi OCDPC 948/22

STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

Comune di Lacco Ameno



I.R.M.A.P. (Ischia Reconstruction Monitoring App)

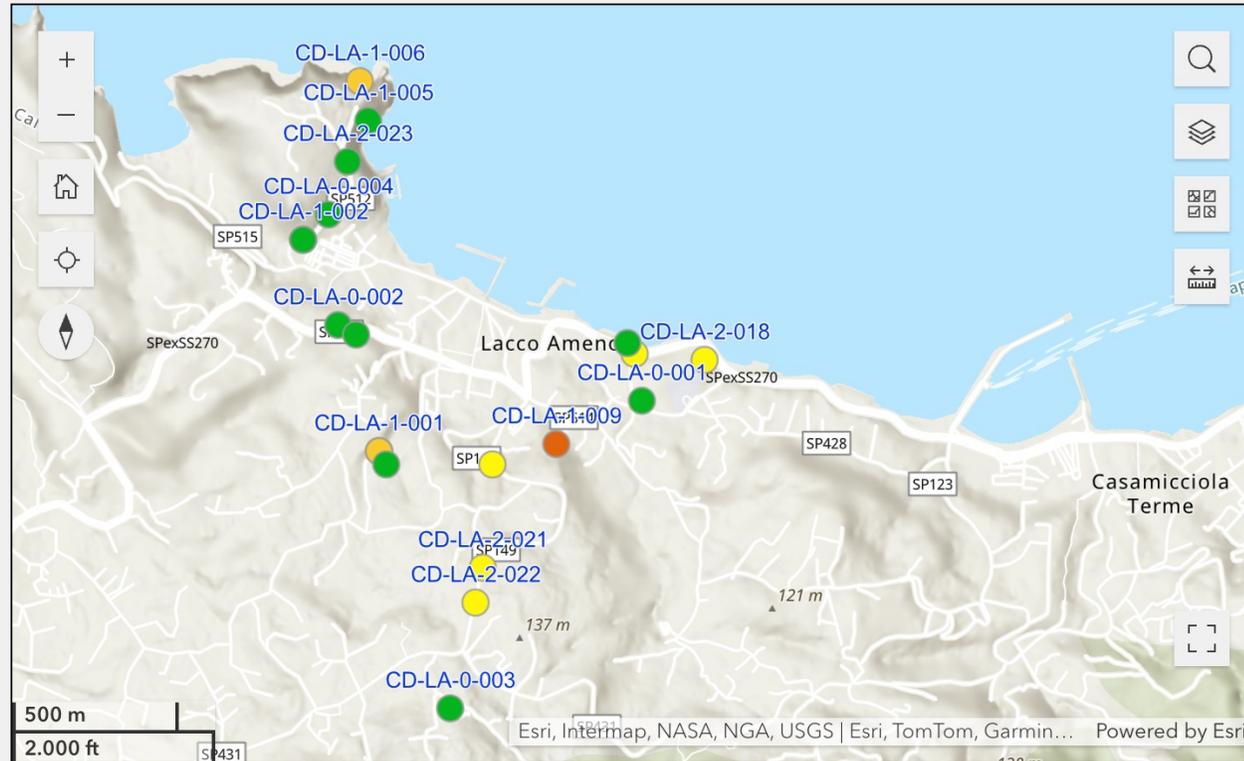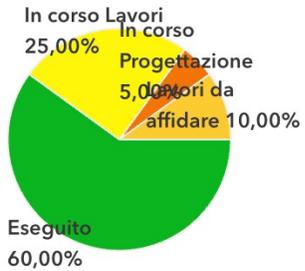


2 / 5

EDITOR DATA

Modifica i dati del monitoraggio

Navigation icons for data editing: Generale, Generale, Dati inter..., Appalti



monitoraggio interventi

- Eseguito
- Assenza di copertura finanziaria
- In corso Progettazione
- Redazione DIP

STATO DI AVANZAMENTO

▼ Eseguito



Piano interventi OCDPC 948/22

STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI - Comune di Lacco Ameno

LEGENDA STATO DI AVANZAMENTO

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO E RENDICONTATO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		ESEGUITO

CODICE IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO %	NOTE/CRITICITA'
CD-LA-0-001	Demolizione della guaina esistente danneggiata dalle forti piogge e dal vento e posa in opera di nuova guaina	Comune di Lacco Ameno	Concluso e rendicontato	43.458,83 €	100	
CD-LA-0-002	Demolizione della pavimentazione esistente danneggiata dalle forti piogge e dal vento e posa in opera di nuova guaina	Comune di Lacco Ameno	Concluso e rendicontato	63.215,50 €	100	
CD-LA-0-003	Opere di pulizia e accantonamento del materiale che ostruisce la viabilità e opere di transennamento per garantire la pubblica e privata incolumità	Comune di Lacco Ameno	Concluso e rendicontato	31.909,59 €	100	
CD-LA-0-004	Sp 512 Monte Vico, vari tratti lungo la Sp, delimitazione provvisoria, disaggio e prime rimozioni di materiale a tergo del muro stradale	Citta Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Concluso e rendicontato	2.337,58 €	100	
CD-LA-0-005	Sp 509 Circumv.ne di Lacco Ameno, parcheggio Mezzavia	Citta Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Concluso e rendicontato	1.676,83 €	100	
CD-LA-1-001	Ripristino del muro crollato alle spalle degli spogliatoi del campo sportivo con la pulizia della scarpata retrostante gli spogliatoi e gli spalti e sostituzione del serbatoio dell'acqua danneggiato	Comune di Lacco Ameno	Concluso e rendicontato	249.568,60 €	100	
CD-LA-1-002	Ispezioni puntuali del costone, disaggio manuale di volumi pericolanti, pulizia superficiale di materiale friabile, taglio sistematico della vegetazione arbustiva sul costone roccioso parzialmente crollato	Comune di Lacco Ameno	Concluso e rendicontato	10.614,00 €	100	
CD-LA-1-003	Pulizia e trasporto del materiale riversato sulla pubblica strada	Comune di Lacco Ameno	Concluso e rendicontato	12.487,24 €	100	
CD-LA-1-005	Messa in sicurezza e consolidamento del costone orientale di Montevico , Primi interventi di messa in sicurezza	Comune di Lacco Ameno	Eseguito	229.500,00 €	100	
CD-LA-1-006	Opere di messa in sicurezza e consolidamento del costone settentrionale di Montevico, Primi interventi di messa in sicurezza	Comune di Lacco Ameno	Lavori da affidare	109.700,00 €	10	
CD-LA-1-007	Messa in sicurezza e consolidamento del costone retrostante la tribuna del campo sportivo comunale , Primi interventi	Comune di Lacco Ameno	Lavori da affidare	217.762,03 €	10	PROGETTO ESECUTIVO CONCLUSO e APPROVATO. Sarà affidato entro fine agosto



Piano interventi OCDPC 948/22

STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI - Comune di Lacco Ameno

LEGENDA STATO DI AVANZAMENTO

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO E RENDICONTATO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		ESEGUITO


CODICE IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO %	NOTE/CRITICITA'
CD-LA-1-008	Messa in sicurezza e consolidamento del costone meridionale al campo sportivo comunale - Primi interventi	Comune di Lacco Ameno	Concluso e rendicontato	36.469,37 €	100	
CD-LA-1-009	Messa in sicurezza e consolidamento del costone incombente su via Casamonte, vico I Torre, vico II Torre	Comune di Lacco Ameno / Commissario Delegato	In corso Progettazione	500.000,00 €	5	PFTE in corso di revisione
CD-LA-2-018	Ripristino delle condotte sfilate dalle pareti dei pozzetti di sezionamento della rete fognaria a causa della sovrappressione idraulica causata dall'evento calamitoso	EVI	In corso Lavori	200.000,00 €	90	
CD-LA-2-019	Sistemazione / realizzazione opere di contenimento	Comune di Casamicciola Terme	In corso Lavori	600.000,00 €	20	
CD-LA-2-020	Ripristino della funzionalità della rete fognaria bianca e nera	EVI	In corso Lavori	590.000,00 €	35	
CD-LA-2-021	Dissabbiamento e pulizia della rete fognaria bianca e nera	EVI	In corso Lavori	320.000,00 €	50	
CD-LA-2-022	Risanamento strutturale dei giunti delle condotte fognarie bianche e nere	EVI	In corso Lavori	250.000,00 €	50	
CD-LA-2-023	Pulizia e ripristino della fogna pluviale in via Montevico	EVI	Eseguito	200.000,00 €	100	
CD-LA-3-024	Riattivazione del derivatore reflui sul terminale alveo La Rita (dissabbiamento e disostruzione)	EVI	Eseguito	80.000,00 €	100	



Piano interventi OCDPC 948/22 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI Comune di Forio




I.R.M.A.P. (Ischia Reconstruction Monitoring App)

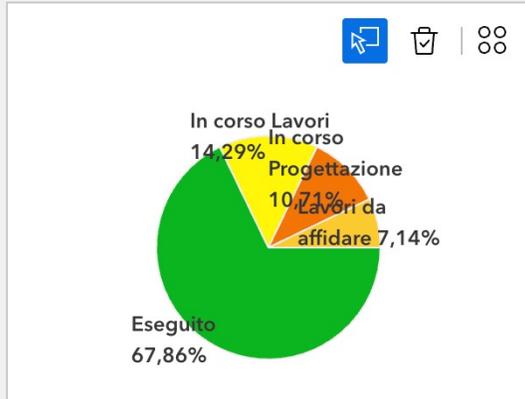

- monitoraggio interventi**
- Eseguito
 - Assenza di copertura finanziaria
 - In corso Progettazione
 - Redazione DIP

STATO DI AVANZAMENTO

✓ Eseguito

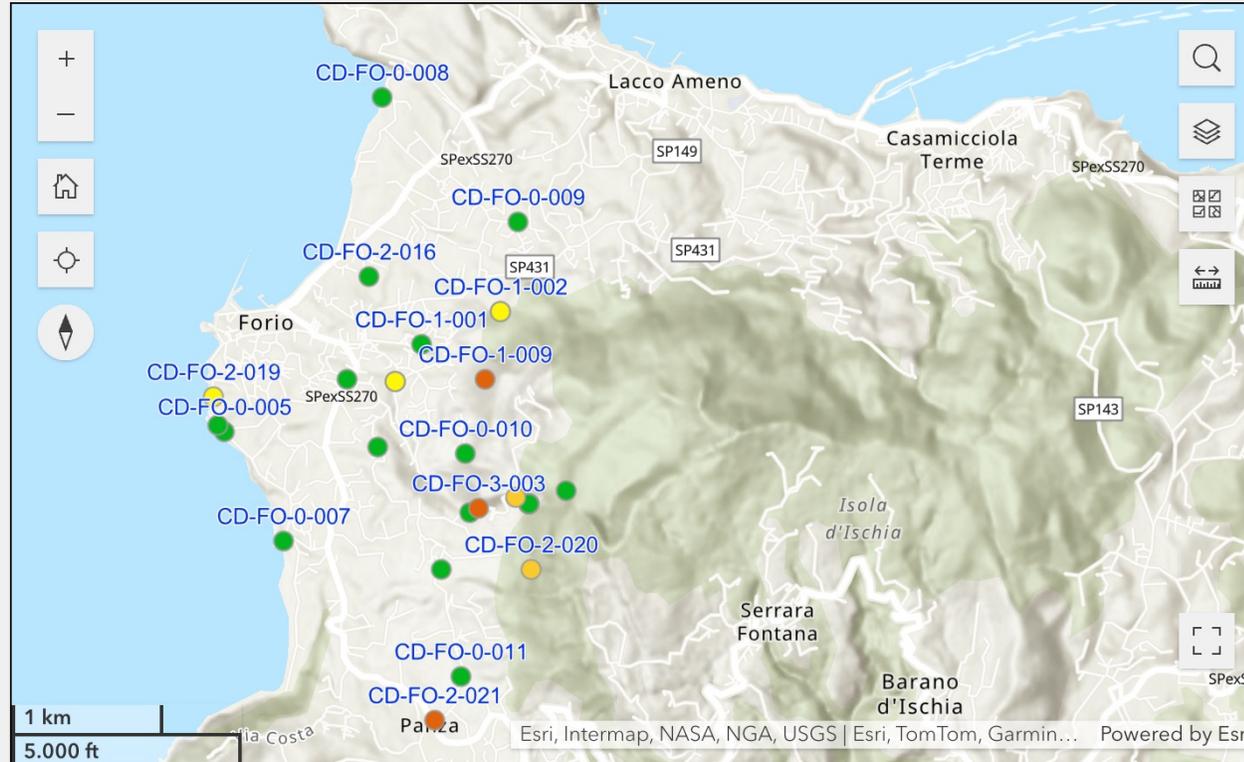


2 / 5

EDITOR DATA

Modifica i dati del monitoraggio

✎ 📅 📊 📋

Generale Generale Dati inter... Appalti

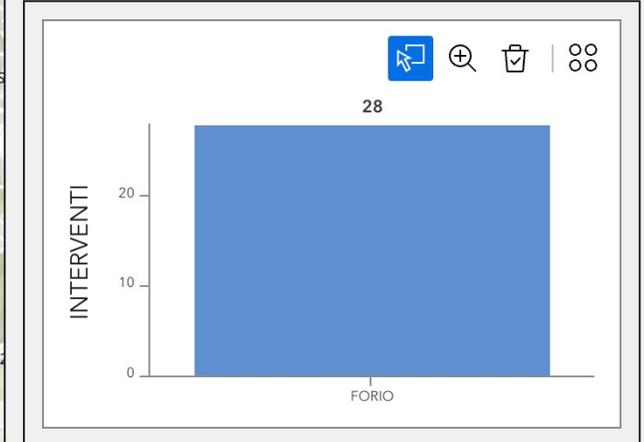

Piano interventi OCDPC 948/22 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI Comune di Forio

LEGENDA STATO DI AVANZAMENTO

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO E RENDICONTATO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		ESEGUITO

CODICE IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO %	NOTE/CRITICITA'
CD-FO-0-001	RIMOZIONE DEI MATERIALI FRANATI, PULIZIA SEDE STRADALE E SMALTIMENTO DEGLI STESSI	Comune di Forio	Concluso e rendicontato	25.473,03 €	100	
CD-FO-0-002	RIMOZIONE DEI MATERIALI FRANATI, PULIZIA SEDE STRADALE E SMALTIMENTO DEGLI STESSI	Comune di Forio	Concluso e rendicontato	10.370,00 €	100	
CD-FO-0-005	INTERDIZIONE SEDE STRADALE CON IDONEE DELIMITAZIONI	Comune di Forio	Concluso e rendicontato	5.724,24 €	100	
CD-FO-0-006	CUCI E SCUCI DELLA MURATURA ESISTENTE	Comune di Forio	Concluso e rendicontato	6.903,81 €	100	
CD-FO-0-007	RIPRISTINO OFFICIOSITA' IDRAULICA E RICOSTRUZIONE SEZIONE CANALE	Comune di Forio	Concluso e rendicontato	3.608,76 €	100	
CD-FO-0-008	RIEMPIMENTO CAVITA' SOTTERRANEA E RIPRISTINO SEDE STRADALE	Comune di Forio	Concluso e rendicontato	4.486,64 €	100	
CD-FO-0-009	RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO	Comune di Forio	Concluso e rendicontato	17.096,52 €	100	
CD-FO-0-010	RILIEVO DEI DISSESTI FRANOSI CON GEOREFERENZAZIONE, RAPPORTO DESCRITTIVO GEOLOGICO E GEOMORFOLOGICO SULLE TENDENZE EVOLUTIVE GENERALI	Comune di Forio	Concluso e rendicontato	10.000,00 €	100	
CD-FO-0-011	RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO	Comune di Forio	Eseguito	30.000,00 €	100	
CD-FO-1-001	RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO	Comune di Forio	Concluso e rendicontato	65.599,12 €	100	
CD-FO-1-002	REALIZZAZIONE BRIGLIE A FESSURA, CONSOLIDAMENTO CORTICALE COSTONI	Comune di Forio	Concluso e rendicontato	180.932,40 €	100	
CD-FO-1-003	DISGAGGIO PARETI, RIMOZIONE MATERIALI BARRIERE PARADEBRIS, BRIGLIE A FESSURA	Comune di Forio	Concluso e rendicontato	185.756,29 €	100	
CD-FO-1-005	PRIME OPERE RIPRISTINO CONTINUITA' IDRAULICA	Comune di Forio	In corso Lavori	301.018,35 €	20	



Piano interventi OCDPC 948/22 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI Comune di Forio

LEGENDA STATO DI AVANZAMENTO

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO E RENDICONTATO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		ESEGUITO

CODICE IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO %	NOTE/CRITICITA'
CD-FO-1-006	REALIZZAZIONE BRIGLIE A FESSURA, CONSOLIDAMENTO CORTICALE COSTONI - Primi interventi di messa in sicurezza – Località Pennanova	Comune di Forio	In corso lavori	800.000,00 €	10	
CD-FO-1-008	DISGAGGIO PARETI,RIMOZIONE MATERIALI BARRIERE PARADEBRIS, BRIGLIE A FESSURA , Primi interventi di messa in sicurezza	Comune di Forio	Concluso e rendicontato	153.782,69 €	100	
CD-FO-1-009	MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI MONTENUOVO E CHIGNOLE INCOMBENTI SULL'ABITATO MONTERONE , Primi interventi di messa in sicurezza	Comune di Forio	In corso Progettazione	200.000,00 €	5	PE adeguato alle richieste del tavolo tecnico. Sarà convocata la CSS. Si dovranno fare delle indagini aggiuntive. PE in consegna.
CD-FO-1-010	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO AFFERENTE IL BACINO PIELLERO, CAVA CAMPO , primi interventi di messa in sicurezza	Comune di Forio	In corso lavori	172.000,00 €	10	
CD-FO-1-011	MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE VERSANTE LOCALITA' PASSAVENTO ,Primi interventi di messa in sicurezza	Comune di Forio	Concluso e rendicontato	416.575,80 €	100	
CD-FO-1-013	OPERE DIFESA PROVVISORIALE IN ATTESA INTERVENTO DEFINITIVO , stralcio funzionale 1	Comune di Forio	Concluso e rendicontato	133.199,76 €	100	
CD-FO-1-015	RIFACIMENTO MURO DI CONTENIMENTO Montecorvo	Comune di Forio	Eseguito	250.000,00 €	100	
CD-FO-2-016	Ripristino impermeabilizzazione del Palazzetto dello sport Palacasale	Comune di Forio	Concluso e rendicontato	87.783,98 €	100	
CD-FO-2-017	Opere di consolidamento muro di sostegno Via Mortola	Comune di Forio	Eseguito	90.000,00 €	100	



Piano interventi OCDPC 948/22 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI Comune di Forio

LEGENDA STATO DI AVANZAMENTO

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO E RENDICONTATO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		ESEGUITO

CODICE IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO %	NOTE/CRITICITA'
CD-FO-2-018	Taglio vegetazionale, disgaggio, stabilizzazione e trasporto dei materiali litoidi e biomasse ai siti	Comune di Forio	Lavori da affidare	1.500.000,00 €	10	PE concluso e approvato
CD-FO-2-019	Opere di difesa provvisoria in attesa intervento definitivo , localita Soccorso , stralcio funzionale 3	Comune di Forio	In corso Lavori	1.465.000,00 €	20	
CD-FO-2-020	Primi interventi di messa in sicurezza e sistemazione versante in localita Passavento	Comune di Forio	Lavori da affidare	850.000,00 €	10	E' stata fatta la CSS sul PFTE. Manca solo il parere della Regione. PE concluso. Sono pronti per l'affidamento.
CD-FO-2-021	Opere di pulizia dei fossi di guardia e delle vasche di laminazione ExSS270	Comune di Forio	In corso Progettazione	300.000,00 €	5	PE in fase di consegna. Devono acquisire parere Soprintendenza
CD-FO-2-003	DISGAGGIO PARETI-RIMOZIONE MATERIALI BARRIERE PARADEBRIS- BRIGLIE A FESSURA - Intervento ripristino muro di sostegno	Comune di Forio	Concluso e rendicontato	61.154,23 €	100	
CD-FO-3-003	DISGAGGIO PARETI-RIMOZIONE MATERIALI BARRIERE PARADEBRIS- BRIGLIE A FESSURA-- Intervento ripristino continuità idraulica. Località Corvaro	Comune di Forio	In corso Progettazione	490.073,79 €	5	PE concluso. Conclusa la assoggettabilità a VIA. Devono convocare CSS. Sta per essere trasmessa la VINCA alla Regione



Piano interventi OCDPC 948/22 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

Comune di Serrara Fontana



I.R.M.A.P. (Ischia Reconstruction Monitoring App)




monitoraggio interventi

- Eseguito
- Assenza di copertura finanziaria
- In corso Progettazione
- Redazione DIP

STATO DI AVANZAMENTO

▼ Eseguito

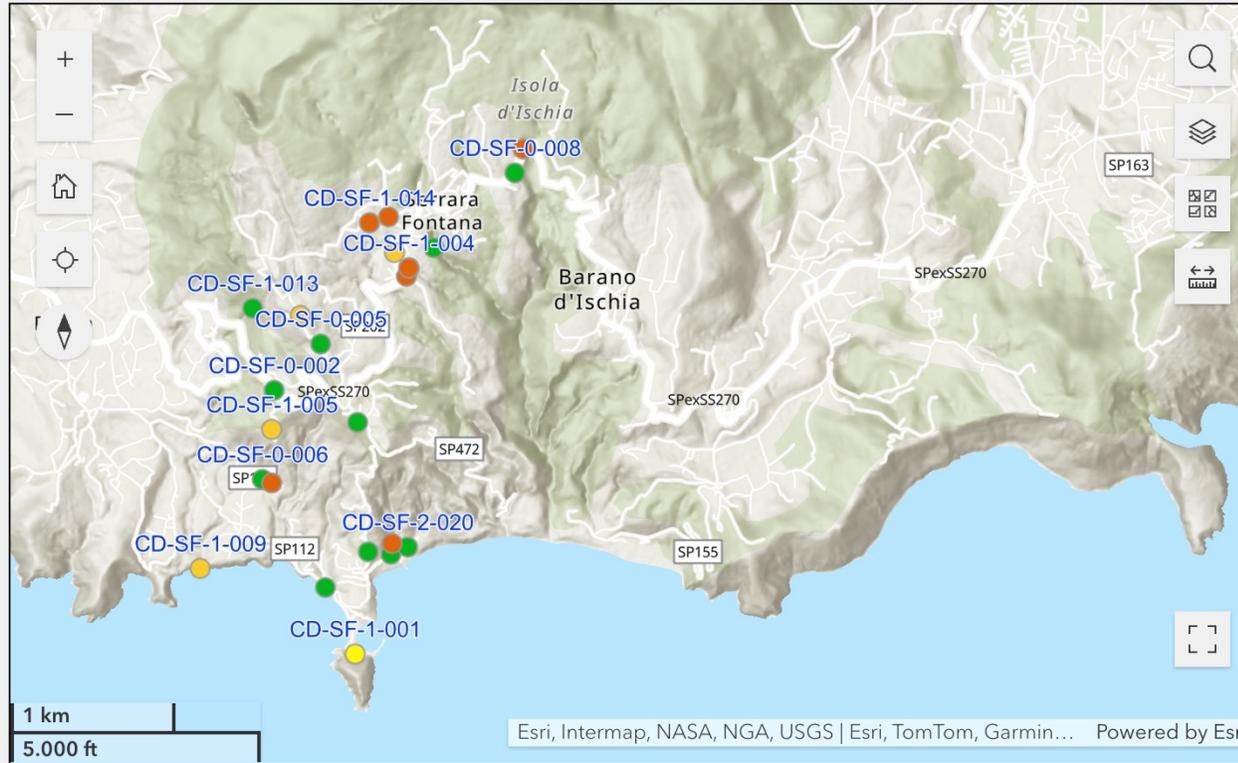

< 2 / 5 >

EDITOR DATA

Modifica i dati del monitoraggio

- ✎ Generale
- 📊 Generale
- 📊 Dati inter...
- 📊 Appalti



Piano interventi OCDPC 948/22 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

Comune di Serrara Fontana

LEGENDA STATO DI AVANZAMENTO

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO E RENDICONTATO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		ESEGUITO

CODICE IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO %	NOTE/CRITICITA
CD-SF-0-002	Movimentazione terreno smottato sulle strade per il ripristino della circolazione.	Comune di Serrara Fontana	Eseguito	7.320,00 €	100	
CD-SF-0-003	Ripristino tratto di strada crollato	Comune di Serrara Fontana	Eseguito	5.310,51 €	100	
CD-SF-0-005	SP478, disaggio e prime rimozioni di materiale a tergio della scarpata e delimitazione provvisoria	Citta Metropolitana di Napoli – Direz. Tecnica Strade	Concluso e rendicontato	9.228,78 €	100	
CD-SF-0-006	Sp 112, rimozione rete, rimozione materiale accumulato/detriti nel tempo e in occasione degli ultimi eventi, oltre alla pulizia di una parte della scarpata.	Citta Metropolitana di Napoli – Direz. Tecnica Strade	Concluso e rendicontato	3.750,15 €	100	
CD-SF-0-008	Ex SS 270 Isola Verde altezza km 9+850 , delimitazione	Citta Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Concluso e rendicontato	96.108,58 €	100	
CD-SF-1-001	Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio, dal monte della Torre di Sant'Angelo posto a ridosso di proprietà private sgomberate ed in adiacenza dell'area portuale.	Comune di Serrara Fontana	In corso Lavori	1.777.692,74 €	15	
CD-SF-1-002	Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio, latistanti la via comunale via Pendio Oscuro. Trasporto a scarica dei materiali.	Comune di Serrara Fontana	In corso Progettazione	450.000,00 €	5	Progetto Esecutivo in consegna. Non c'è VINCA.
CD-SF-1-003	Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio, latistanti la via comunale Casale. Trasporto a scarica dei materiali.	Comune di Serrara Fontana	In corso Progettazione	150.000,00 €	5	PE finito, da trasmettere al tavolo tecnico
CD-SF-1-004	Intervento di rimozione detriti da vasca e pozzetti realizzati dal Genio Civile per regimentare le acque. Opere di sistemazione idraulica al fine di evitare erosione al piede del costone su cui poggiano vari fabbricati in bilico e oggetto di sgombero.	Comune di Serrara Fontana / Commissario Delegato	In corso Progettazione	500.000,00 €	5	PFTE consegnato, in valutazione al Tavolo tecnico. Acquisiti i pareri in conferenza. Si può riconvocare la CSS per chiusura
CD-SF-1-005	Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio, latistanti la via comunale via Martofa. Traspoto a scarica dei materiali.	Comune di Serrara Fontana	Lavori da affidare	100.000,00 €	10	PE revisionato a seguito di tavolo tecnico. Saranno trasmesse le integrazioni
CD-SF-1-006	Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione dei detriti dal letto dell'Alveo Martofa Cuotto, con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi a mano.	Comune di Serrara Fontana / Commissario Delegato	In corso Progettazione	150.000,00 €	5	



Piano interventi OCDPC 948/22 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

Comune di Serrara Fontana

LEGENDA STATO DI AVANZAMENTO

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO E RENDICONTATO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		ESEGUITO

CODICE IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO %	NOTE/CRITICITA
CD-SF-1-007	Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione terreno dall'alveo di Cava Ruffano, con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali Tra	Comune di Serrara Fontana	Concluso e rendicontato	146.992,45 €	100	
CD-SF-1-008	Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione detriti Alveo Fondolillo con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali Trasporto a di	Comune di Serrara Fontana	Concluso e rendicontato	147.367,78 €	100	
CD-SF-1-009	Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione detriti dall'Alveo di Carovana con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali.	Comune di Serrara Fontana	Lavori da affidare	200.000,00 €	10	Con nota prot.n. 5869 e successivo prot.n. 5921 é stato trasmesso il PE. Lo stesso é stato esaminato dalla CLP che ha espresso parere favorevole in data 16.06.25. Trasmesso al tavolo tecnico che aveva richiesto modifiche. E' stato già ritrasmesso con le modifiche. E' da mettere a gara.
CD-SF-1-010	Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) e distruzione dell'Alveo Cavapontina, con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali	Comune di Serrara Fontana /Commissario Delegato	In corso Progettazione	400.000,00 €	5	Il progetto esecutivo è in consegna. Potrebbe essere affidato a ConSAP
CD-SF-1-011	Disgaggio di parti del costone e della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio, latitanti la via comunale via Sant'Angelo. Trasporto a discarica dei materiali.	Comune di Serrara Fontana	Concluso e rendicontato	155.082,68 €	100	
CD-SF-1-013	Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione dei detriti dal letto dell'Alveo, con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali	Comune di Serrara Fontana /Commissario Delegato	Eseguito	200.000,00 €	100	
CD-SF-1-014	Asportazione della vegetazione (alberi, arbusti ecc) instabili ed in precario equilibrio ai lati delle sponde dei canali, rimozione dei detriti dal letto dell'Alveo, con mezzi meccanici di piccola dimensione ed in taluni tratti con attrezzi manuali	Comune di Serrara Fontana	In corso Progettazione	200.000,00 €	5	



Piano interventi OCDPC 948/22 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI Comune di Serrara Fontana


LEGENDA STATO DI AVANZAMENTO

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO E RENDICONTATO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		ESEGUITO

CODICE IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO %	NOTE/CRITICITA
CD-SF-1-016	Sistemazione / realizzazione opere di contenimento, rafforzamento corticale	Comune di Serrara Fontana / Commissario Delegato	Lavori da affidare	400.000,00 €	5	PFTE approvato in CSS. PE sarà consegnato il 5 agosto. Nella fase esecutiva dovrebbe passare a ConSAP
CD-SF-1-017	Lavori di messa in sicurezza costone via Falanga	Comune di Serrara Fontana / Commissario Delegato	Lavori da affidare	500.000,00 €	5	PFTE approvato in CSS. PE sarà consegnato il 5 agosto. Nella fase esecutiva dovrebbe passare a ConSAP
CD-SF-2-019	Lavori di disostruzione della parte terminale di Cava Pontina in località Fontana	Serrara Fontana	Eseguito	1.830,00 €	100	
CD-SF-2-020	Lavori di disostruzione della parte terminale dell'alveo di Fondolillo in località Sant'Angelo	Serrara Fontana	Eseguito	5.978,00 €	100	
CD-SF-2-021	Sistemazione/realizzazione opere di contenimento, ripristino corticale	Città Metropolitana	In corso Progettazione	1.280.000,00 €	5	
CD-SF-2-008	Rifunzionalizzazione dell'Alveo Fondolillo	Comune di Serrara Fontana	In corso Progettazione	302.184,51 €	5	PROGETTO ESECUTIVO CONCLUSO Deve andare al tavolo tecnico



Piano interventi OCDPC 948/22 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI Comune di Ischia

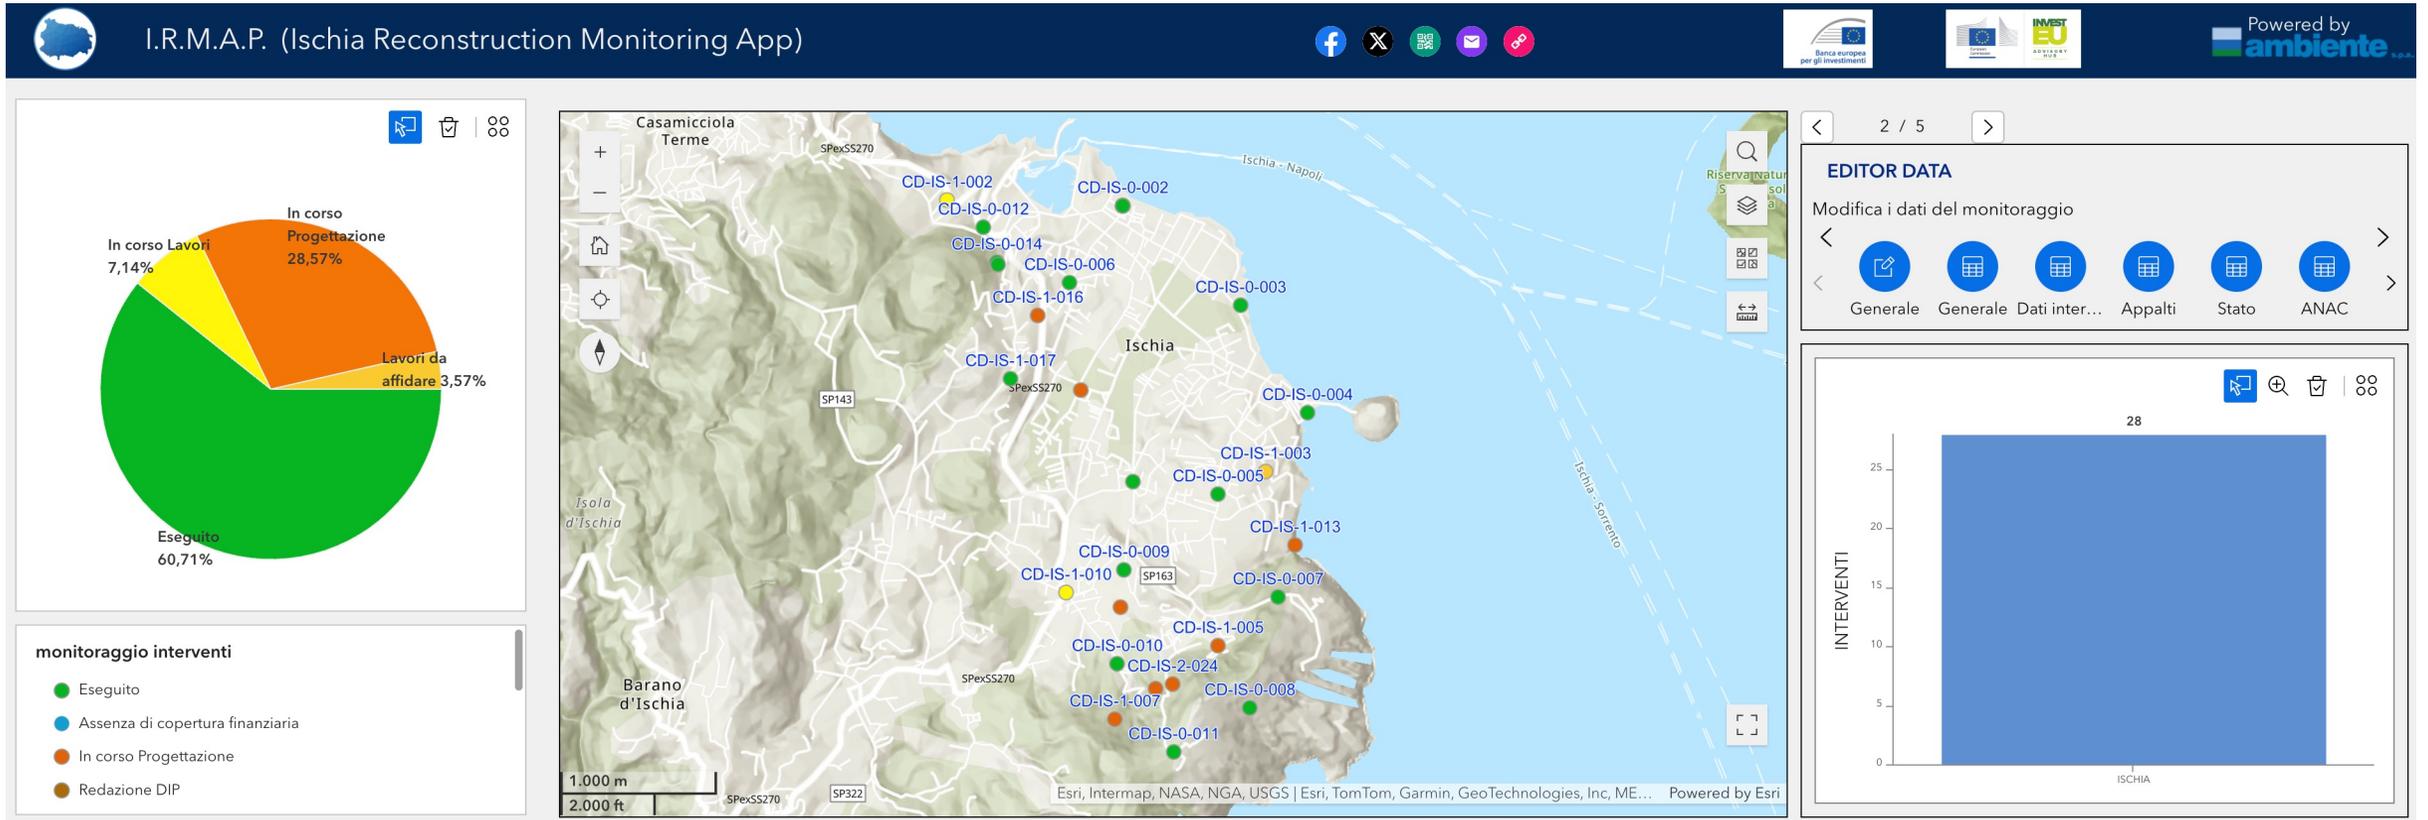

Piano interventi OCDPC 948/22 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI Comune di Ischia

LEGENDA STATO DI AVANZAMENTO

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO E RENDICONTATO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		ESEGUITO

CODICE IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO %	NOTE/CRITICITA'
CD-IS-0-002	Disostruzione e Pulizia Canale deflusso acque	Comune di Ischia	Concluso e rendicontato	653,92 €	100	
CD-IS-0-003	Pulizia e rimozione sabbia	Comune di Ischia	Concluso e rendicontato	1.659,20 €	100	
CD-IS-0-004	Pulizia e rimozione sabbia	Comune di Ischia	Concluso e rendicontato	829,60 €	100	
CD-IS-0-005	Rimozione materiale per ripristino viabilita	Comune di Ischia	Concluso e rendicontato	1.061,40 €	100	
CD-IS-0-006	Rimozione materiale per ripristino viabilita	Comune di Ischia	Concluso e rendicontato	1.415,20 €	100	
CD-IS-0-007	Rimozione materiale per ripristino viabilita	Comune di Ischia	Concluso e rendicontato	2.049,60 €	100	
CD-IS-0-008	Rimozione materiale per ripristino viabilita	Comune di Ischia	Concluso e rendicontato	1.238,30 €	100	
CD-IS-0-009	Rimozione materiale per ripristino viabilita	Comune di Ischia	Concluso e rendicontato	884,50 €	100	
CD-IS-0-010	Rimozione materiale per ripristino viabilita	Comune di Ischia	Concluso e rendicontato	652,70 €	100	
CD-IS-0-011	Rimozione materiale per ripristino viabilita	Comune di Ischia	Concluso e rendicontato	2.732,80 €	100	
CD-IS-0-012	Rimozione materiale per ripristino viabilita	Comune di Ischia	Concluso e rendicontato	1.146,80 €	100	
CD-IS-0-013	Estensione contratto manutenzione ed assistenza impianti di sollevamento per smaltimento acque meteoriche in scadenza il 31.12.2022	Comune di Ischia	Concluso e rendicontato	12.505,00 €	100	
CD-IS-0-014	Messa in sicurezza con opere provvisoriale e ripristino muro di contenimento della strada	Comune di Ischia	Eseguito	36.038,80 €	100	
CD-IS-1-002	Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e intervento di contenimento del terrapieno mediante geostuoia e rete armata a doppia torsione ancorata	Comune di Ischia / Commissario Delegato	In corso Lavori	115.900,00 €	10	
CD-IS-1-003	Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e realizzazione di muro di contenimento in pietrame con fondazione in cls	Comune di Ischia	Lavori da affidare	55.000,00 €	10	Decreto di occupazione di urgenza. In corso affidamento diretto



Piano interventi OCDPC 948/22 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI Comune di Ischia

LEGENDA STATO DI AVANZAMENTO

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO E RENDICONTATO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		ESEGUITO

CODICE IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO	NOTE/CRITICITA'
CD-IS-1-005	Lavori di decespugliamento e taglio arbusti e progettazione per la realizzazione di muro di contenimento con fondazione in cls , I lotto	Comune di Ischia / Commissario Delegato	In corso Progettazione	169.600,00 €	5	
CD-IS-1-006	Impianti di sollevamento acque meteoriche di Via De Rivaz, Via F. Buonocore, Via Pontano: primi interventi di riqualificazione e potenziamento	EVI	Eseguito	106.913,93 €	100	
CD-IS-1-007	Primi interventi di messa in sicurezza presso il versante di Monte Vezzi	Comune di Ischia	In corso Progettazione	1.496.000,00 €	0	
CD-IS-1-010	Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria dell'alveo denominato RIO CORBORE (in parte tombato)	EVI	In corso Lavori	957.876,16 €	35	
CD-IS-1-012	Primi interventi di pulizia degli alvei siti nel territorio del Comune di Ischia e Progettazione di intervento di manutenzione straordinaria: alveo ubicato presso ZONA PIANO LIGUORI (VIA CARAUCIO)	Comune di Ischia / Commissario Delegato	In corso Progettazione	350.000,00 €	0	IN CORSO DI REVOCA E RIASSEGNAZIONE CON RIMODULAZIONE
CD-IS-1-013	Primi interventi di pulizia degli alvei siti nel territorio del Comune di Ischia e Progettazione di intervento di manutenzione straordinaria: alveo ubicato presso CAVONE VIA CAMPAGNANO , SPIAGGIA CARTAROMANA	Comune di Ischia / Commissario Delegato	In corso Progettazione	460.000,00 €	0	Il progettista ha consegnato PFTE e PE. E' stato fatto un tavolo tecnico in cui sono emerse criticità, già risolte.



Piano interventi OCDPC 948/22 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI Comune di Ischia

LEGENDA STATO DI AVANZAMENTO

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO E RENDICONTATO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		ESEGUITO




CODICE IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO	NOTE/CRITICITA'
CD-IS-1-015	Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria dell'alveo ubicato presso TRAVERSA MONTAGNONE	Comune di Ischia / Commissario Delegato	Concluso e rendicontato	51.352,75 €	100	
CD-IS-1-016	Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria dell'alveo ubicato presso VIA DELLE VIGNE e denominato CAVONE DEL PANZESE	Commissario Delegato	In corso Progettazione	250.000,00 €	5	Il PE non è ancora concluso. Ci sono degli alberi pericolanti nell'alveo che andranno rimossi e ci vorrà la VINCA (non screening).
CD-IS-1-017	Lavori di pulizia e manutenzione straordinaria dell'alveo ubicato presso VIA PENDIO DEL LAPILLO	Comune di Ischia / Commissario Delegato	Concluso e rendicontato	170.568,71 €	100	
CD-IS-1-018	Manutenzione straordinaria immobile in locazione Guardia di Finanza , Tenenza di Ischia a seguito degli interventi	Comune di Ischia	Concluso e rendicontato	122.163,81 €	100	
CD-IS-1-023	Lavori di decespugliamento e taglio degli arbusti sulla scarpata, realizzazione muro di contenimento in calcestruzzo e ripristino della sede stradale	Comune di Ischia	In corso Progettazione	150.000,00 €	5	Il progetto esecutivo consegnato, Deve essere indetta CSS
CD-IS-2-024	Rifacimento muro di contenimento e intervento corticale in Via Ca Mormile	Comune di Ischia	In corso Progettazione	470.593,09 €	5	Il Progetto esecutivo trasmesso completo il 23 luglio. Da caricata la verifica di assoggettabilità
CD-IS-2-025	Interventi di messa in sicurezza nell'area a valle da Via Pendio del Lapillo a Via delle Ginestre fino a Rio Corbore	Commissario Delegato	In corso Progettazione	915.000,00 €	5	Sospensione della prestazione. PFTE in consegna. Nel frattempo partirà una VINCA appropriata.
CD-IS-0-001	Ex SS 270 - Isola verde, + SP ricadenti sull'isola d'Ischia	Città Metropolitana di Napoli	Concluso e rendicontato	55.483,79 €	100	



Piano interventi OCDPC 948/22 – STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI Comune di Barano d'Ischia




I.R.M.A.P. (Ischia Reconstruction Monitoring App)

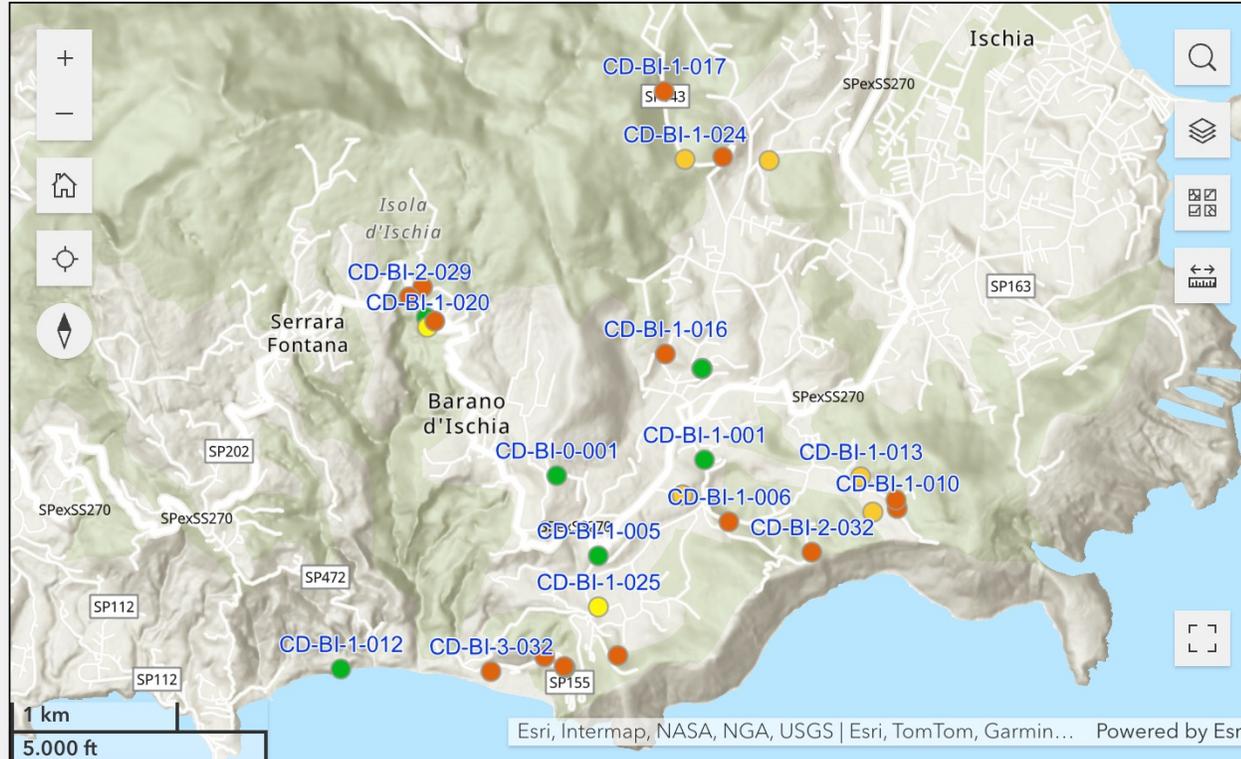

EDITOR DATA

Modifica i dati del monitoraggio

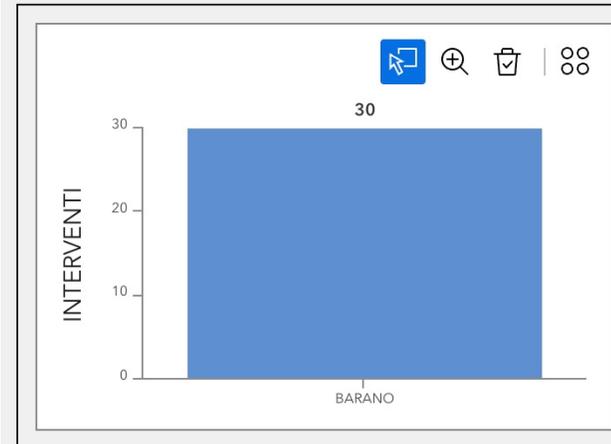

Piano interventi OCDPC 948/22 – STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI - Comune di Barano d'Ischia

LEGENDA STATO DI AVANZAMENTO

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO E RENDICONTATO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		ESEGUITO

CODICE IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO %	NOTE / CRITICITA'
CD-BI-0-001	Lavori di rimozione di materiale franato , Rimozione del materiale franato con un mezzo meccanico e rimozione del masso roccioso previa frantumazione dello stesso in sito	Comune di Barano	Concluso e rendicontato	1.220,00 €	100	
CD-BI-0-002	SP 155, messa in sicurezza provvisoria	Citta Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Concluso e rendicontato	1.446,69 €	100	
CD-BI-1-001	Fornitura di transennamento con elementi delimitanti ed eventualmente, contenitivi, a protezione di smottamenti prospicienti strade pubbliche	Comune di Barano	Concluso e rendicontato	4.988,09 €	100	
CD-BI-1-002	Lavori di Rimozione inerti	Comune di Barano	Lavori da affidare	70.000,00 €	10	PE concluso è stato validato e approvato. In corso di affidamento (congiuntamente all'intervento 003). E' in corso la verifica dei requisiti della ditta affidataria
CD-BI-1-003	Lavori di Rimozione albero caduto con mezzi meccanici	Comune di Barano	Lavori da affidare	3.000,00 €	10	PE concluso è stato validato e approvato. In corso di affidamento (congiuntamente all'intervento 002)
CD-BI-1-005	Sistemazione del materiale franato e distaccato	Comune di Barano	Eseguito	50.000,00 €	100	
CD-BI-1-006	Mitigazione del rischio consistente in interventi di decespugliamento, taglio arbusti ed eventuale sistemazione/realizzazione opere di contenimento dei fronti prospicienti strada carrabile	Commissario Delegato	In corso Progettazione	870.000,00 €	5	PFTE consegnato, revisionato più volte nel tavolo tecnico. Convocata la CdS con richieste di integrazioni della Soprintendenza. - Approvata in ccs il 28 luglio. 12 agosto trasmesso parere favorevole VINCA
CD-BI-1-009	Rinforzo del paramento murario a contenimento del terrazzamento	Comune di Barano	Lavori da affidare	120.000,00 €	20	PE concluso. Affidato screening VINCA e caricata in piattaforma (ID 1081). Una volta acquisita la VINCA, si procederà all'affidamento



Piano interventi OCDPC 948/22 – STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI - Comune di Barano d'Ischia

LEGENDA STATO DI AVANZAMENTO

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO E RENDICONTATO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		ESEGUITO

CODICE IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO %	NOTE / CRITICITA'
CD-BI-1-010	Mitigazione del rischio consistente in interventi di decespugliamento, taglio arbusti ed eventuale sistemazione/realizzazione opere di contenimento dei fronti prospicienti strada carrabile	Comune di Barano	In corso Progettazione	180.000,00 €	10	Progettazione interna in corso. PE non ancora conclusa. In corso affidamento lo screening VINCA
CD-BI-1-011	Lavori per la messa in sicurezza dei costoni latitanti la strada pubblica di Via Schiappone (ripristino muri preesistenti) fase 1	Comune di Barano	In corso Progettazione	80.000,00 €	10	In corso affidamento lo screening VINCA. PE concluso, sarà trasmesso la settimana prossima al tavolo tecnico
CD-BI-1-012	Pulizia delle rete paramassi presistenti ,	Comune di Barano	Eseguito	1.100.000,00 €	100	
CD-BI-1-013	Lavori volti alla mitigazione del rischio presso l'Alveo Cava Zaffarano, Prima pulizia di un tratto	Commissario Delegato	Lavori da affidare	820.000,00 €	10	Si deve procedere con la procedura di scelta ditta. Affidamento lavori entro luglio.
CD-BI-1-014	Lavori volti alla mitigazione del rischio presso presso il canale Spigadosso	Comune di Barano	Lavori da affidare	456.000,00 €	20	La gara di affidamento con procedura aperta è partita il 9 luglio. Apertura buste il 18 agosto.
CD-BI-1-015	Lavori volti alla mitigazione del rischio presso presso presso Cava Pallarito	Commissario Delegato	Concluso e rendicontato	70.000,00 €	100	
CD-BI-1-016	Lavori volti alla mitigazione del rischio presso i costoni prospicienti la Pubblica via Cufa	Comune di Barano	In corso Progettazione	100.000,00 €	10	PE consegnato. In corso revisione progetto a seguito di Tavolo tecnico. Affidato screening VINCA
CD-BI-1-017	Lavori volti alla mitigazione del rischio presso presso i costoni prospicienti la strada Pubblica P.Le Cretaio	Comune di Barano	In corso Progettazione	160.000,00 €	10	il progetto esecutivo è concluso. In corso di presentazione l'istanza di screening VinCA,
CD-BI-1-019	Lavori volti alla mitigazione del rischio presso presso i costoni dei cavoni	Comune di Barano	In corso Progettazione	200.000,00 €	0	Progetto esecutivo non ancora concluso
CD-BI-1-020	Lavori volti alla mitigazione del rischio presso presso i costoni prospicienti la Via Vecchia Pallarito	Commissario Delegato	In corso Lavori	70.000,00 €	10	
CD-BI-1-021	SP143, messa in sicurezza provvisoria	Citta Metropolitana di Napoli - Direz. Tecnica Strade	Concluso e rendicontato	3.083,44 €	100	



Piano interventi OCDPC 948/22 – STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI - Comune di Barano d'Ischia

LEGENDA STATO DI AVANZAMENTO


	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO E RENDICONTATO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		ESEGUITO

CODICE IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO %	NOTE / CRITICITA'
CD-BI-1-022	Sistemazione / realizzazione opere di contenimento,	Citta Metropolitana di Napoli – Direz. Tecnica Strade / Struttura Commissariale	In corso Progettazione	410.000,00 €	5	
CD-BI-1-023	Rimozioni materiali detritico, rifacimento parapetti, sistemazione opere di contenimento, ecc, ecc.	Comune di Barano	Eseguito	200.000,00 €	100	
CD-BI-1-024	Sistemazione / realizzazione opere di contenimento,	Comune di Barano	Lavori da affidare	200.000,00 €	10	IL progetto esecutivo concluso. Entro 28 luglio sarà affidato l'appalto
CD-BI-1-025	Lavori per la messa in sicurezza dei muri latistanti la strada pubblica via Pendio del Gelso	Comune di Barano	In corso Lavori	250.000,00 €	75	E' stata fatta una variante, approvata.
CD-BI-2-026	Pulizia e rimozione di materiale sciolto presso la Via Monte Cotto	Comune di Barano	In corso Progettazione	130.000,00 €	10	Si è reso necessario fare un esproprio. Metteranno una rete di contenimento per proteggere la strada
CD-BI-2-027	Lavori volti alla mitigazione del rischio presso i costoni prospicienti la via Vecchia Pallarito	Comune di Barano / Commissario Delegato - UTA	In corso Progettazione	1.310.000,00 €	0	
CD-BI-2-028	Lavori di messa in sicurezza dei costoni prospicienti la strada pubblica Via Benedetto Migliaccio	Comune di Barano	In corso Progettazione	750.000,00 €	10	Il progetto esecutivo concluso. Sarà trasmesso al tavolo tecnico. È stato affidato lo screening VinCA
CD-BI-2-029	Lavori di messa in sicurezza dei costoni di Cava Pallarito sottostanti la strada pubblica P.le Via Angelo Michelangelo	Comune di Barano / Commissario Delegato - UTA	In corso Progettazione	800.000,00 €	0	
CD-BI-2-030	lavori di messa in sicurezza del muro laterale della strada P.le Via Duca degli Abruzzi	Comune di Barano	In corso Progettazione	800.000,00 €	10	Il PFTE CONCLUSO. Stanno redigendo il frazionamento . La VINCA appropriata è stata affidata. Non è stata ancora presentata
CD-BI-2-032	Ripristino della stradina comunale presso Via Chiummano	Comune di Barano	In corso Progettazione	200.000,00 €	10	il progetto esecutivo in corso di conclusione. Sarà trasmesso entro la settimana prossima al tavolo tecnico. È stato affidato lo screening VinCA
CD-BI-3-032	Opere di messa in sicurezza presso la scala d'accesso dei Maronti	Comune di Barano	In corso Progettazione	1.000.000,00 €	0	Hanno ultimato le attività di indagine. PFTE concluso. Consegna PE prevista a breve. Occorre convocare tavolo tecnico per esaminare problema relativo alla presenza di una abitazione



Sintesi dello stato di attuazione degli interventi del Piano OCDPC 948/2022

TABELLA A – Interventi che si trovano nello stato "in corso progettazione"	
	TOTALE interventi nello stato "In corso Progettazione"
Casamicciola Terme	5
Lacco Ameno	1
Forio	3
Serrara Fontana	8
Ischia	8
Barano d'Ischia	14
TOTALE	39

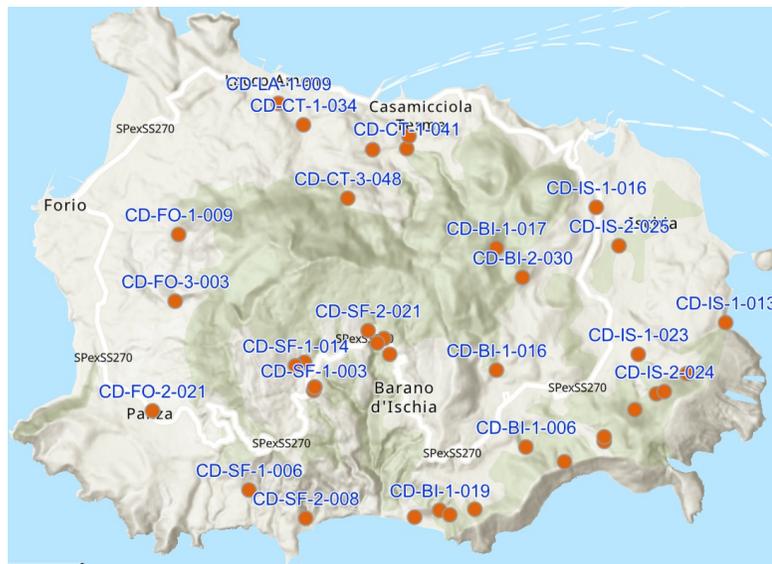

In Tabella A, e nel grafico corrispondente, sono evidenziati gli interventi che si trovano ad uno stato di avanzamento definito «**In corso progettazione**».

In Tabella B, e nel grafico corrispondente, sono evidenziati gli interventi che sono nelle condizioni di andare a gara o di iniziare i lavori nel breve termine, .

TABELLA B – Soggetto attuatore degli Interventi che si trovano nello stato «lavori da affidare»									
	Commissario Delegato	Comune di Serrara Fontana	Comune di Forio	Comune di Casamicciola Terme	Comune di Barano	Comune di Ischia	Comune di Lacco Ameno	SMA Campania	TOT.
Casamicciola Terme	1			7				1	9
Lacco Ameno							2		2
Forio			2						2
Ischia						1			1
Serrara Fontana		4							4
Barano d'Ischia	1				5				6
TOTALE	2	4	2	7	5	1	2	1	24




Interventi di competenza del Commissario Delegato e finanziati con fondi Regione Campania Comune di Casamicciola Terme STATO DI ATTUAZIONE



LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		

CODICE IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO %
CD-CT-1-006	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone al di sopra della via Eddomade, Casa Siano per una lunghezza di circa mt ed un'altezza di circa mt 40,00 ,Primi interventi di messa in sicurezza	SMA Campania Spa	In corso Lavori	583.095,00 €	70
CD-CT-1-007	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento del costone sottostante la strada Viale Paradisiello e soprastante la strada Rampe Paradisiello, per una lunghezza di circa mt 80,00 ed un'altezza di mt 40,00 , Primi interventi	SMA Campania Spa	In corso Lavori	547.000,00 €	80
CD-CT-1-008	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone sottostante la strada via Selva Pera, per una lunghezza di circa mt 50,00 ed un'altezza di circa , Primi interventi di messa in sicurezza	SMA Campania Spa	In corso Lavori	848.000,00 €	70
CD-CT-1-031	Rimozione dei fanghi e del materiale inerte di liquefazione e colata conseguente agli eventi calamitosi del 26 novembre 2022 mediante dragaggio del porto di Casamicciola Terme e lato banchina esterna	Lacco Ameno Capofila dei comuni dell'isola d'Ischia	Eseguito	3.212.000,00 €	100
CD-CT-2-046	Esecuzione Cassoni localita Celario	Comune di Casamicciola Terme	Lavori da affidare	1.486.786,00 €	5

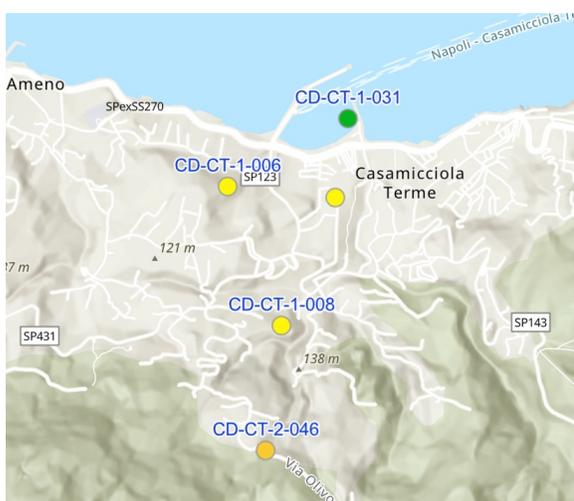

CASAMICCIOLA TERME

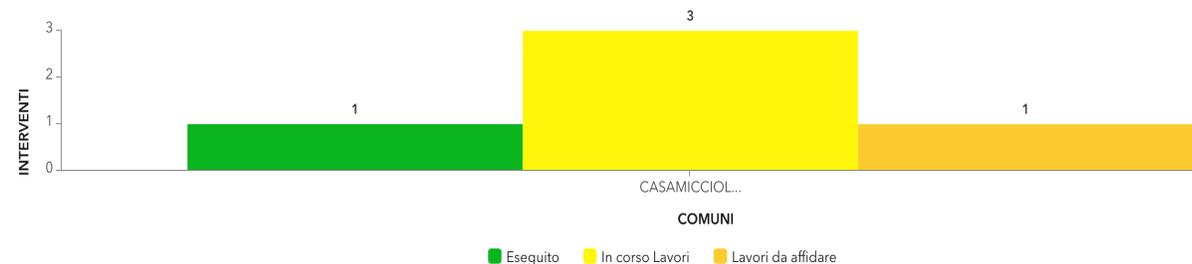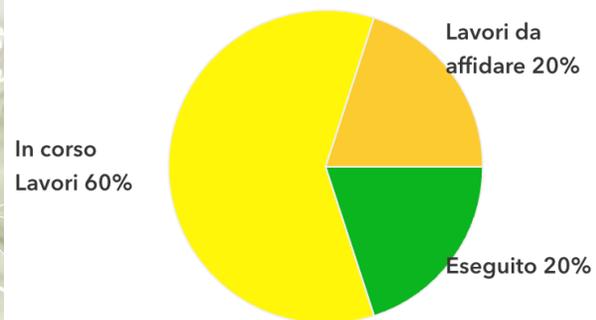


PIANO FANGHI- O.S. n.7 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

Interventi nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio




I.R.M.A.P. (Ischia Reconstruction Monitoring App)



monitoraggio interventi

- Eseguito
- Assenza di copertura finanziaria
- In corso Progettazione
- Redazione DIP


STATO DI AVANZAMENTO

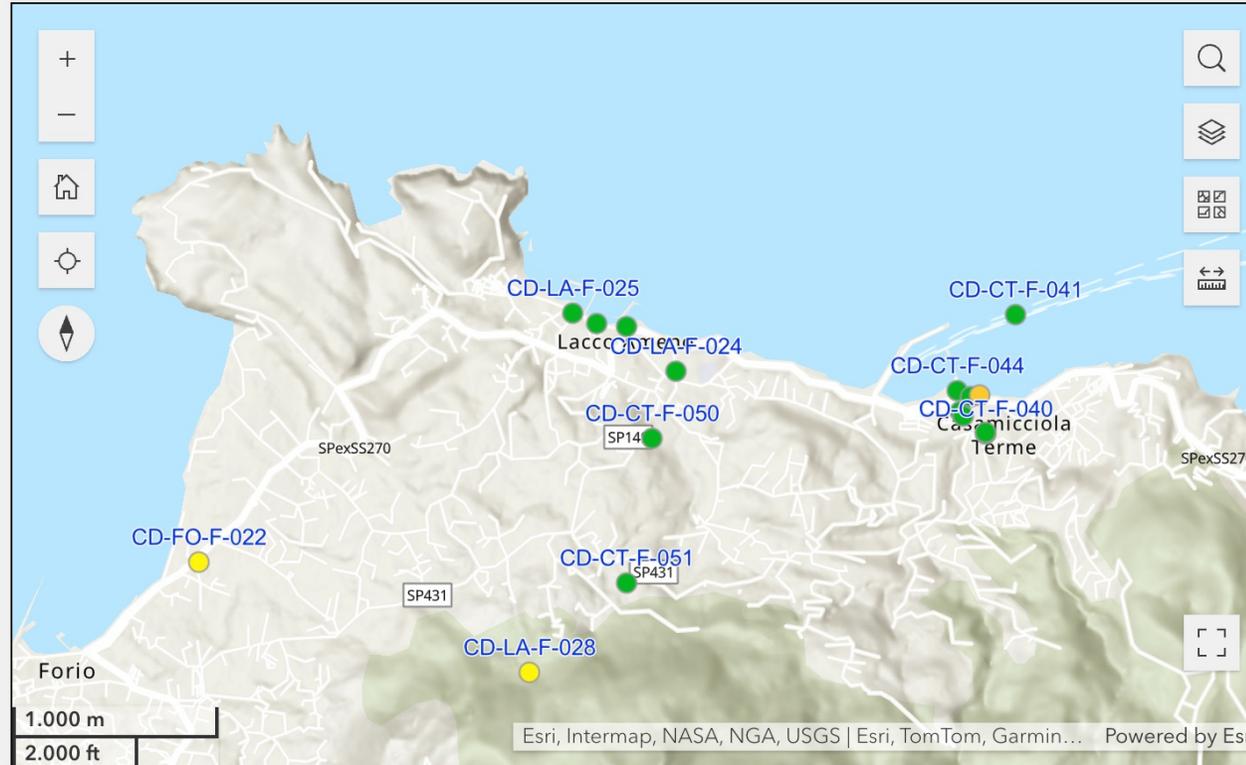

1 / 5

RAPPORTO MONITORAGGIO

Elaborazioni dati provenienti dalle lavorazioni

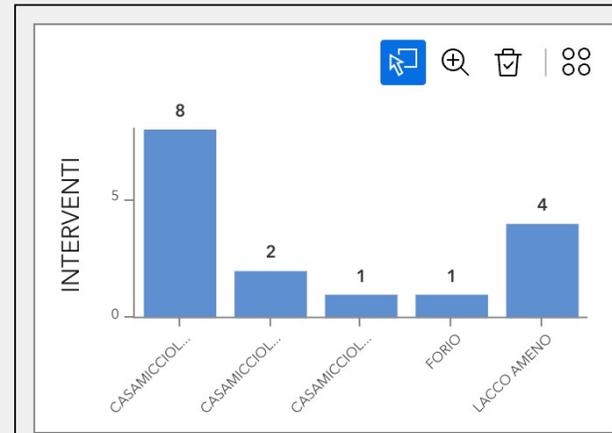

Piano fanghi - O.S. n.7 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI Comune di Casamicciola Terme

LEGENDA			
	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		

CODICE IDENTIFICATIVO	COMUNE	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO %	NOTE/CRITICITA'
CD-CT-F-040	CASAMICCIOLA TERME	Rimozione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all'evento calamitoso del 26 novembre 2022 e trasporto dello stesso presso i siti di stoccaggio provvisorio individuati sull'isola di Ischia	SMA Campania Spa	Eseguito	3.678.925,48 €	100	
CD-CT-F-041	CASAMICCIOLA TERME	Trasporto e smaltimento presso siti di recupero al di fuori dell'isola di Ischia dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata rimosso a seguito degli eventi calamitosi del giorno 26 novembre 2022 e seguenti	SMA Campania Spa	Eseguito	3.482.137,66 €	100	
CD-CT-F-042	CASAMICCIOLA TERME	Ulteriore Rimozione dei fanghi e del materiale inerte da liquefazione e colata conseguente all'evento calamitoso del 26 novembre 2022 e trasporto dello stesso presso i siti di stoccaggio provvisorio individuati sull'isola di Ischia	SMA Campania Spa	Eseguito	4.187.268,68 €	100	
CD-CT-F-043	CASAMICCIOLA TERME	Pulizia, dissabbiamento e ripristino del tratto terminale dell'alveo tombato Pio Monte della Misericordia lungo il tratto che parte da via Monte della Misericordia	EVI	Eseguito	258.323,51 €	100	
CD-CT-F-044	CASAMICCIOLA TERME	Pulizia e dissabbiamento della centrale di sollevamento delle acque reflue denominata "Rittmann" nonchè del pozzetto di confluenza posto immediatamente a monte della stessa, nei pressi di Piazza Marina	EVI	Eseguito	38.611,80 €	100	
CD-CT-F-052	CASAMICCIOLA TERME	ULTERIORE PULIZIA E DISSABBIAMENTO ALVEO TOMBATO TERMINALE PIO MONTE DELLA MISERICORDIA	EVI	Eseguito	162.226,05 €	100	
CD-CT-F-053-A	CASAMICCIOLA TERME	REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI COLMATA DA RIEMPIERE CON MATERIALE SCIOLTO DA FRANA (1° LOTTO)	Comune di Casamicciola Terme	Eseguito	1.191.784,11 €	100	
CD-CT-F-053-B	CASAMICCIOLA TERME	REALIZZAZIONE DI UNA VASCA DI COLMATA DA RIEMPIERE CON MATERIALE SCIOLTO DA FRANA (2° LOTTO)	Comune di Casamicciola Terme	Lavori da affidare	1.229.743,57 €	10	
CD-CT-F-050	CASAMICCIOLA TERME / LACCO AMENO	Intervento di pulizia e rimozione materiale detritico sull'Alveo La Rita	Commissario Straordinario	Eseguito	803.379,34 €	100	
CD-CT-F-051	CASAMICCIOLA TERME / LACCO AMENO	Intervento di pulizia e rimozione materiale detritico sull'Alveo Il Monaco	Commissario Straordinario	Eseguito	718.723,53 €	100	
CD-LA-F-028	CASAMICCIOLA TERME / LACCO AMENO / FORIO	Intervento di pulizia e rimozione materiale detritico sull'Alveo Scialicco	Commissario Straordinario	In corso Lavori	290.000,00 €	50	

Piano fanghi - O.S. n.7 - STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

LEGENDA


	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		

Comune di Forio

CODICE IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO %
CD-FO-F-022	Recupero fanghi e realizzazione del Parco urbano attrezzato e delle opere complementari	Comune di Forio	In corso Lavori	2.619.266,62 €	10

Comune di Lacco Ameno

CODICE IDENTIFICATIVO	DESCRIZIONE	SOGGETTO ATTUATORE	STATO	IMPORTO	AVANZAMENTO
CD-LA-F-024	Rimozione di sabbia, pietrisco e fanghi rinvenuti lungo l'asse longitudinale della condotta fognaria mista, in materiale ceramico DN500	EVI	Eseguito	286.788,03 €	100
CD-LA-F-025	Interventi di pulizia e smaltimento fanghi sulla centrale ubicata sul corso Angelo Rizzoli angolo via Pannella mc30	EVI	Eseguito	49.117,20 €	100
CD-LA-F-026	Interventi di pulizia e smaltimento fanghi sulla centrale denominata "piazza Salvatore Giardi" localita Capitello	EVI	Eseguito	338.176,63 €	100
CD-LA-F-027	Interventi di pulizia e smaltimento fanghi sulla centrale denominata Sombrero che capta i reflui misti provenienti dall'alveo limitrofo denominato "La Rita"	EVI	Eseguito	470.979,12 €	100

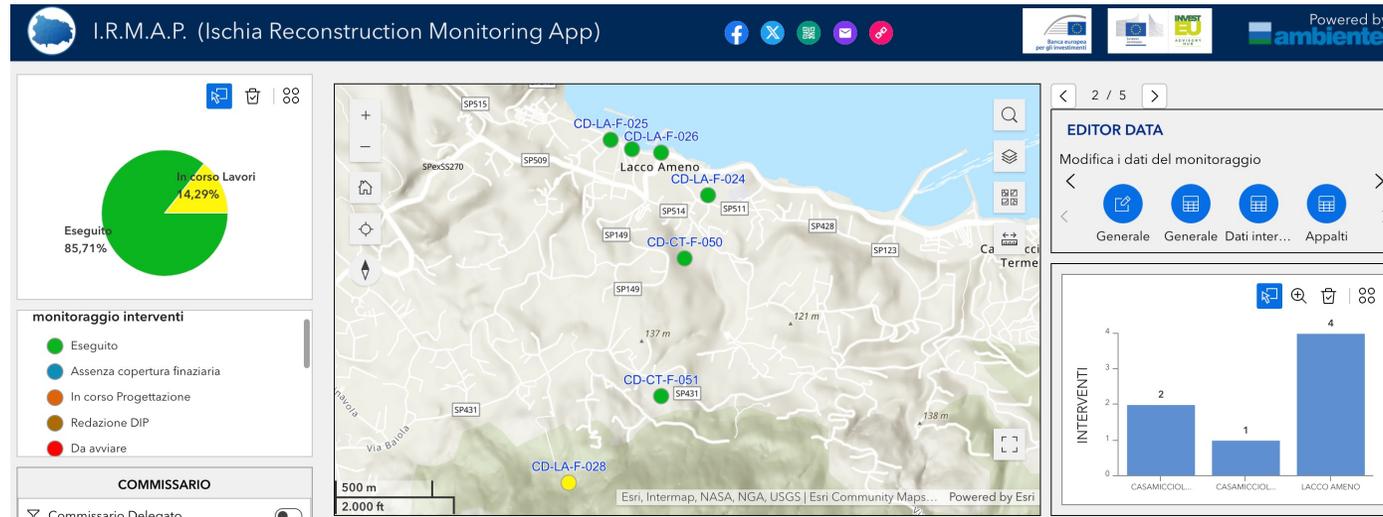

Interventi del piano art. 5 ter d.l. 186/2022 nel Comune di Casamicciola Ordinanza Speciale 4/2023 e la necessità di aggiornare il piano

Nei primi mesi del 2023 è stato predisposto il Piano degli interventi urgenti per la mitigazione del rischio idrogeologico, la cui definizione parte da un approfondimento della conoscenza del territorio interessato dagli eventi catastrofici e dell'impatto degli stessi, e dalla elaborazione di possibili scenari futuri, quali strumenti indispensabili per la programmazione degli interventi stessi.

Gli interventi del piano sono **necessari a contenere i flussi detritici provenienti dai versanti dell'Epomeo che si sono riversati a valle più volte nel corso degli anni, fino all'alluvione del 26 novembre 2022**. Si tratta, di opere che tendono a ridurre in modo significativo la probabilità che possano verificarsi nei future eventi come quelli connessi alla instabilità del versante, che hanno colpito la zona del Celario.

Il Piano degli interventi urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico nel Comune di Casamicciola, presentato dal Commissario Straordinario **in conferenza dei servizi il 27 aprile 2023**, ha acquisito i previsti pareri favorevoli, e nel pieno rispetto della tempistica prevista dal decreto Ischia **è stato approvato con Ordinanza speciale del Commissario Straordinario n. 4 del 31 maggio 2023**.


In data 4 agosto 2023 è stato **adottato il piano stralcio PAI** da **parte dell'Autorità di Bacino**

A seguito dei primi interventi di riduzione del rischio residuo che hanno comportato significative modifiche sul territorio rispetto alle condizioni post evento 2022, nonché della pubblicazione del Piano stralcio del PAI per il Comune di Casamicciola da parte dell'Autorità di Bacino in data 4/08/2023, contenente a sua volta un piano degli interventi con misure strutturali e non strutturali, **è emersa la necessità di integrare il Piano Commissariale degli Interventi Urgenti di cui all'ordinanza speciale n. 4 del 31/5/2023**.



Interventi del piano art. 5 ter d.l. 186/2022 nel Comune di Casamicciola

Ordinanza Speciale 8 - Importo pari ad € 178.000.000,00

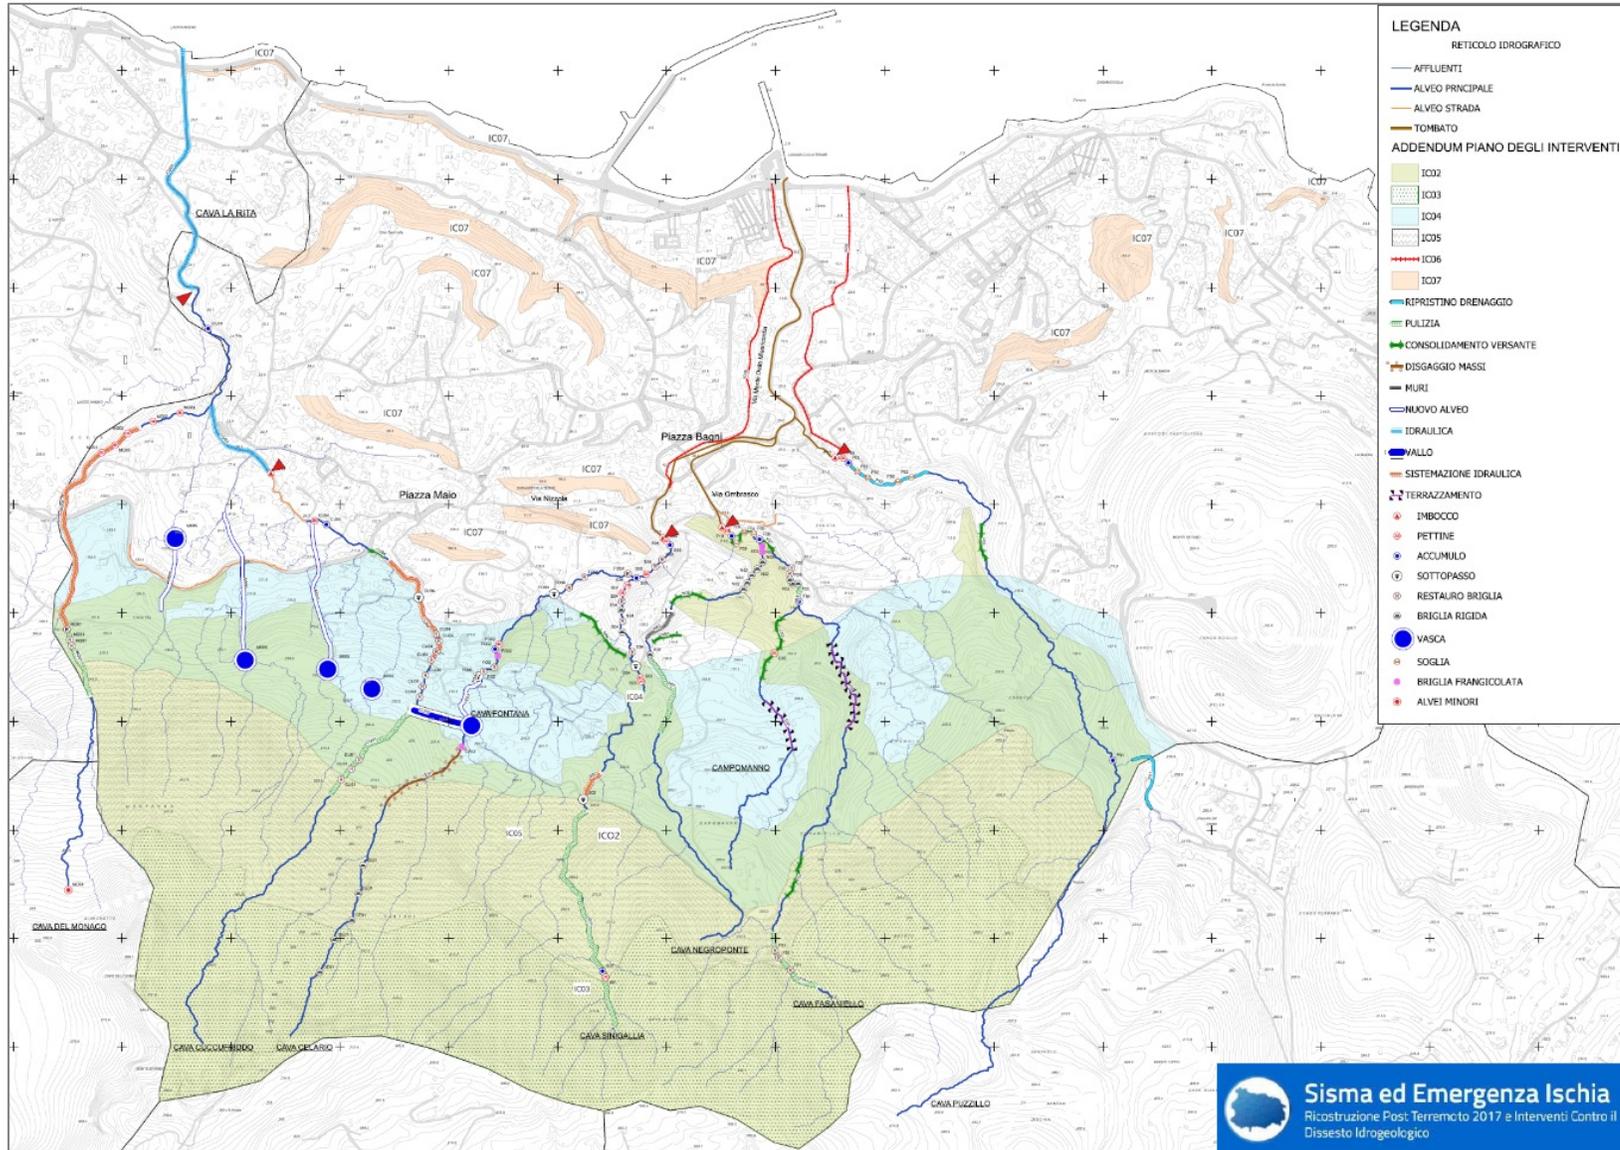

60 interventi piano art. 5-ter D.L. n. 186/2022 nel comune di Casamicciola Terme, il cui importo complessivo ammonta ad **€ 178.000.000,00**, così ripartiti:

➤ **17** definiti «prioritari per la messa in sicurezza strutturale» e finanziati per **€ 43.913.090,45**. Sono inoltre finanziate per **€ 6.225.617,71** le progettazioni e le indagini relative agli interventi ricompresi nella programmazione quinquennale Art.5-ter, per un finanziamento complessivo di **€ 50.138.708,16**;

➤ **43** Interventi ricompresi nella programmazione quinquennale Art.5-ter, per importi complessivi pari ad **€ 127.374.382,29**, non ancora finanziati;



Interventi del piano art. 5 ter d.l. 186/2022 nel Comune di Casamicciola

Importo pari ad € 178.000.000,00

piano approvato con le Ordinanze Speciali nn.4 e 8

STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

STATO INTERVENTO	RICOSTRUZIONE PUBBLICA POST – FRANA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASAMICCIOLA TERME		TOTALE
	Interventi prioritari per la messa in sicurezza strutturale e le progettazioni del Piano degli Interventi	Interventi ricompresi nella programmazione quinquennale Art.5-ter	
Importi interventi	50.138.708,16 € (43.913.090,45 € per gli interventi prioritari + 6.225.617,71 € per le progettazioni e le indagini relative agli Interventi ricompresi nella programmazione quinquennale Art.5-ter)	127.374.382,29 €	
Conclusi	1	-	1
In corso lavori	2	-	2
In corso progettazione i cui cantieri saranno avviati nel 2025	12	-	12
In corso affidamento progettazione	-	41	41
Da avviare	2	2	4
TOTALE	17	43	60
TOTALE INTERVENTI	60		



Interventi del piano art. 5 ter d.l. 186/2022 nel Comune di Casamicciola

nel piano approvato con le Ordinanze Speciali nn.4 e 8

STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI PRIORITARI

finanziati per un importo pari a € 51.000.000,00



I.R.M.A.P. (Ischia Reconstruction Monitoring App)




monitoraggio interventi

- Eseguito
- Assenza di copertura finanziaria
- In corso Progettazione
- Redazione DIP

COMMISSARIO



Commissario Delegato

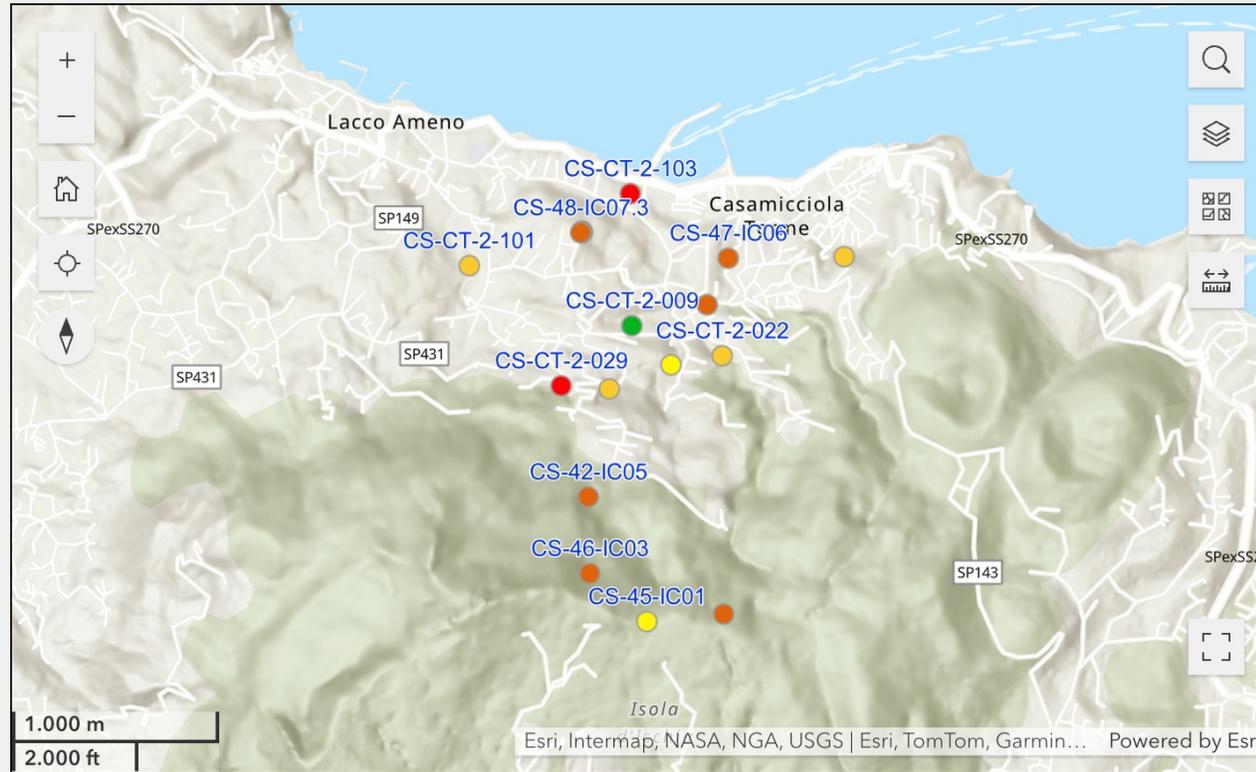

2 / 5

EDITOR DATA

Modifica i dati del monitoraggio

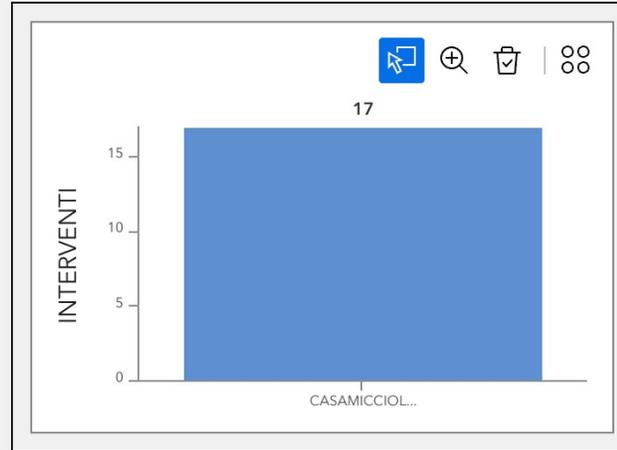

Interventi prioritari da eseguire sul territorio del Comune di Casamicciola compresi nel piano approvato con le Ordinanze Speciali nn.4 e 8 Elenco interventi finanziati - aggiornato a agosto 2025

LEGENDA			
	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		

CODICE INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	AVANZAMENTO %	NOTE/CRITICITA'
CS-40-IC02 - A	Sistemazione agronomico-forestale del tratto di cornice sommitale – PRIMA FASE	Commissario Straordinario	Redatto PFTE – Progettazione esecutiva in corso	4.000.000,00 €	5	
CS-42-IC05	Interventi per la riduzione del rischio delle frazioni alle pendici dell'Epomeo	Commissario Straordinario	Progettazione in corso	6.000.000,00 €	2	
CS-45-IC01	Cartografia di base	Commissario Straordinario	Attività in corso	142.130,00 €	80	
CS-46-IC03	Interventi di mitigazione del rischio da caduta di blocchi dai costoni delle zone sommitali	Commissario Straordinario	Progettazione in corso	4.000.000,00 €	2	
CS-47-IC06	Interventi per il miglioramento fognario nell'area dell'abitato di Casamicciola	CONSAP	Progettazione in corso	4.000.000,00 €	2	
CS-48-IC07.1	Interventi per la riduzione del rischio frana nell'area del centro abitato di Casamicciola – Gara 1	Commissario Straordinario	Progettazione in corso	3.000.000,00 €	2	
CS-48-IC07.2	Interventi per la riduzione del rischio frana nell'area del centro abitato di Casamicciola – Gara 2	Commissario Straordinario	Progettazione in corso	6.000.000,00 €	2	
CS-48-IC07.3	Interventi per la riduzione del rischio frana nell'area del centro abitato di Casamicciola – Gara 3	Commissario Straordinario	DIP aggiornato – in corso di affidamento servizi di progettazione	3.000.000,00 €	2	
CS-CT-2-009	Intervento da attuare nell'immediatezza di consolidamento costone località Valle del Cotto per una lunghezza di circa mt 50,00 ed un'altezza di circa mt 20,00 -Primi interventi di messa in sicurezza	Comune di Casamicciola Terme	ESEGUITO	673.945,75 €	100	
CS-CT-2-020	Completamento intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell'alveo Senigallia	Comune di Casamicciola Terme	Lavori in corso	1.710.072,53 €	50	



Interventi prioritari da eseguire sul territorio del Comune di Casamicciola compresi nel piano approvato con le Ordinanze Speciali nn.4 e 8 Elenco interventi finanziati - aggiornato a agosto 2025

LEGENDA			
	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		


CODICE INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	AVANZAMENTO %	NOTE/CRITICITA'
CS-CT-2-021	Completamento intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica dell'alveo Cava Fontana – Vallone Selva	Comune di Casamicciola Terme	Redatto PFTE dl50/2016 – in corso affidamento progetto esecutivo	2.713.746,24 €	5	
CS-CT-2-022	Completamento intervento di consolidamento e ripristino funzionalità idraulica degli alvei Negroponte (foce), Fasaniello o Ervaniello	Comune di Casamicciola Terme	Redatto PFTE dl50/2016 –in corso affidamento progetto esecutivo	1.435.476,35 €	5	
CS-CT-2-029	Completamento : consolidamento delle scarpate laterali del torrente Cuccufriddo incrocio con via Arenile e via Montecito, nonché messa in sicurezza delle strade coinvolte	Comune di Casamicciola Terme	In corso affidamento PFTE e Progetto esecutivo	1.222.423,39 €	0	
CS-CT-2-039	Completamento intervento di consolidamento costone sovrastante via Mortito	Comune di Casamicciola Terme	Redatto PFTE dl50/2023 – Lavori da affidare	1.057.426,19 €	5	Da revocare a seguito di rimodulazione
CS-CT-2-101	Consolidamento delle scarpate laterali dell'alveo la Rita e cava del Monaco	Comune di Casamicciola Terme	Redatto PFTE dl36/2023 – Lavori da affidare	2.500.000,00 €	5	
CS-CT-2-103	Intervento di messa in sicurezza del costone su via Dott. Mennella incumbente sulle abitazioni Piazza Marina	Comune di Casamicciola Terme	Da avviare	500.000,00 €	0	Sarà oggetto di revoca a seguito di rimodulazione
CS-CT-S06-F10-P03	Realizzazione briglia a pettine e allargamento imbocchi in corrispondenza dell'alveo Senigallia, Pozzillo e Fasaniello	Commissario Straordinario	Lavori da affidare	2.000.000,00 €	2	



Interventi del piano art. 5 ter d.l. 186/2022 nel Comune di Casamicciola

piano approvato con le Ordinanze Speciali nn.4 e 8

STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI RICOMPRESI NELLA PROGRAMMAZIONE QUINQUENNALE Finanziate le indagini e la redazione del PFTE

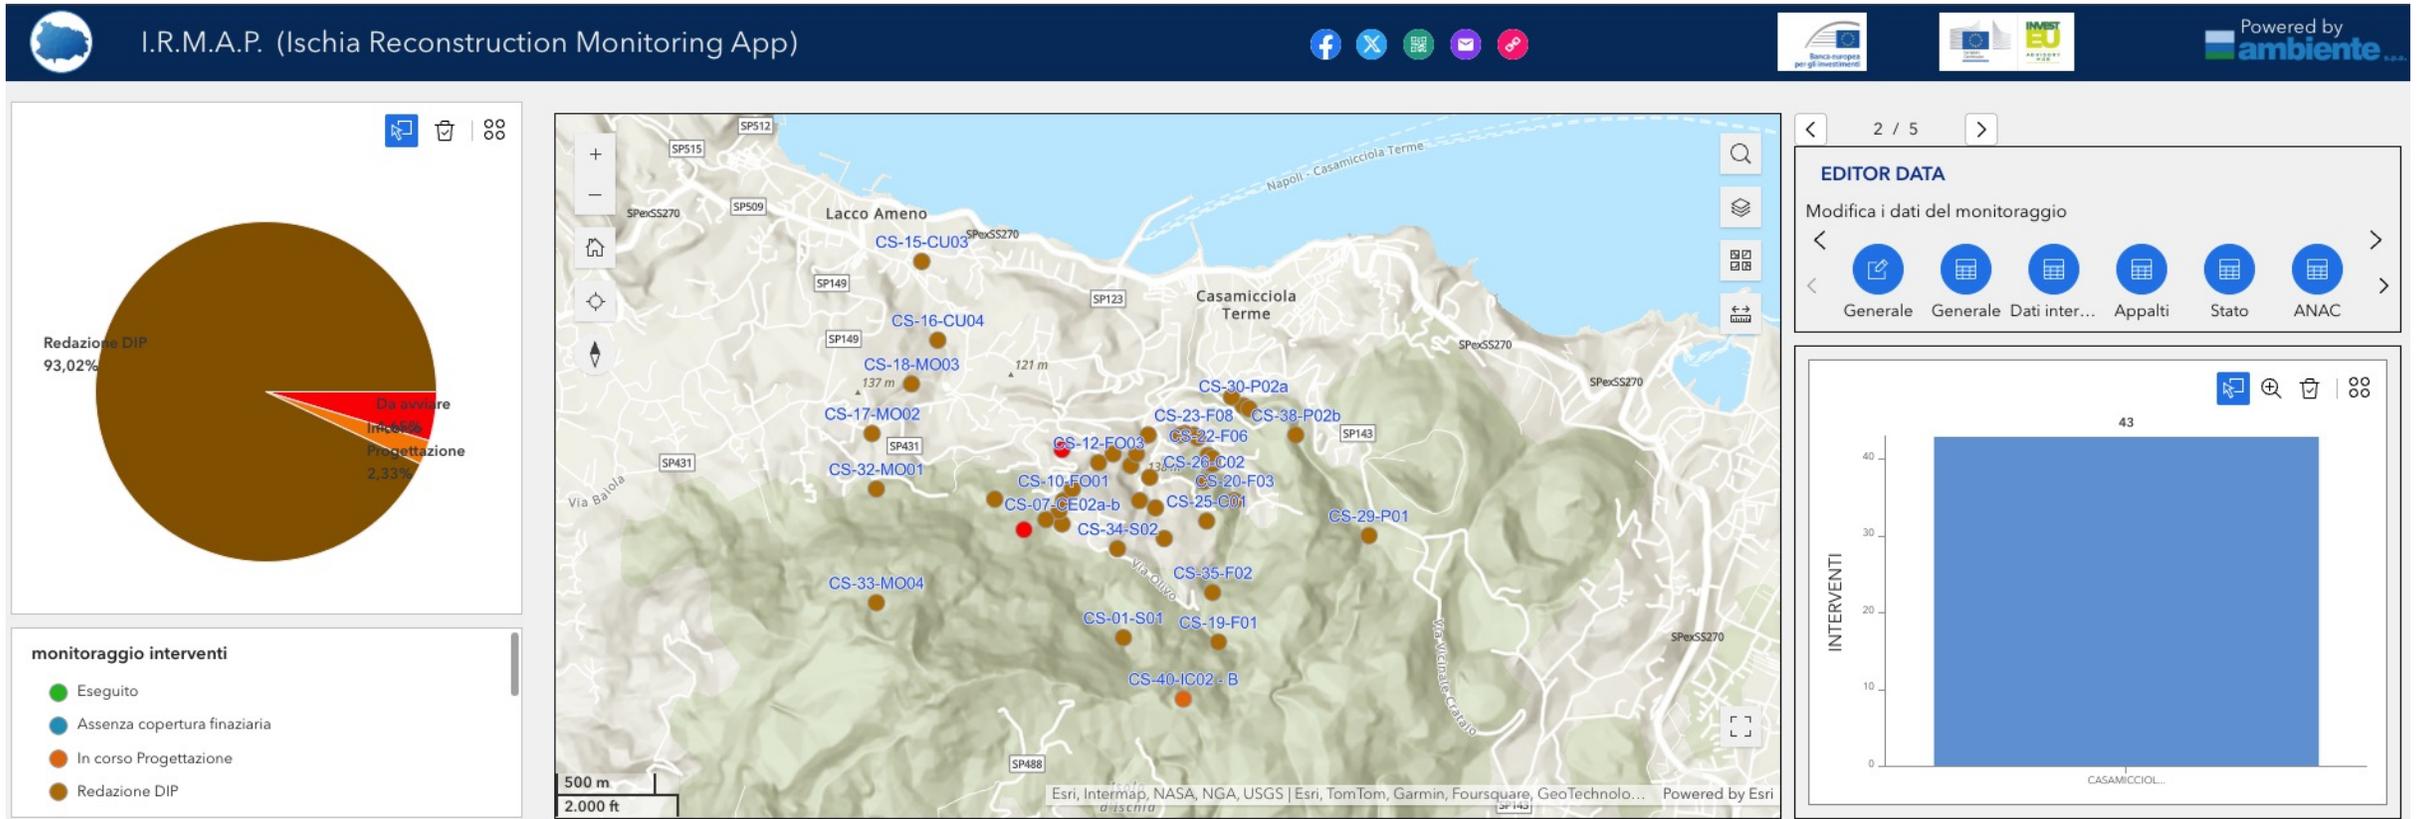

Per tali interventi, allo stato attuale è stato previsto il solo finanziamento, sulla base delle risorse disponibili, dei servizi di progettazione limitatamente alle indagini geologiche e alla redazione dei PFTE.

L'affidamento di tali servizi tecnici, il cui importo è stimato in **6.225.617,71 €**, sarà oggetto di procedure di affidamento nel corso del 2025. Per tutti gli interventi è stato redatto il DIP



Ordinanze Speciali n.4 e n.8

STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI NON FINANZIATI RICOMPRESI NELLA PROGRAMMAZIONE QUINQUENNALE

Comune di Casamicciola Terme (1/2)

LEGENDA			
	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		

	CODICE INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	Stato	IMPORTO FINANZIATO	NOTE	AVANZAMENTO %
1	CS-01-S01	Vasca di espansione di circa 5000 mc, pulizia biomassa ed eventuali disgaggi	DIP aggiornato	6.000.000,00 €	Inseriti in gara opera 2	2
2	CS-02-S03	Realizzazione briglie a pettine	DIP aggiornato	1.000.000,00 €		2
3	CS-03-S04	Realizzazione briglie, recupero briglie esistenti e briglia a gradoni	DIP aggiornato	7.000.000,00 €		2
4	CS-04-S05	Vasca di espansione con briglia selettiva	DIP aggiornato	1.000.000,00 €		2
5	CS-05-S06	Realizzazione vasca espansione con briglia selettiva e recupero briglie esistenti	DIP aggiornato	2.000.000,00 €		2
6	CS-08-CE02a-b	Intervento di riduzione del rischio da flussi detritici in località Celario	DIP aggiornato	9.000.000,00 €		2
7	CS-09-CE03	Inalveazione della cava a valle della località Celario fino all'incrocio con via Celario	DIP aggiornato	4.000.000,00 €		2
8	CS-10-FO01	Inalveazione della cava a valle dell'incrocio con via Celario	DIP aggiornato	3.000.000,00 €		2
9	CS-11-FO02	Realizzazione di una vasca di laminazione e di dissipazione nel tratto medio della cava Fontana	DIP aggiornato	4.000.000,00 €		2
10	CS-12-FO03	Sistemazione del collegamento idraulico tra la via Santa Barbara e la cava Fontana.	DIP aggiornato	2.000.000,00 €		2
11	CS-13-FO04	Ripristino e consolidamento delle briglie esistenti nella cava Fontana a monte dell'intersezione con la cava Sinigallia.	DIP aggiornato	4.000.000,00 €		2
12	CS-14-CU02	Interventi di mitigazione dell'impatto dei flussi detritici della cava Cuccufreddo.	DIP aggiornato	4.000.000,00 €	Inseriti in gara opera 1	2
13	CS-15-CU03	Miglioramento dell'efficienza idraulica del tratto tombato alla foce della cava Cuccufreddo	DIP aggiornato	2.000.000,00 €		2
14	CS-16-CU04	Sistemazione idraulica della cava Cuccufreddo a valle fino alla tombatura	DIP aggiornato	2.000.000,00 €		2
15	CS-17-MO02	Sistemazione idraulica della cava Del Monaco fino alla confluenza con la cava La Rita	DIP aggiornato	4.000.000,00 €		2
16	CS-18-MO03	Briglie aperte nel tratto della cava Del Monaco subito a monte della confluenza con la cava La Rita	DIP aggiornato	5.000.000,00 €		2
17	CD-CT-M005	Interventi per la riduzione del rischio da flussi detritici lungo gli alvei Monaco e La Rita	DIP aggiornato	14.500.000,00 €	2	
18	CS-19-F01	Intervento di rinforzo di circa 250 metri lungo l'asse longitudinale del fondo alveo; asportazione di circa 2000 mc di materiale, installazione di briglie.	DIP aggiornato	5.000.000,00 €	Inseriti in gara opera 3	2
19	CS-20-F03	Intervento di realizzazione briglie su circa 200 metri di alveo	DIP aggiornato	3.000.000,00 €		2
20	CS-21-F04	Realizzazione vasca di accumulo	DIP aggiornato	1.000.000,00 €		2
21	CS-22-F06	Pulizia alveo e realizzazione briglie; ripristino briglie esistenti qualora possibile	DIP aggiornato	3.000.000,00 €		2
22	CS-23-F08	Realizzazione vasca di accumulo	DIP aggiornato	1.000.000,00 €		2
23	CS-24-F09	Realizzazione barriera e soglie	DIP aggiornato	3.000.000,00 €		2
24	CS-25-C01	Ripristino terrazzamenti e regimentazione acque con briglie	DIP aggiornato	2.000.000,00 €		2
25	CS-26-C02	Realizzazione di briglia a pettine e interventi corticali	DIP aggiornato	1.000.000,00 €		2
26	CS-27-N01	Rifacimento briglia, rimozione materiale e sistemazioni	DIP aggiornato	2.000.000,00 €		2
27	CS-28-N02	Realizzazione gradonata, briglie, stabilizzazione versanti e pulizia biomassa con eventuali disgaggi	DIP aggiornato	6.000.000,00 €		2
28	CS-29-P01	Sistemazione del reticolo idraulico e vasca di espansione di circa 1000 mc	DIP aggiornato	3.000.000,00 €	Inseriti in gara opera 4	2
29	CS-30-P02a	Intervento con 10 soglie;	DIP aggiornato	3.000.000,00 €		2
30	CS-31-P03	Vasca con griglie a pettine sul lato di valle	DIP aggiornato	1.000.000,00 €		2



Ordinanze Speciali n.4 e n.8

STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI NON FINANZIATI RICOMPRESI NELLA PROGRAMMAZIONE QUINQUENNALE

Comune di Casamicciola Terme (2/2)


LEGENDA			
	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		

	CODICE INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	Stato	IMPORTO FINANZIATO	NOTE	AVANZAMENTO %
31	CS-32-MO01	Pulizia e ripristino delle briglie nel tratto montano della cava Del Monaco	DIP aggiornato	2.000.000,00 €	Inseriti in gara opera 5	2
32	CS-33-MO04	Sistemazione dei fossi minori presenti nel bacino della cava La Rita-Cuccufrippo-Del Monaco	DIP aggiornato	2.000.000,00 €		2
33	CS-34-S02	Stabilizzazione alveo e ripristino viabilità	DIP aggiornato	2.000.000,00 €	Inserito in gara opera 6	2
34	CS-35-F02	Intervento di rinforzo corticale con estensione di circa 100 metri di lunghezza e circa 50 metri di sviluppo di pendio, pulizia biomassa ed eventuali disaggi	DIP aggiornato	2.000.000,00 €	Inseriti in gara opera 7	2
35	CS-36-F07	Interventi di consolidamento di circa 4000 mq di pendio	DIP aggiornato	1.000.000,00 €		2
36	CS-37-F10	Pulizia alveo, rimozione materiale ed interventi di stabilizzazione pendii	DIP aggiornato	2.000.000,00 €		2
37	CS-38-P02b	Sistemi soil nailing con reti aderenti per i pendii maggiormente acclivi, rinverdimento incluso.	DIP aggiornato	2.000.000,00 €	Inserito in gara opera 8	2
38	CS-39-P02c	Intervento di rinforzo lungo circa 200 metri circa di fondo alveo e altezza di pendii fino a 20 metri comprensivo di pulizia biomassa e disaggi.	DIP aggiornato	2.000.000,00 €		2
39	CS-41-IC04	Regimazione del deflusso superficiale a monte del centro abitato	DIP aggiornato	2.000.000,00 €	Inserito in gara opera 9	2
40	CS-44-F05	Intervento di disaggio e trasporto della biomassa	DIP aggiornato	1.000.000,00 €	Inserito in gara opera 11	2
41	CS-40-IC02 - B	Sistemazione agronomico-forestale del tratto di cornice sommitale – SECONDA FASE	Redatto PGF – Piano Gestione Forestale	6.000.000,00 €		2
42	CS-43-CU01	Sistemazione e pulizia del tratto montano della cava Cuccufrippo	Da avviare	1.000.000,00 €	Affidamento diretto	0
43	CS-CT-2-019	Completamento risistemazione marciapiedi e parapetti via Santa Barbara e parcheggio Celario e risistemazione canalone di captazione delle acque meteoriche	Da avviare	1.400.000,00 €		0

Gli interventi in gara opera 1, opera 2 e opera 3 e l'intervento CS-40-IC02 – B sono oggetto della Convenzione con Invitalia SpA, che si occuperà dello svolgimento delle gare di affidamento dei servizi tecnici (Convenzione approvata con Decreto n.2508 del 22 luglio 2025)



Piano art. 5 ter d.l. 186/2022 - RICOGNIZIONE INTERVENTI STRUTTURALI da eseguire sul territorio degli altri Comuni dell'isola approvato con l'Ordinanza Speciale n.4 e n. 8

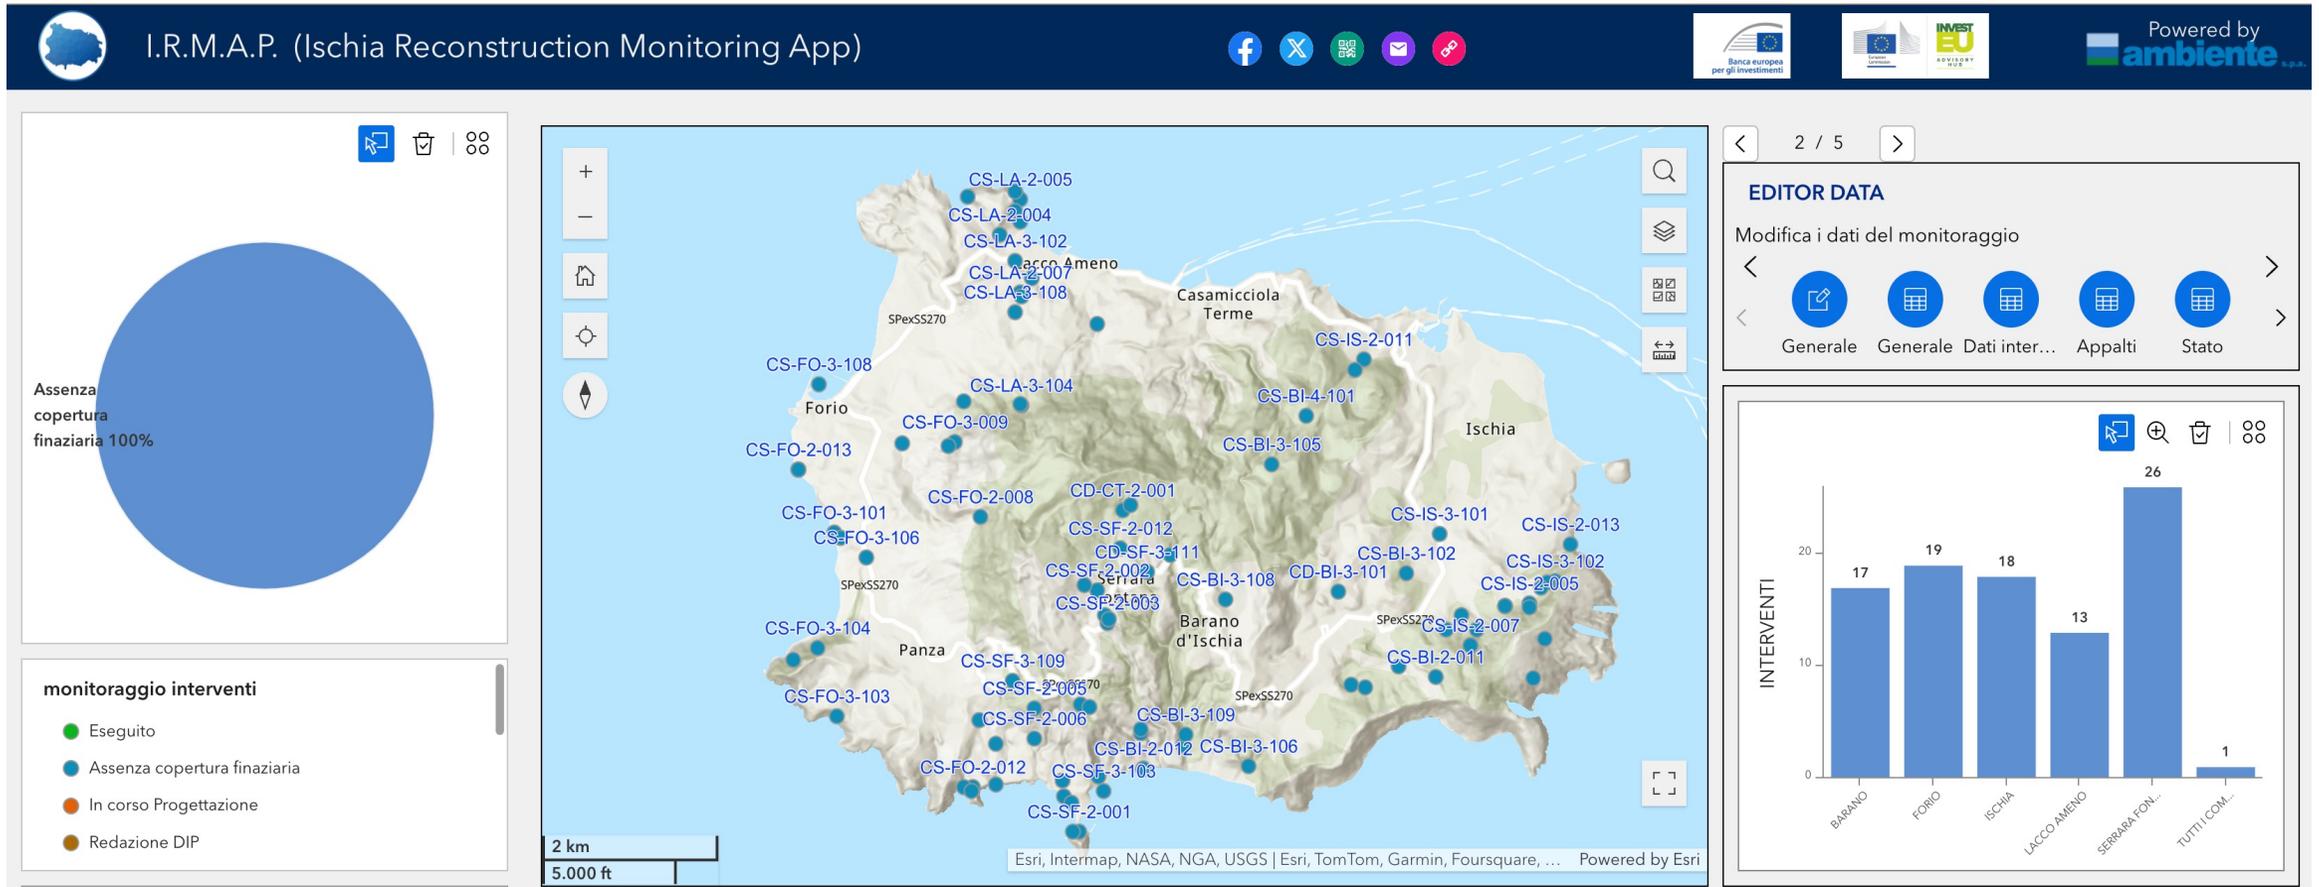

Con la Legge di Bilancio per il 2025, art. 1 comma 685, è stato disposto che il Commissario Straordinario provvede all'attuazione degli interventi di cui all'art. 5-ter del d.l. 186/2022 per tutti i comuni dell'isola di Ischia. Il piano è in corso di predisposizione, con il supporto delle Università e dei Centri di Competenza, analogamente a quanto già effettuato per il Comune di Casamicciola Terme.

ULTERIORI INTERVENTI DA ESEGUIRE SUL TERRITORIO DEGLI ALTRI COMUNI DELL'ISOLA E COMPRESI NEL PIANO APPROVATO CON L'ORDINANZA SPECIALE N.4 – AGGIORNAMENTO DI MARZO 2024

Tutti i comuni dell'isola

CODICE_INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Stato
CD-TC-2-001	Tutti i Comuni di Ischia	Interventi di messa in sicurezza dei sentieri sull'isola di Ischia danneggiati a seguito dell'alluvione del 26 novembre	600.000,00 €	Da finanziare

Comune di Lacco Ameno

CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Stato
CS-LA-2-004	Lacco Ameno	Completamento dell'intervento di messa in sicurezza e consolidamento del Costone incombente su via nuova Montevico	2.509.852,66 €	Da finanziare
CS-LA-2-005	Lacco Ameno	Completamento dell'intervento di messa in sicurezza e consolidamento del costone orientale di Montevico	3.665.910,96 €	Da finanziare
CS-LA-2-006	Lacco Ameno	Completamento delle opere di messa in sicurezza e consolidamento del costone settentrionale di Montevico	1.075.800,00 €	Da finanziare
CS-LA-2-007	Lacco Ameno	Completamento dell'intervento di messa in sicurezza e consolidamento del costone retrostante la tribuna del campo sportivo comunale	1.075.800,00 €	Da finanziare
CS-LA-2-008	Lacco Ameno	Completamento dell'intervento di messa in sicurezza e consolidamento del costone meridionale al campo sportivo comunale	492.500,00 €	Da finanziare
CS-LA-2-015	Lacco Ameno	Completamento dell'intervento di messa in sicurezza e consolidamento del costone incombente sulla spiaggia di Varuliello	885.000,00 €	Da finanziare
CS-LA-3-101	Lacco Ameno	Messa in sicurezza e consolidamento del costone incombente su via Cava Pannella	2.650.000,00 €	Da finanziare
CS-LA-3-102	Lacco Ameno	Messa in sicurezza e consolidamento del costone incombente su via Circumvallazione	1.570.000,00 €	Da finanziare
CS-LA-3-103	Lacco Ameno	Messa in sicurezza e consolidamento del costone incombente sulla spiaggia di Varulo	3.080.000,00 €	Da finanziare
CS-LA-3-104	Lacco Ameno	Messa in sicurezza e consolidamento di Cava Scialicco	9.400.000,00 €	Da finanziare
CS-LA-3-105	Lacco Ameno	Messa in sicurezza e consolidamento di Cava La Rita	5.600.000,00 €	Da finanziare
CS-LA-3-107	Lacco Ameno	Progettazione dell'intervento presso il costone di Montevico lato baia di san montano	2.013.220,28 €	Da finanziare

ULTERIORI INTERVENTI DA ESEGUIRE SUL TERRITORIO DEGLI ALTRI COMUNI DELL'ISOLA E COMPRESI NEL PIANO APPROVATO CON L'ORDINANZA SPECIALE N.4 – AGGIORNAMENTO DI MARZO 2024

Comune di Barano d'Ischia

CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Stato
CS-BI-2-011	Barano d'Ischia	Lavori per la messa in sicurezza dei costoni latitanti la strada pubblica di Via Schiappone (fase 2)	700.000,00 €	Da finanziare
CS-BI-2-012	Barano d'Ischia	I STRALCIO FUNZIONALE - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei costoni spiaggia dei Maronti	2.000.000,00 €	Da finanziare
CS-BI-2-013	Barano d'Ischia	Completamento dei lavori di Somma urgenza per il ripristio della funzionalità idraulica dell'Alveo Cava Zaffarano	2.205.000,00 €	Da finanziare
CS-BI-3-012	Barano d'Ischia	II STRALCIO FUNZIONALE - Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei costoni spiaggia dei Maronti	2.470.000,00 €	Da finanziare
CS-BI-3-102	Barano d'Ischia	Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo Rio Corbore, con pulizia del bacino idrico, posa di briglie e messa in sicurezza degli argini	991.666,67 €	Da finanziare
CS-BI-3-103	Barano d'Ischia	Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza dei costoni e ripristino della funzionalità idraulica Alveo Cava Ponte/Nitrodi/Olmitello	6.076.666,67 €	Da finanziare
CS-BI-3-104	Barano d'Ischia	Lavori di Somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica dell'Alveo Cava Rosato/ Cavone Martoccio	1.595.833,33 €	Da finanziare
CS-BI-3-105	Barano d'Ischia	Lavori di somma urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica dell'Alveo Piano San Paolo loc. Buceto	4.293.750,00 €	Da finanziare
CS-BI-3-106	Barano d'Ischia	Lavori di Somma Urgenza per la messa in sicurezza della scala di accesso alla Spiaggia dei Maronti	1.200.000,00 €	Da finanziare
CS-BI-3-108	Barano d'Ischia	lavori di ripristino della funzionalità idraulica e sistemazioni Alveo Cava Li Massi /Licciesi/Candiano	2.642.500,00 €	Da finanziare
CS-BI-3-109	Barano d'Ischia	lavori di ripristino della funzionalità idraulica e sistemazioni costoni laterali Alveo Cava San Pietro/Olmitello	885.000,00 €	Da finanziare
CS-BI-4-101	Barano d'Ischia	Sistemazione, opere di contenimento, ecc (Tra i comuni di Barano e Casamicciola)	1.000.000,00 €	Da finanziare
CS-BI-4-102	Barano d'Ischia	sistemazione, opere di contenimento, ecc	1.000.000,00 €	Da finanziare



ULTERIORI INTERVENTI DA ESEGUIRE SUL TERRITORIO DEGLI ALTRI COMUNI DELL'ISOLA E COMPRESI NEL PIANO APPROVATO CON L'ORDINANZA SPECIALE N.4 – AGGIORNAMENTO DI MARZO 2024

Comune di Forio

CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Stato
CS-FO-2-008	Forio	CONSOLIDAMENTO VERSANTI INCOMBENTI SULLA LOCALITA' CORBARO	3.500.000,00 €	Da finanziare
CS-FO-2-012	Forio	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA ALVEO PUNTA CHIARITO SOTTOSTANTE ALL'AREA ARCHEOLOGICA	2.542.400,00 €	Da finanziare
CS-FO-2-013	Forio	MESSA IN SICUREZZA COSTONE E STRADA SOVRASTANTE - stralcio funzionale 1	5.000.000,00 €	Da finanziare
CS-FO-3-006	Forio	sistemazione idrogeologica del reticolo idrografico afferente il bacino pennanova-stennechia	5.500.000,00 €	Da finanziare
CS-FO-3-007	Forio	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO AFFERENTE IL BACINO CAVA SCIALICCO	3.000.000,00 €	Da finanziare
CS-FO-3-009	Forio	MESSA IN SICUREZZA DEI VERSANTI MONTENUOVO E CHIGNOLE INCOMBENTI SULL'ABITATO MONTERONE	5.000.000,00 €	Da finanziare
CS-FO-3-010	Forio	SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL RETICOLO IDROGRAFICO AFFERENTE IL BACINO PIELLERO -CAVA CAMPO	4.000.000,00 €	Da finanziare
CS-FO-3-014	Forio	MESSA IN SICUREZZA COSTONE E STRADA SOVRASTANTE - stralcio funzionale 2	13.000.000,00 €	Da finanziare
CS-FO-3-101	Forio	MESSA IN SICUREZZA COSTONI	1.200.000,00 €	Da finanziare
CS-FO-3-101	Forio	Località pietre Rosse- Costone sottostante parcheggio omino ed incombente parzialmente sulla spiaggia Cava dell'Isola	2.500.000,00 €	Da finanziare
CS-FO-3-102	Forio	Località Sorgeto - Costoni incombenti omonima baia	3.000.000,00 €	Da finanziare
CS-FO-3-103	Forio	Località Pomicione- Costone sottostante via Belvedere	2.500.000,00 €	Da finanziare
CS-FO-3-104	Forio	Località Punta imperatore - ratto di costone sottostante Via Costa	1.000.000,00 €	Da finanziare
CS-FO-3-105	Forio	Località Citara - tratto via Mazzella ricompreso tra piazzale Pietre Rosse ed incrocio ss270 - muro di sostegno della sede stradale	800.000,00 €	Da finanziare
CS-FO-3-106	Forio	Dissesti diffusi ss270 e del sistema viario comunale	1.500.000,00 €	Da finanziare
CS-FO-3-107	Forio	Opere di Consolidamento e barriera paramassi costoni incombenti baia di Sorgeto	700.000,00 €	Da finanziare
CS-FO-3-108	Forio	Dragaggio Porto di Forio	500.000,00 €	Da finanziare
CS-FO-3-109	Forio	Consolidamento costone punta Imperatore	350.000,00 €	Da finanziare

ULTERIORI INTERVENTI DA ESEGUIRE SUL TERRITORIO DEGLI ALTRI COMUNI DELL'ISOLA E COMPRESI NEL PIANO APPROVATO CON L'ORDINANZA SPECIALE N.4 – AGGIORNAMENTO DI MARZO 2024

Comune di Ischia

CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO_INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Stato
CS-IS-2-005	Ischia	Realizzazione di muro di contenimento con fondazione in cls	848.000,00 €	Da finanziare
CS-IS-2-007	Ischia	II STRALCIO FUNZIONALE - Verifica della stabilità del costone, indagini e rilievi. lavori di decespugliamento e taglio arbusti. Opere di mitigazione del rischio idrogeologico mediante:	7.000.000,00 €	Da finanziare
CS-IS-2-008	Ischia	Verifica della stabilità del costone e lavori di decespugliamento e taglio arbusti e intervento di contenimento del costone mediante geostuoia e rete armata a doppia torsione ancorata	1.700.000,00 €	Da finanziare
CS-IS-2-009	Ischia	Lavori di manutenzione straordinaria alvei presenti sul territorio comunale: alvei ubicati presso TRAVERSA VIA ARENELLA / VIA TIRABELLA	960.000,00 €	Da finanziare
CS-IS-2-011	Ischia	Lavori di manutenzione straordinaria alvei presenti sul territorio comunale: alveo ubicato presso VIA CRETAIO	2.220.000,00 €	Da finanziare
CS-IS-2-012	Ischia	Lavori di manutenzione straordinaria alvei presenti sul territorio comunale: alveo ubicato presso ZONA PIANO LIGUORI (VIA CARAUCIO)	1.650.000,00 €	Da finanziare
CS-IS-2-013	Ischia	Lavori di manutenzione straordinaria alvei presenti sul territorio comunale: alveo ubicato presso CAVONE VIA CAMPAGNANO - SPIAGGIA CARTAROMANA	2.540.000,00 €	Da finanziare
CS-IS-3-007	Ischia	II STRALCIO FUNZIONALE - Verifica della stabilità del costone, indagini e rilievi. lavori di decespugliamento e taglio arbusti. Opere di mitigazione del rischio idrogeologico mediante:	7.500.000,00 €	Da finanziare
CS-IS-3-101	Ischia	LAVORI URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE FOGNARIA DI VIA ARENELLA IN LOCALITÀ PILASTRI DEL COMUNE DI ISCHIA (NA)	600.000,00 €	Da finanziare
CS-IS-3-101	Ischia	Verifica della stabilità del costone e lavori di decespugliamento e taglio arbusti e intervento di contenimento del terrapieno mediante geostuoia e rete armata a doppia torsione ancorata	1.600.000,00 €	Da finanziare
CS-IS-3-102	Ischia	Verifica della stabilità del costone ed Interventi di mitigazione del rischio frana mediante realizzazione di rinforzo corticale con applicazione rete paramassi ed opere di captazione e convogliamento delle acque meteoriche	3.000.000,00 €	Da finanziare
CS-IS-3-102	Ischia	Lavori urgenti per la sistemazione idrogeologica di via TIRABELLA in l.tà pilastri	600.000,00 €	Da finanziare
CS-IS-3-103	Ischia	MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE OPERE DI SOSTEGNO, INTERVENTI DI DISGAGGIO E RETE PARAMASSI SUL COSTONE E CUNETTA IN PIETrame PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE SUPERFICIALI - LOCALITA' PIANO LIGUORI NEL COMUNE DI ISCHIA.	1.000.000,00 €	Da finanziare
CS-IS-3-103	Ischia	Sistemazione idrogeologica (if11) nel comune di Ischia -bordo settentrionale dell'alto morfologico denominato "TORONE - II LOTTO	3.271.519,00 €	Da finanziare
CS-IS-3-104	Ischia	MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO MEDIANTE OPERE DI SOSTEGNO, INTERVENTI DI DISGAGGIO E RETE PARAMASSI SUL COSTONE E CUNETTA IN PIETrame PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE SUPERFICIALI - LOCALITA' PIANO LIGUORI NEL COMUNE DI ISCHIA.	1.000.000,00 €	Da finanziare
CS-IS-3-105	Ischia	Mitigazione rischio idrogeologico mediante realizzazione di muro di sostegno in c.a., tiranti di ancoraggio, interventi di disgaggio e rete paramassi sul costone VIA QUERCIA".	2.620.000,00 €	Da finanziare
CS-IS-3-106	Ischia	Lavori di Regimentazione delle acque nella zona di via Campagnano "STRADA VICINALE DI CARTA ROMANA"	2.000.000,00 €	Da finanziare
CS-IS-3-107	Ischia	Realizzazione di n.19 alloggi di edilizia residenziale pubblica in località Campagnano (Ischia).	3.800.000,00 €	Da finanziare

ULTERIORI INTERVENTI DA ESEGUIRE SUL TERRITORIO DEGLI ALTRI COMUNI DELL'ISOLA E COMPRESI NEL PIANO APPROVATO CON L'ORDINANZA SPECIALE N.4 – AGGIORNAMENTO DI MARZO 2024

Comune di Serrara Fontana

CODICE INTERVENTO	COMUNE	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO INTERVENTO	Stato
CD-SF-3-110	Serrara Fontana	Realizzazione di muri di contenimento alla base dei costoni e sovrastante applicazione di rete paramassi con geostuoia sulla parte superiore fino alla sommità del crinale.	1.700.000,00 €	Da finanziare
CD-SF-3-112	Serrara Fontana	sistemazione / realizzazione opere di contenimento, rafforzamento corticale	1.500.000,00 €	Da finanziare
CD-SF-4-101	Serrara Fontana	sistemazione, opere di contenimento, ecc	400.000,00 €	Da finanziare
CD-SF-4-103	Serrara Fontana	sistemazione, opere di contenimento, ecc	3.500.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-2-001	Serrara Fontana	Opere di contenimento del costone con applicazioni di reti paramassi con ancoraggi con profondità media, compresa applicazione di geostuoia ed utilizzo di elicottero per collocazione delle reti in sommità al costone.	1.105.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-2-002	Serrara Fontana	Realizzazioni di pareti di contenimento spondale in cls armato e rivestimento murario con pietre locali; applicazione di reti paramassi con relativa geostuoia per successivo inverdimento, lungo tutto il tratto e nelle due diramazioni .	2.430.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-2-003	Serrara Fontana	Realizzazione di tratti di muri di contenimento spondali, realizzazione di micropali a consolidamento di tratti viari e di costoni, installazione di reti paramassi.	3.500.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-2-004	Serrara Fontana	Lavori di manutenzione straordinaria, opere di regimentazione delle acque, completo ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo	2.000.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-2-005	Serrara Fontana	Realizzazione di muri di contenimento alla base dei costoni e sovrastante applicazione di rete paramassi con geostuoia sulla parte superiore fino alla sommità del crinale.	1.510.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-2-006	Serrara Fontana	Lavori di manutenzione straordinaria, opere di regimentazione delle acque, completo ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo	300.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-2-007	Serrara Fontana	Lavori di manutenzione straordinaria, opere di regimentazione delle acque, completo ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo	800.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-2-008	Serrara Fontana	Lavori di manutenzione straordinaria, opere di regimentazione delle acque, completo ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo.	700.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-2-009	Serrara Fontana	Lavori di manutenzione straordinaria, opere di regimentazione delle acque, completo ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo.	1.500.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-2-010	Serrara Fontana	Lavori di manutenzione straordinaria, opere di regimentazione delle acque, completo ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo.	2.500.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-2-011	Serrara Fontana	Realizzazione di muretti spondali, installazione di reti paramassi con chiodature profonde e non, applicazione di geostuoia per successivo inverdimento. Sottostante l'abitato di via Iesca.	2.500.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-2-012	Serrara Fontana	Realizzazione di reti paramassi con geostuoia per successivo rinverdimento, con realizzazione di parte dei muretti spondali alla base per evitare fenomeni di scavo per ruscellamento.	450.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-3-101	Serrara Fontana	Realizzazione di opere di contenimento a protezione del piede del costone da fenomeni erosivi alla base, installazione di reti paramassi con geostuoia e chiodatura profonda.	3.000.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-3-102	Serrara Fontana	Realizzazione di muri in cls armato e rivestimento in pietra a consolidamento del terreno, installazione di rete paramassi e geostuoia per alcuni tratti e realizzazione di palificata a sostegno del primo tratto di strada	2.000.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-3-103	Serrara Fontana	Consolidamento dei costoni con reti paramassi e realizzazione di scogliere per la difesa delle coste	7.000.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-3-104	Serrara Fontana	Installazione di reti paramassi con chiodature profonde ed applicazione di geostuoia per successivo rinverdimento. Tratto di costone a sostegno di via Quadro.	1.500.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-3-105	Serrara Fontana	Realizzazione di palificata in cls armato a sostegno di muro di contenimento in cls armato e rivestimento in pietra locale; applicazione di rete paramassi e geostuoia. Località Cavamare.	405.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-3-106	Serrara Fontana	Recupero della banchina esistente fortemente danneggiata, mediante realizzazione di palificata, riempimento e ripavimentazione	250.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-3-107	Serrara Fontana	Realizzazione di muri in pietra spondali a contenimento dei piccoli costoni presenti, realizzazione di briglie lungo il percorso e di viminate a contenimento dei piccoli dislivelli presenti.	1.750.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-3-108	Serrara Fontana	Realizzazione di muri in pietra spondali a contenimento dei piccoli costoni presenti, realizzazione di briglie lungo il percorso e di viminate a contenimento dei piccoli dislivelli presenti.	3.500.000,00 €	Da finanziare
CS-SF-3-109	Serrara Fontana	Lavori di manutenzione straordinaria, opere di regimentazione delle acque, completo ripristino della funzionalità idraulica dell'alveo.	1.500.000,00 €	Da finanziare

RICOSTRUZIONE PUBBLICA POST SISMA

L'evento sismico del **21 agosto 2017** ha causato ingenti danni al patrimonio edilizio pubblico del territorio comunale di **Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio**.

L' art. 26 comma 1 del d.l. 109/2018 prevede che, a seguito della ricognizione dei fabbisogni da parte del Commissario straordinario, si provveda al *“finanziamento per la demolizione e ricostruzione, la riparazione e il ripristino degli edifici pubblici, delle chiese e degli edifici di culto, per gli interventi volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici, e delle infrastrutture, nonché per gli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che devono prevedere anche opere di miglioramento sismico finalizzate ad accrescere in maniera sostanziale la capacità di resistenza delle strutture”*.

Al comma 2 dell'art. 26, è disposto che, per dare attuazione alla programmazione degli interventi, si provvede a predisporre ed approvare un piano delle opere pubbliche, delle scuole e degli edifici di culto, che quantifichi il danno e ne preveda il finanziamento in base alle risorse rese disponibili. Con riferimento alla ricostruzione pubblica, sulla base delle esigenze rappresentate dai “Soggetti Attuatori” individuati nei Comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, nonché nella Città Metropolitana, nella Regione Campania, nella Diocesi di Ischia e nella Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, **con le Ordinanze Commissariali n. 6, 9, e 14** dell'allora nominato Commissario Straordinario, sono stati approvati i primi stralci dei Piani per l'edilizia scolastica, e per le Opere Pubbliche.



PROGRAMMAZIONE E FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA POST SISMA

- L'**Ordinanza speciale 1** approva il Piano degli interventi di recupero degli edifici ubicati nel comune di Casamicciola Terme nel limite massimo di **€ 45.897.264,22**, individuando e approvando come urgenti e di particolare criticità **10** interventi.
- L'**Ordinanza speciale 2** approva il Piano degli interventi di recupero degli edifici ubicati nel comune di Lacco Ameno nel limite massimo di **€ 31.723.981,50**, individuando **6** interventi.
- L'**Ordinanza speciale 3** approva il Piano degli interventi per il Comune di Forio, per un importo di **€ 10.641.354,63**, individuando **3** opere.
- Con l'**Ordinanza speciale 5** del 08/08/2023 e con **Ordinanza Speciale 7** sono stati approvati ulteriori interventi nel comune di Casamicciola Terme e nel comune di Forio
- Con l'**Ordinanza Speciale 11** è stato rimodulato il piano delle opere previste nel comune di Casamicciola Terme, disciplinando gli interventi di ricostruzione e delocalizzazione post sisma e post frana mediante la rigenerazione urbana del complesso immobiliare di rilevante valore storico e culturale di proprietà dell'Ente morale Pio Monte della Misericordia, l'allocazione ottimale all'interno del medesimo complesso delle funzioni scolastiche nel Comune di Casamicciola Terme, la realizzazione di unità immobiliari abitative, da destinare alle famiglie soggette a delocalizzazione obbligatoria, nell'attuale area di sedime dell'istituto scolastico IBSEN, senza nuovo consumo di suolo, il recupero della fonte termale del Gurgitello da parte dell'Ente morale Pio Monte della Misericordia e la fruizione comune delle acque termali.

Oltre ai **32 interventi** individuati nelle **ordinanze speciali 1, 2, 3, 7, 11**, permane la previsione di **10 opere** non contemplate nelle stesse, ma ricomprese nei programmi elaborati dal precedente Commissario con le **ordinanze n. 9, 11 e 14**.



ISTITUZIONE DI UN FONDO PER LE DEMOLIZIONI E LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI

- Con l'**Ordinanza Speciale 5** è stata anche disposta l'istituzione di un "fondo per le demolizioni e la messa in sicurezza degli edifici" colpiti dal sisma e dalla frana e per il recupero o lo smaltimento delle relative macerie, con una dotazione finanziaria inizialmente pari a 3 milioni, successivamente incrementata di ulteriori € **4.000.000,00** con l'**Ordinanza Speciale 9**.
- Con **Ordinanza speciale 8** è stato approvato il piano generale di demolizione pubblica dei fabbricati, suddiviso per lotti omogenei di intervento, individuati di concerto con i Comuni interessati, tenendo conto dei fabbricati:
 - che in ragione dello stato di danno non possano essere recuperati tramite intervento di riparazione;
 - che, indipendentemente dall'ambito in cui sono situati, costituiscano pericolo per la pubblica e privata incolumità ovvero impediscano il normale esercizio dei diritti connessi alla ricostruzione privata o pubblica;
 - per i quali non sia economicamente vantaggioso, in termini di spesa pubblica, provvedere alla messa in sicurezza.

PROGRAMMAZIONE INTERVENTI EDIFICI DI CULTO POST SISMA

Con **Ordinanza Speciale 6 del 24 dicembre 2024** è stato approvato il nuovo piano per la ricostruzione, la riparazione e il ripristino delle **chiese e degli edifici di culto** danneggiati dagli eventi sismici con la quale si prevede:

- il finanziamento di **5** chiese già previste dall'ordinanza n. 15 del 2021;
- **9** interventi confermati nel programma già previsto dall'ordinanza n. 15 del 2021;
- **3** interventi aggiuntivi, inseriti nella programmazione e non previsti nell'ordinanza n. 15 del 2021.




INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA POST SISMA

Ord. Speciali n. 1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 8 - 11 STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI



I.R.M.A.P. (Ischia Reconstruction Monitoring App)

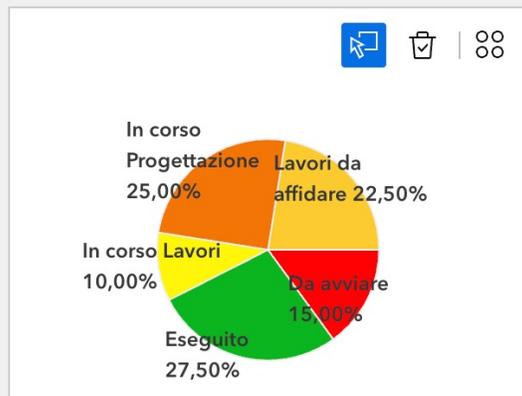


monitoraggio interventi

- Eseguito
- Assenza di copertura finanziaria
- In corso Progettazione
- Redazione DIP

COMMISSARIO

Commissario Delegato

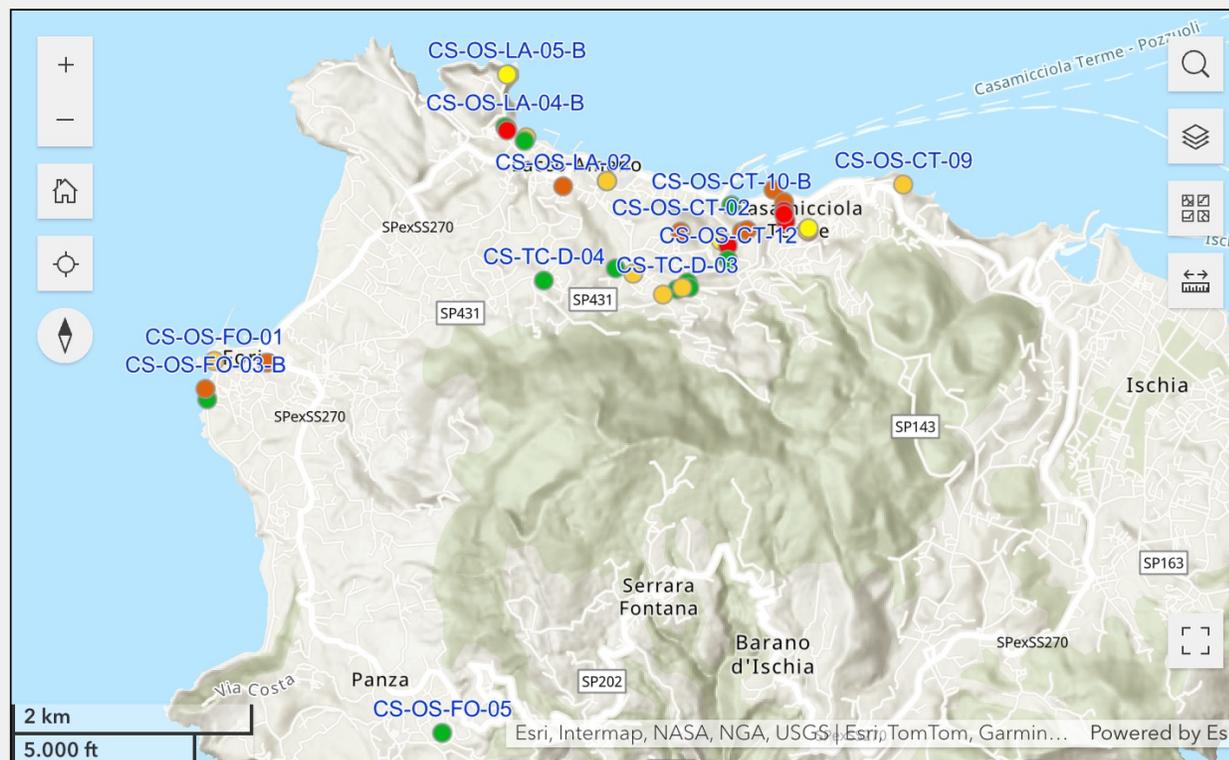


2 / 5

EDITOR DATA

Modifica i dati del monitoraggio

- Generale
- Generale
- Dati inter...
- Appalti

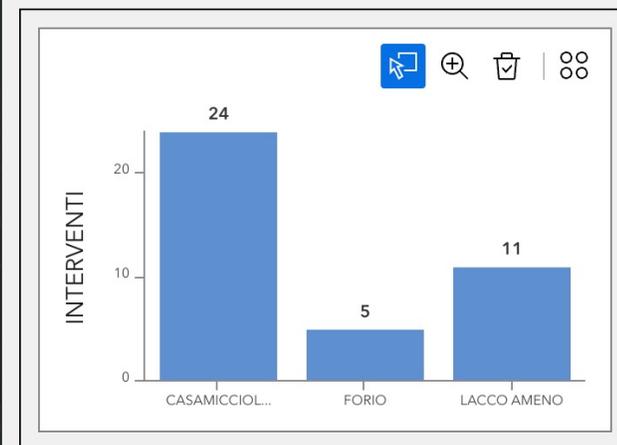

INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA POST- SISMA

Ord. Speciali n. 1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 8 - 11 Comune di Casamicciola Terme

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		

CODICE INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	AVANZAMENTO %	NOTE – CRITICITA'
CS-OS-CT-01	Edificio Casa Comunale denominato "Palazzo Bellavista o Napoleon" - Miglioramento / adeguamento sismico, efficientamento termico ed adeguamento funzionale.	Comune di Casamicciola Terme	In corso Progettazione	5.359.768,47 €	10	CSS sul progetto esecutivo svolta il giorno 6 giugno. Trasmesse integrazioni e richiesta convocazione nuova seduta
CS-OS-CT-02	Lavori di miglioramento/adeguamento sismico, ripristino e riqualificazione dell'ex Osservatorio Geodinamico, già sede del museo civico e della piazzola antistante	Comune di Casamicciola Terme	In corso Progettazione	3.195.409,42 €	10	CSS sul progetto definitivo svolta il giorno 6 giugno. Presentate le integrazioni. Nuova CSS svolta il 24 luglio. La soprintendenza ha rilasciato parere favorevole con prescrizioni che saranno recepite nel PE. In attesa del PE.
CS-OS-CT-03	Consolidamento del versante sito in località Piccola Sentinella di interazione geologico-tecnica con l'area su cui è ubicato l'edificio scolastico Ibsen.	UTA	In corso Progettazione	1.968.118,40 €	5	Stanno affidando la pulizia del costone. Devono essere eseguite le indagini e il rilievo. Deve essere ancora avviata la progettazione
CS-OS-CT-04	Miglioramento/adeguamento sismico e adeguamento funzionale del Plesso Scolastico Sanseverino con abbattimento e ricostruzione.	Comune di Casamicciola Terme	In corso Lavori	1.927.252,80 €	40	E' stata predisposta la variante ed è stata trasmessa con richiesta di maggioranza degli importi (+ € 150.000). Devono essere trasmesse integrazioni.



INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE PUBBLICA POST- SISMA

Ord. Speciali n. 1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 8 – 11 Comune di Casamicciola Terme

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		

CODICE INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	AVANZAMENTO %	NOTE – CRITICITA'
CS-OS-CT-05	Intervento di miglioramento/adequamento sismico e adeguamento funzionale del Plesso Scolastico A. Manzoni.	Comune di Casamicciola Terme	Lavori da affidare	4.584.183,07 €	10	Progetto esecutivo approvato in CSS con determinazione dirigenziale n. 816 del 16/07/2025. Decreto di concessione 2624 del 5 agosto 2025. (€ 4.584.183,07)
CS-OS-CT-06	Lavori di Miglioramento / adeguamento sismico e adeguamento con abbattimento e ricostruzione del plesso scolastico Lembo	Comune di Casamicciola Terme	In corso lavori	4.428.999,92 €	30	Hanno concluso la demolizione della scuola
CS-OS-CT-07	Consolidamento del versante denominato Collinetta Paradisiello di interazione geologico-tecnica con le aree di sedime degli interventi Palazzo Bellavista (Napoleon), Plesso Scolastico Manzoni e Plesso scolastico San Severino.	UTA	In corso Progettazione	5.239.280,00 €	5	Sono in Corso di affidamento I servizi di ingegneria e architettura. In corso di stipula contratto.
CS-OS-CT-09	Lavori di messa in sicurezza e ripristino del Cimitero Monumentale, nonché adeguamento sismico e messa in sicurezza del muro di cinta su via Vicinale Bagnitiello	Comune di Casamicciola Terme	Lavori affidati	1.082.058,70 €	10	Lavori affidati. Lavori inizieranno a settembre



STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI POST- SISMA (Ord. Spec. n. 1 – 2 – 3 – 5 – 7 -11)

Comune di Casamicciola Terme

LEGENDA			
	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		

CODICE INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	AVANZAMENTO %	NOTE -CRITICITA'
CS-OS-CT-10 A	STRALCIO 1: DEMOLIZIONE Edificio in via Marina n.13 adibito a sede provvisoria della Casa Comunale denominato "ex Capricho" - Lavori di adeguamento, ripristino e riqualificazione del fabbricato	Comune di Casamicciola Terme	Eseguito	920.858,85 €	100	
CS-OS-CT-10 B	STRALCIO 2: RICOSTRUZIONE- Edificio in via Marina n.13 adibito a sede provvisoria della Casa Comunale denominato "ex Capricho"- Lavori di adeguamento, ripristino e riqualificazione del fabbricato	Comune di Casamicciola Terme	Da avviare	2.218.562,72 €	0	La ricostruzione dei volumi dovrà essere progettata conformemente alle indicazioni del Piano di Ricostruzione
CS-OS-CT-11	REALIZZAZIONE A MARE DELL'ESTENSIONE DELL'ALVEO TOMBATO DENOMINATO "PIO MONTE DELLA MISERICORDIA" CON RELATIVI ADEGUAMENTI URBANISTICI (WATERFRONT) – 3° LOTTO (il primo e il secondo lotto sono finanziati con il Poiano Fanghi e dello stato di attuazione si da atto nella relativa tabella)	Comune di Casamicciola Terme	In corso Progettazione	3.544.564,25 €	5	Consegnato progetto strutturale della palificata di sostegno.
CS-OS-CT-12	Ripristino del sistema fognario di via De Rivaz	Comune di Casamicciola Terme	Eseguito	545.095,20 €	100	



STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI POST- SISMA (Ord. Spec. n. 1 – 2 – 3 – 5 – 7 -11) Comune di Casamicciola Terme

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		

CODICE INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	AVANZAMENTO %	NOTE - CRITICITA'
CS-OS-CT-13	Progettazione e Studi di Fattibilità Tecnica e Economica per recupero e rifunzionalizzazione del complesso Pio Monte della Misericordia nonché per Demolizione e ricostruzione abitazioni nell'area ex IBSEN	Agenzia del Demanio	In corso Progettazione	4.521.026,70 €	0	Oneri finanziari a carico dell'Agenzia del Demanio Art.1 comm.162 e ss. L. 30/12/2018 n.145
CS-OS-CT-08	Demolizione del Plesso Scolastico Ibsen	Commissario Straordinario	Da avviare	1.070.941,00 €	0	L'intervento sarà di sola demolizione per un importo pari a € 1.070.941. La progettazione della demolizione è in corso di espletamento da parte dell'Agenzia del Demanio.
CS-OS-CT-14	Messa in sicurezza delle strutture, valorizzazione dell'area esterna, cantierizzazione del complesso immobiliare del Pio Monte della Misericordia	Comune di Casamicciola Terme	Da Avviare	420.000,00 €	0	
CS-OS-CT-15	Riallocazione di funzioni scolastiche del complesso immobiliare del Pio Monte della Misericordia - LOTTO 1	Da assegnare	Da Avviare	9.000.000,00 €	0	
CS-OS-CT-16	Riallocazione di funzionalità scolastiche nel complesso immobiliare del Pio Monte della Misericordia - LOTTO 2	Da assegnare	Da Avviare	1.973.478,08 €	0	



STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI POST- SISMA (Ord. Spec. n. 3 – 5 – 7)

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		

Comune di Forio

CODICE INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	AVANZAMENTO %	NOTE – CRITICITA'
CS-OS-FO-01	Lavori di miglioramento sismico e funzionale del Palazzo municipale di Forio (NA), ex convento di San Francesco.	Comune di Forio	Lavori da affidare	2.200.000,00 €	10	Si è svolta la CSS. In corso di pubblicazione Bando per Appalto integrato
CS-OS-FO-03-A	Lavori di messa in sicurezza del tratto di costa a rischio idrogeologico, compresa tra il Promontorio del Soccorso e la località Pietre Rosse - 1° Lotto - 2° Stralcio - Lavori di somma urgenza (il primo stralcio, già eseguito, è stato finanziato nell'ambito del piano degli interventi OCDPC 948/2022)	Comune di Forio	Eseguito	536.000,00 €	100	
CS-OS-FO-03-B	Lavori di messa in sicurezza del tratto di costa a rischio idrogeologico, compresa tra il Promontorio del Soccorso e la località Pietre Rosse - 1° Lotto – 3° stralcio	Comune di Forio	PFTE approvato e in corso Verifica di assoggettabilità a VIA	6.585.196,25 €	10	Va riproposta alla regione una valutazione di assoggettabilità VIA (entro la fine di agosto). La seconda parte è soggetta a PAUR. si procederà poi con l'appalto integrato.
CS-OS-FO-04	Lavori di miglioramento sismico del Plesso Scolastico Istituto Nautico "Cristoforo Mennella"	Comune di Forio	In corso Progettazione	1.320.158,38 €	5	PFTE (di livello avanzato) in commissione paesaggio. È stata presentata richiesta di parere alla Soprintendenza e sono decorsi i termini. Si prevede l'affidamento dei lavori per il mese di settembre
CS-OS-FO-05	Progetto di adeguamento funzionale della palestra della scuola media in via parroco Leonardo D'Abundo per realizzazione aule scolastiche provvisorie	Comune di Forio	Concluso	489.864,2 €	100	



STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI POST- SISMA (Ord. Spec. n. 1 – 2 – 3 – 5 – 7 -11) Comune di Lacco Ameno

LEGENDA			
	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		

CODICE INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	AVANZAMENTO %	NOTE – CRITICITA'
CS-OS-LA-01	Intervento di demolizione e ricostruzione della scuola media comunale Istituto Mennella danneggiata dal sisma.	Comune di Lacco Ameno	Lavori affidati	5.113.147,24 €	10	Lavori aggiudicati. I lavori inizieranno nel mese di settembre
CS-OS-LA-02	Intervento di miglioramento/adeguamento sismico dell'edificio scolastico Liceo scientifico G. Buchner di via Provinciale (ex Liceo scientifico Einstein)	Comune di Lacco Ameno	In corso Progettazione	4.600.000,00 €	5	In corso progettazione PFTE. E' stata trasmessa al tavolo tecnico la seconda opzione presentata dal progettista. Il 29 luglio si è tenuto il tavolo tecnico con il Comune, Città Metropolitana e il progettista durante il quale si è espressa la volontà di portare avanti la seconda opzione.
CS-OS-LA-03A	Progettazione, lavori, fornitura, trasporto e posa in opera di moduli definitivi ad uso scolastico provvisorio (MODUSP), nonché recupero per finalità scolastiche provvisorie di un immobile esistente sullo stesso sito.	Agenzia del Demanio	Lavori in corso di affidamento	6.098.000,00 €	5	In corso gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e dei lavori (Appalto integrato)
CS-OS-LA-03B	Sottoservizi relativi ai moduli definitivi ad uso scolastico provvisorio MODUSP	Comune di Lacco Ameno	Lavori affidati	560.000,00 €	5	Affidati. Città Metropolitana richiede polizza fidejussoria. Problema con Città Metropolitana su occupazione di suolo pubblico permanente
CS-OS-LA-04-A	SERVIZI TECNICI riguardanti Intervento di miglioramento/adeguamento sismico della sede comunale, dei locali della diocesi e dell'area archeologica di Santa Restituta, colpiti dal sisma.	Agenzia del Demanio	Progettazione in corso di affidamento	1.738.197,21 €	50	In corso manifestazione di interesse per l'affidamento della progettazione.

STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI POST- SISMA (Ord. Spec. n. 1 – 2 – 3 – 5 – 7 -11) Comune di Lacco Ameno

LEGENDA			
	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		

CODICE INTERVENTO	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	AVANZAMENTO %	NOTE – CRITICITA'
CS-OS-LA-04-B	Intervento di miglioramento/adeguamento sismico della sede comunale, dei locali della diocesi e dell'area archeologica di Santa Restituta, colpiti dal sisma. CUSTODIA REPERTI ARCHEOLOGICI	Diocesi di Ischia	Eseguito	225.000,00 €	100	
CS-OS-LA-04-C	LAVORI di miglioramento/adeguamento sismico della sede comunale, dei locali della diocesi e dell'area archeologica di Santa Restituta, colpiti dal sisma. ESECUZIONE LAVORI	Comune di Lacco Ameno	Da avviare	9.254.002,80 €	0	
CS-OS-LA-05A	Lavori di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria della Torre costiera aragonese danneggiata dal sisma – Lotto torre	Comune di Lacco Ameno	In corso Lavori	1.429.964,44 €	30	
CS-OS-LA-05B	Lavori di consolidamento, ripristino e manutenzione straordinaria alle strutture cimiteriali ed al limitrofo costone danneggiati dal sisma	Comune di Lacco Ameno	In corso Lavori	1.973.669,81 €	40	
CS-OS-LA-06	Opere complementari per l'adeguamento sismico dell'edificio scolastico "Principe di Piemonte" danneggiato a seguito del sisma – FINANZIAMENTO INTEGRATIVO DELL'INTERVENTO COMPLESSIVO FINANZIATO CON FONDI MINISTERIALI	Comune di Lacco Ameno	Eseguito	732.000,00 €	100	




Fondo Demolizioni – Ord. Spec. N. 5 – 8 - 9 (interventi di demolizione su tutti i comuni dell'isola)

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		


CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	AVANZAMENTO %
CS-TC-D-01	CASAMICCIOLA TERME	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE MANUFATTI GIA' DESTINATI A IMPIANTI TERMALI IN LOCALITA' LA RITA	Commissario Straordinario	Eseguito	502.516,22 €	100
CS-TC-D-02	CASAMICCIOLA TERME	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE MANUFATTI GRAVEMENTE DANNEGGIATI ALLA VIA NIZZOLA	Commissario Straordinario	Eseguito	110.693,93 €	100
CS-TC-D-03	CASAMICCIOLA TERME	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE MANUFATTI GRAVEMENTE DANNEGGIATI PRESSO VIA SPEZIERIA	Commissario Straordinario	Eseguito	745.782,99 €	100
CS-TC-D-04	LACCO AMENO	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE MANUFATTI GRAVEMENTE DANNEGGIATI PIAZZA FANGO	Commissario Straordinario	Eseguito	247.699,31 €	100
CS-TC-D-05	CASAMICCIOLA TERME	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE MANUFATTI GRAVEMENTE DANNEGGIATI VIA OTTORINGOLO	Commissario Straordinario	Eseguito	1.733.004,16 €	100
CS-TC-D-06	CASAMICCIOLA TERME	INTERVENTO DI DEMOLIZIONE MANUFATTI GRAVEMENTE DANNEGGIATI PRESSO VIA SPEZIERIA + LATO NORD	Commissario Straordinario	Lavori affidati	264.359,73 €	10
CS-TC-D-07	CASAMICCIOLA TERME	Interventi di demolizione edifici siti in via Montecito e via Cuccufreddu - Piazza Maio	Commissario Straordinario	Lavori in corso di affidamento	380.176,94 €	10
CS-TC-D-08	CASAMICCIOLA TERME	Interventi di demolizione manufatti gravemente danneggiati – Lotto1 – La Rita, Via D'Aloisio, Santa Barbara	Commissario Straordinario	Lavori da affidare	1.930.000,00 €	5

Ubicazione interventi di demolizione e relativo stato di attuazione

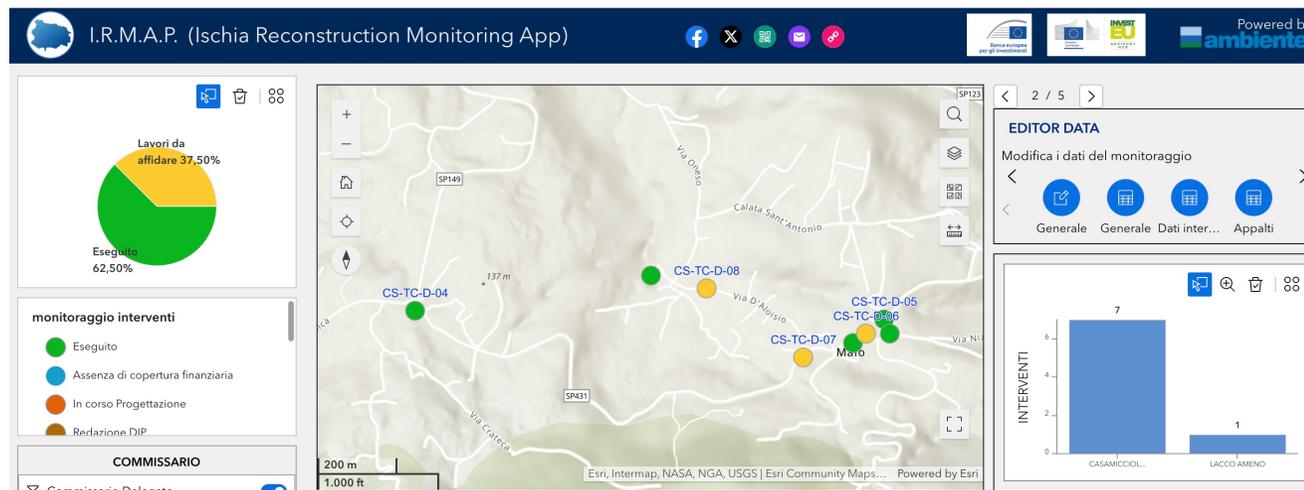

Ordinanze Speciali n. 1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 8 – 11

STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

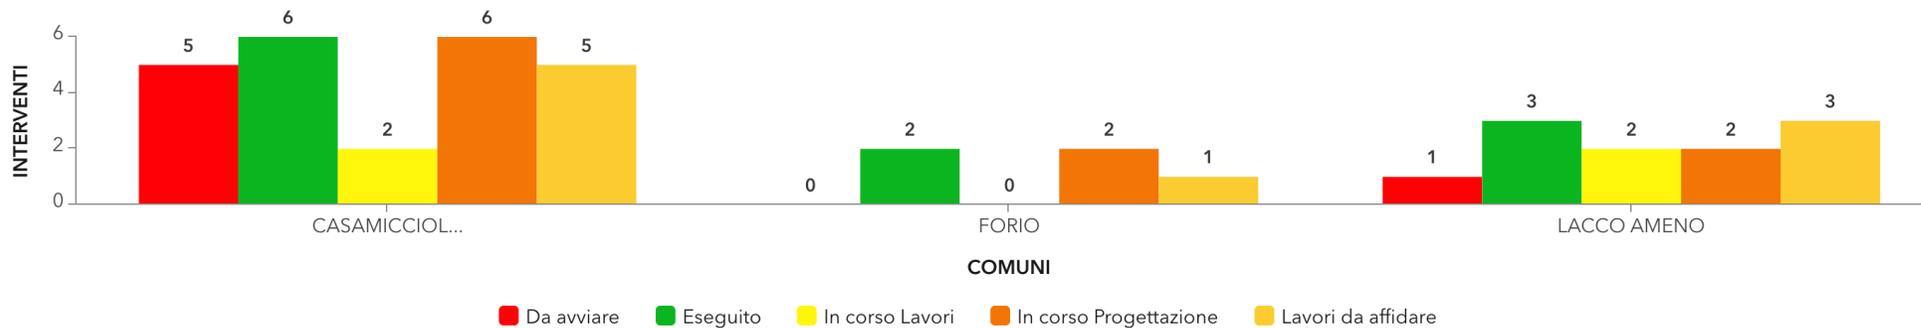


Sintesi dello stato di attuazione degli interventi post sisma contenuti nelle Ordinanze Speciali e ripartiti per comune di ubicazione




CASAMICCIOLA TERME



LACCO AMENO

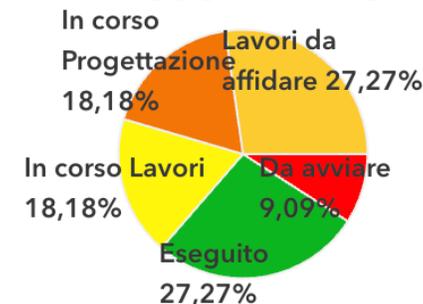

FORIO

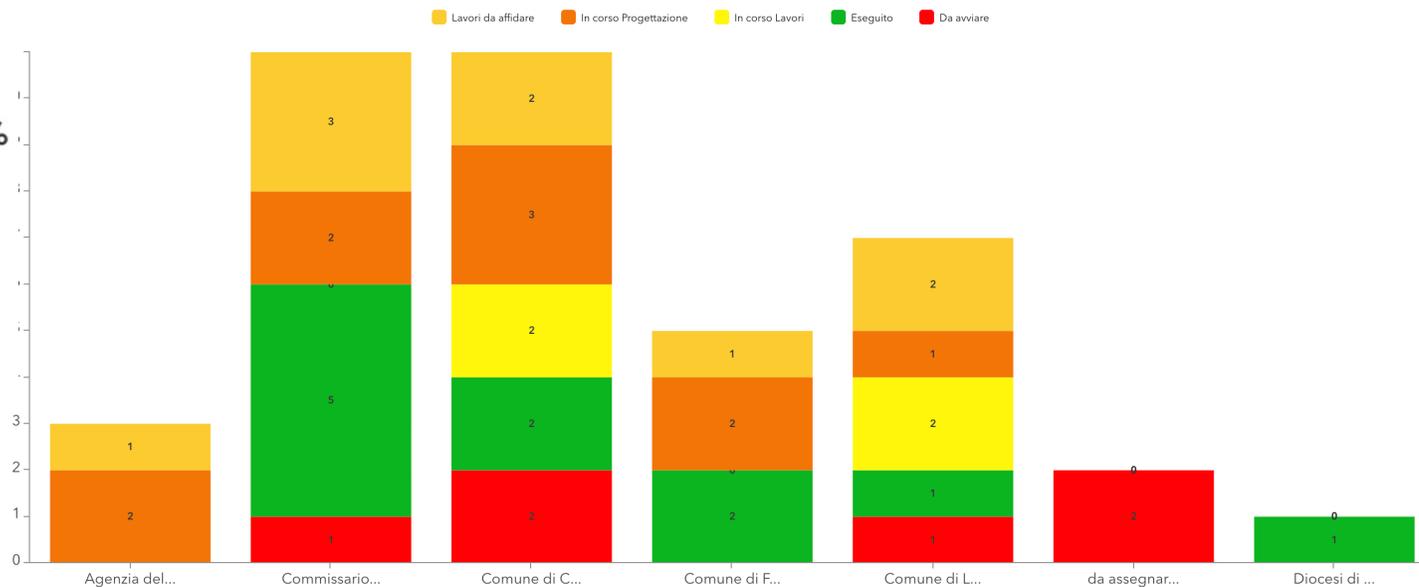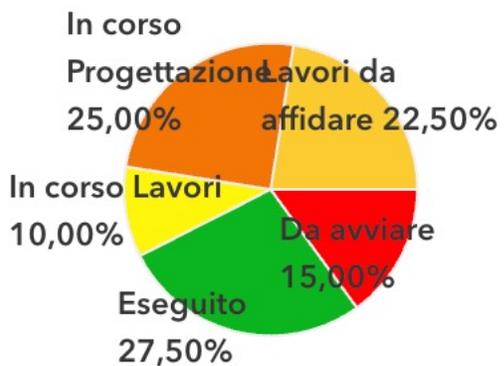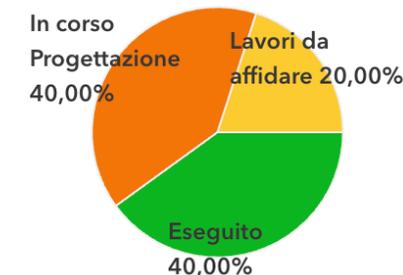


Commissario Straordinario per gli interventi di riparazione, di ricostruzione, di assistenza alla popolazione e di ripresa economica nei territori dell'Isola d'Ischia

SINTESI ATTUAZIONE INTERVENTI POST FRANA E POST SISMA

Ischia, 21 agosto 2025

Ordinanze n. 9 – 11 – 14 – STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

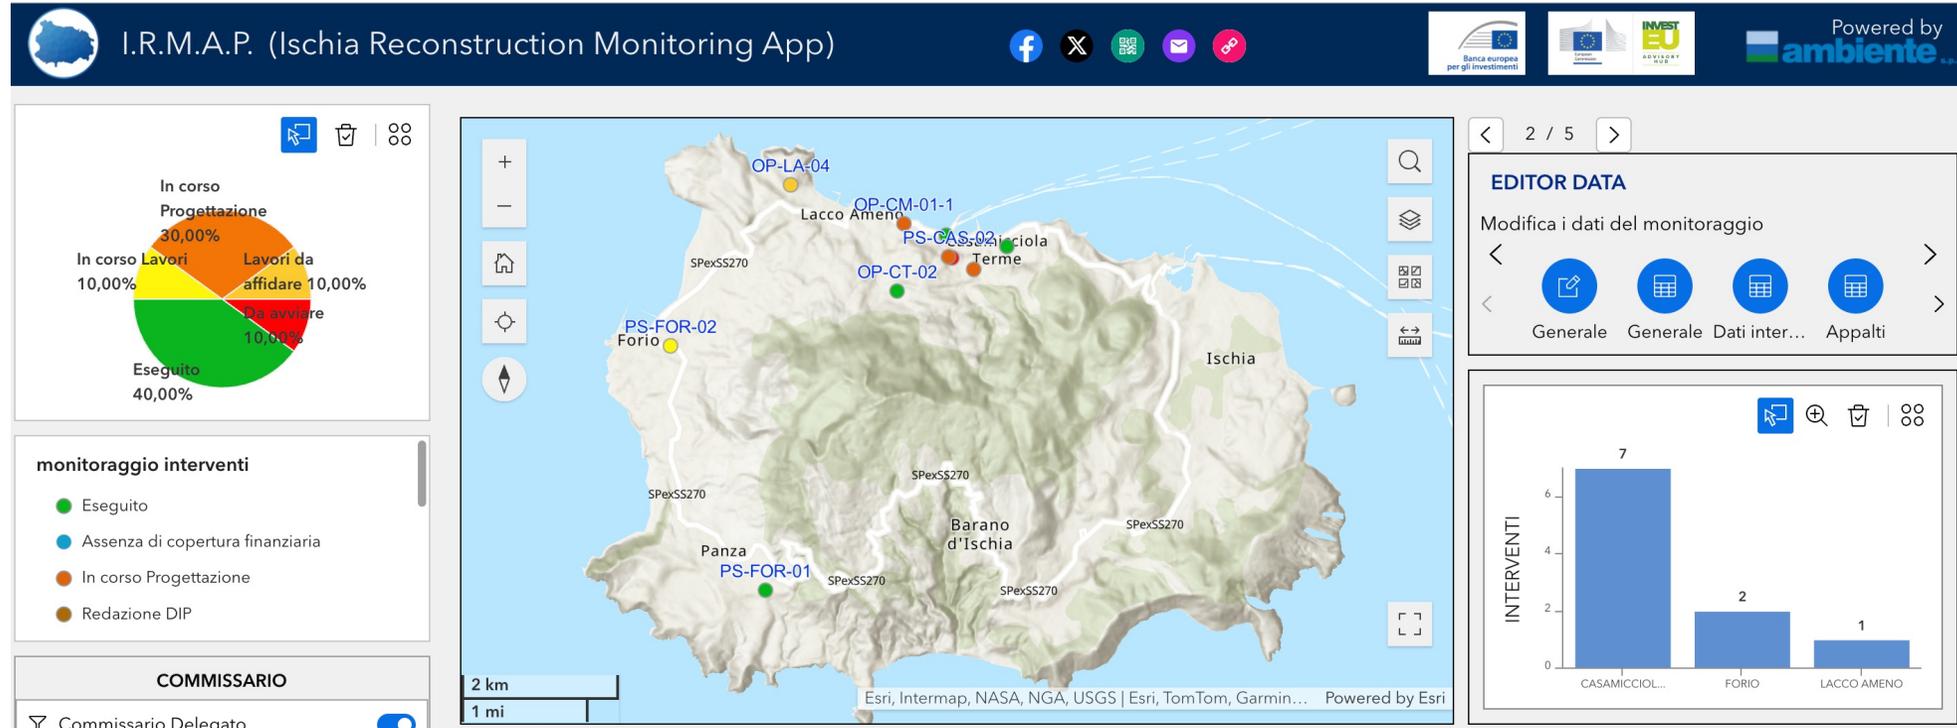


Sintesi dello stato di attuazione degli interventi post sisma contenuti nelle Ordinanze n. 9 – 11 e 14 e ripartiti per comune di ubicazione


CASAMICCIOLA TERME



FORIO



LACCO AMENO




Ordinanze n. 9 – 11 – 14 – STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI

Interventi finanziati

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	AVANZAMENTO %	NOTE – CRITICITA'
OP-CT-02	Casamicciola Terme	Rimozione macerie edificio crollato Via Serrato (completamento intervento urgente 01/U/01-)	Comune di Casamicciola Terme	Eseguito	506.181,14 €	100	
OP-RC-01	Casamicciola Terme	Camera di Manovra adiacente il Serbatoio idrico di Casamicciola scheda Aedes Esito EF	Comune di Casamicciola Terme	Eseguito	362.690,00 €	100	
PS-CAS-04	Casamicciola Terme	Scuola elementare De Gasperi	Comune di Casamicciola Terme	Eseguito	309.356,73 €	100	
PS-FOR-01	Forio	Istituto comprensivo Forio 2 - D'Abundo	Comune di Forio	Eseguito	1.997.456,48 €	100	
PS-FOR-02	Forio	Istituto comprensivo Forio 1 - Luca Balsiore	Comune di Forio	In corso lavori	4.120.794,84 €	40	

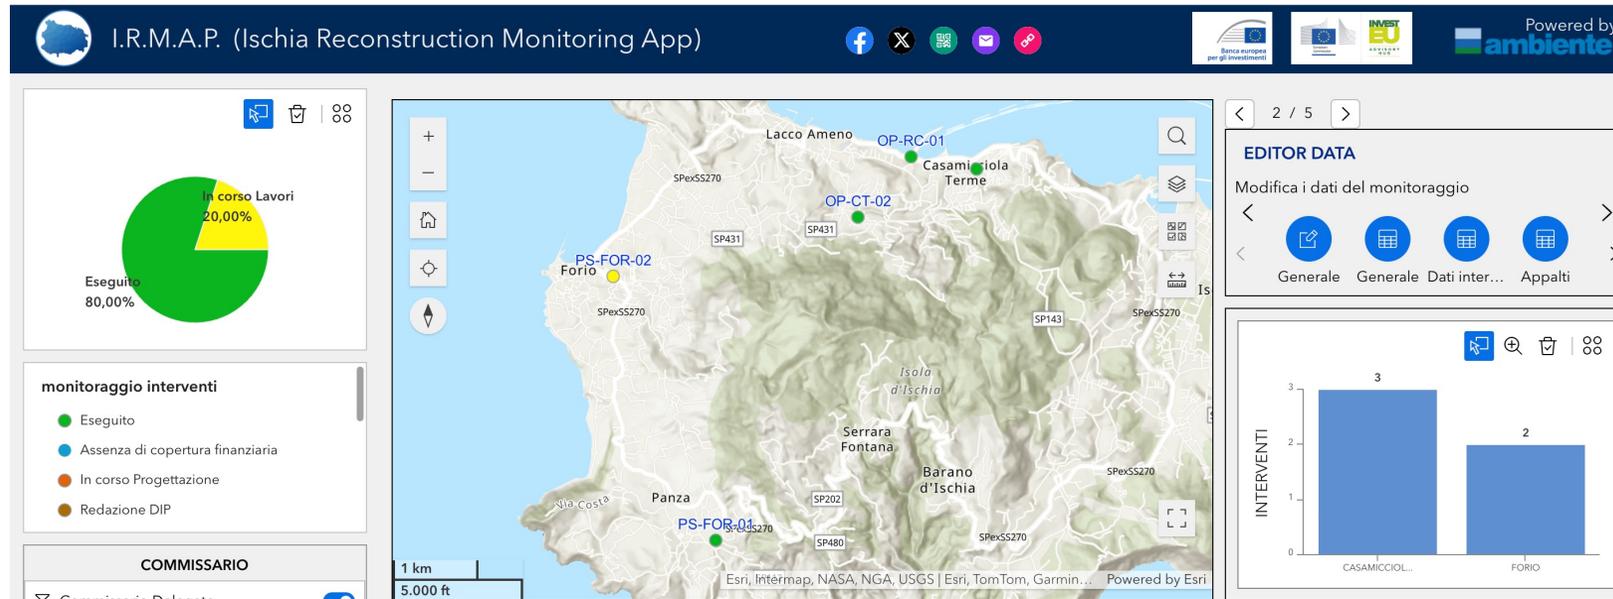

Ordinanze n. 9 – 11 – 14
STATO DI ATTUAZIONE ALTRI INTERVENTI
Con sola progettazione finanziata

LEGENDA

	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		


CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO	AVANZAMENTO %	NOTE – CRITICITA'
OP-LA-04	Lacco Ameno	Messa in sicurezza del sentiero naturalistico della collina di Montevico	Comune di Lacco Ameno	Lavori da affidare	535.218,00 €	10	Progetto concluso e in corso di validazione. In corso stanziamento del finanziamento da Casa Italia
OP-CM-01-1	Casamicciola Terme	Lavori di ricostruzione del muro di contenimento posto a confine con la ex S.S. 270 (Isola Verde) KM 25 + 700	Comune di Casamicciola Terme	In corso Progettazione	597.370,15 €	0	
OP-CT-03	Casamicciola Terme	Ripristino e messa in sicurezza di via Gran Sentinella e via Iasolino	Comune di Casamicciola Terme	In corso Progettazione	72.000,00 €	5	
PS-CAS-07	Casamicciola Terme	Edificio ex sede Centro per l'impiego	Comune di Casamicciola Terme	Da avviare	614.440,00 €	0	
PS-CAS-02	Casamicciola Terme	Istituto superiore Mattei	Città Metropolitana	In corso Progettazione	6.120.000,00 €	5	



Sintesi complessiva stato di attuazione interventi post sisma (Ordinanze Speciali nn.1, 2, 3, 5, 7 e 8 e Ordinanze nn.9, 11 e 14)




I.R.M.A.P. (Ischia Reconstruction Monitoring App)

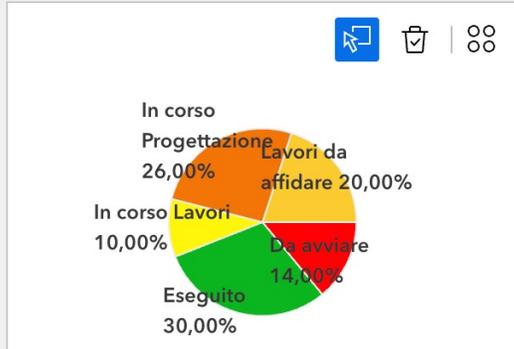

- monitoraggio interventi**
- Eseguito
 - Assenza di copertura finanziaria
 - In corso Progettazione
 - Redazione DIP


COMMISSARIO

Commissario Delegato


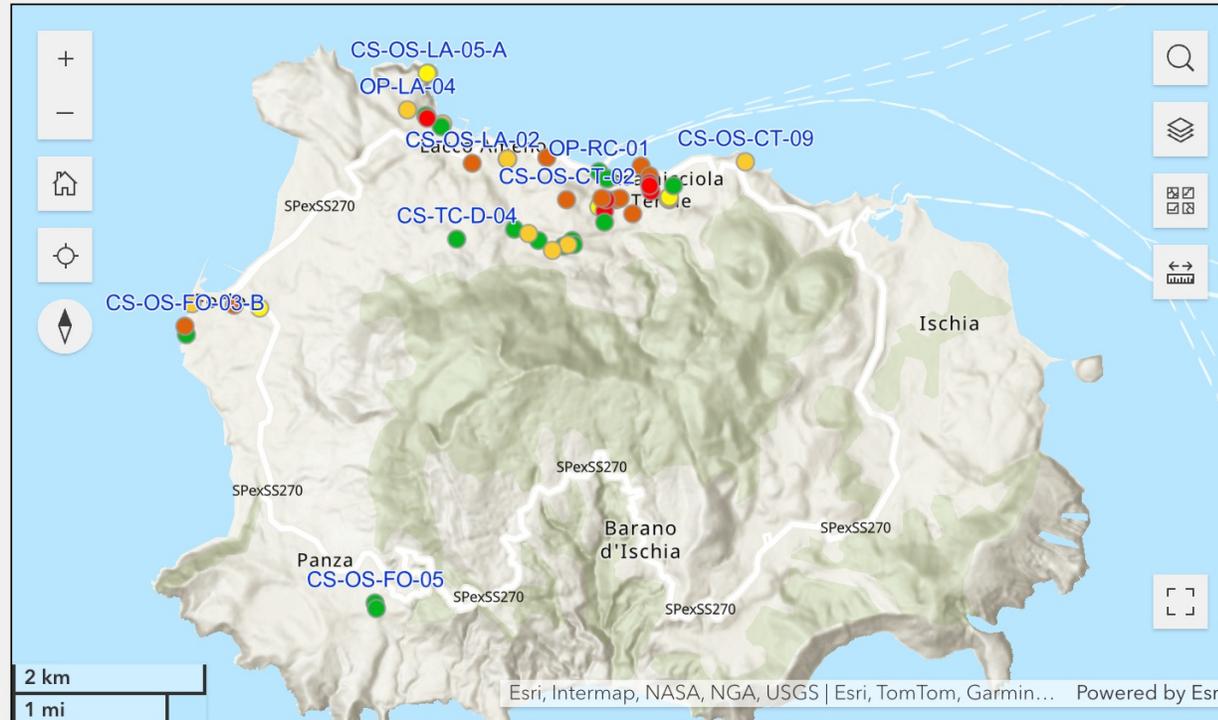


RAPPORTO MONITORAGGIO


Elaborazioni dati provenienti dalle lavorazioni

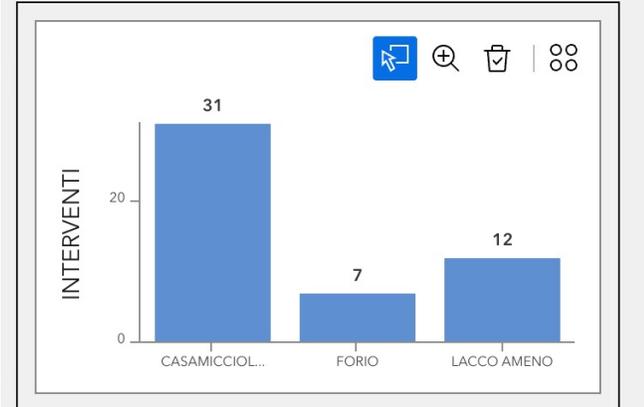


Sintesi complessiva stato di attuazione interventi post sisma (Ordinanze Speciali nn.1, 2, 3, 5, 7 e 8 e Ordinanze nn.9, 11 e 14)

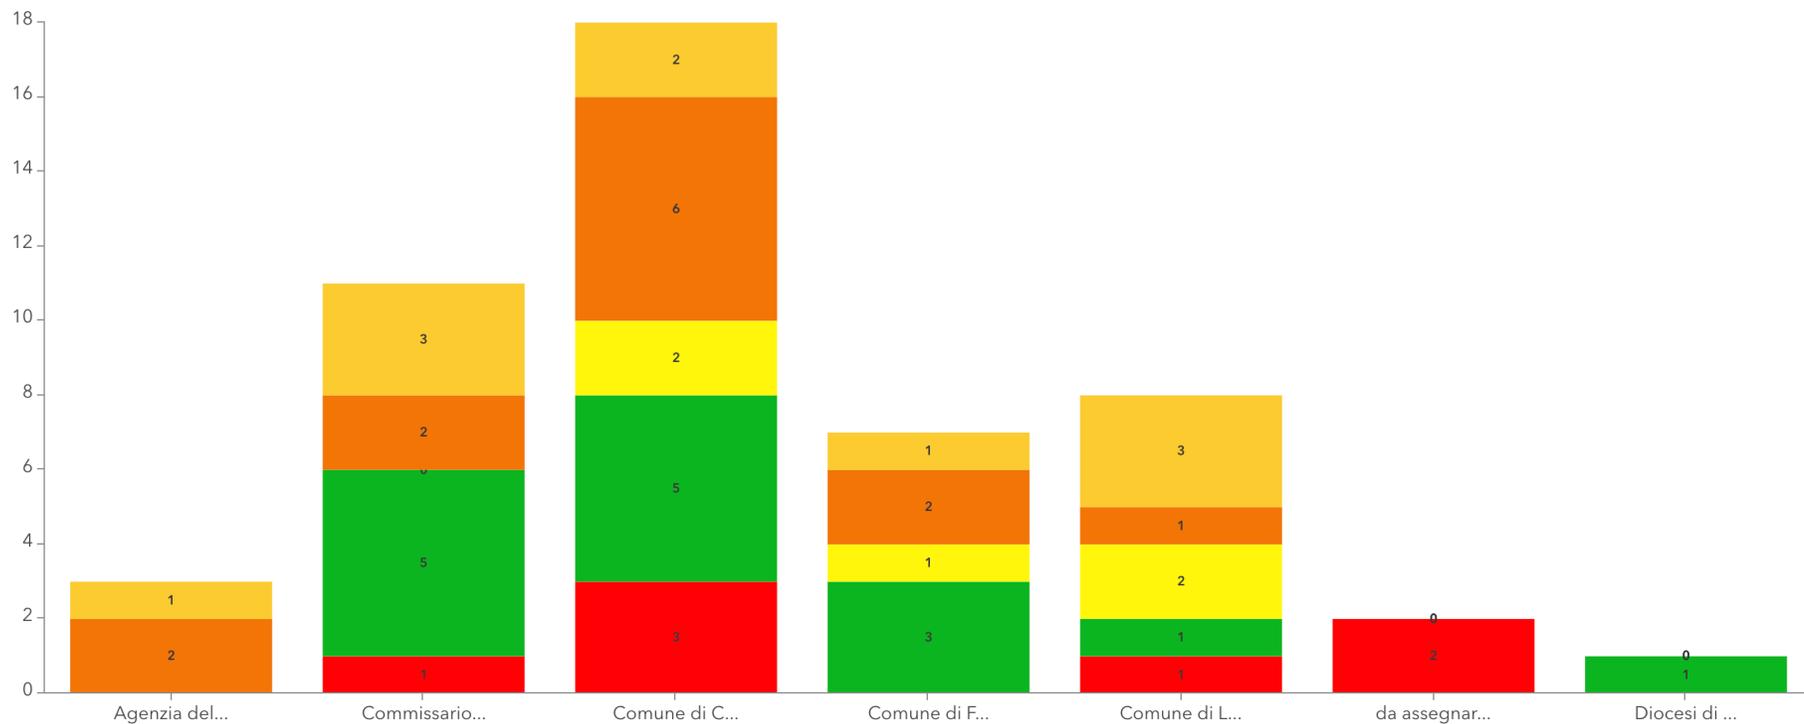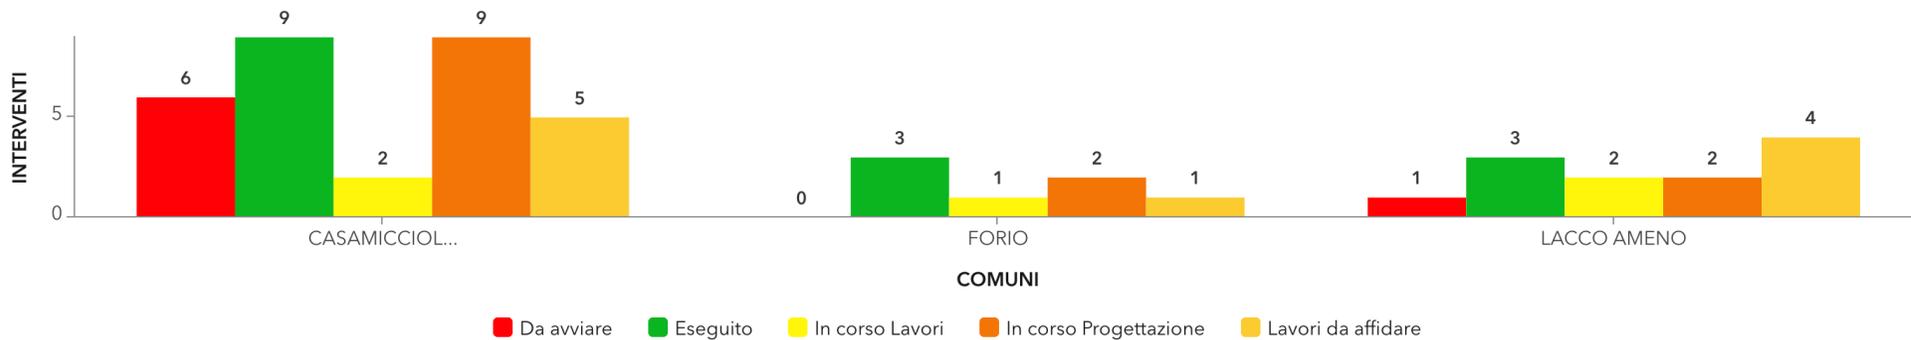

Sintesi stato di attuazione interventi post sisma (Ordinanze Speciali nn.1, 2, 3, 5, 7 e 8 e Ordinanze nn.9, 11 e 14) ripartiti per comune

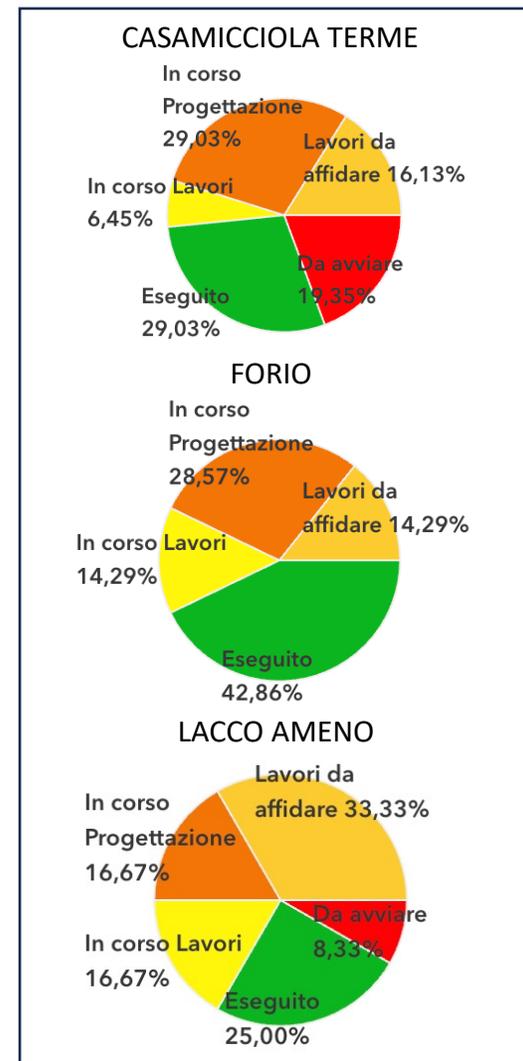

Ordinanza Speciale n.6 – STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI POST- SISMA EDIFICI DI CULTO

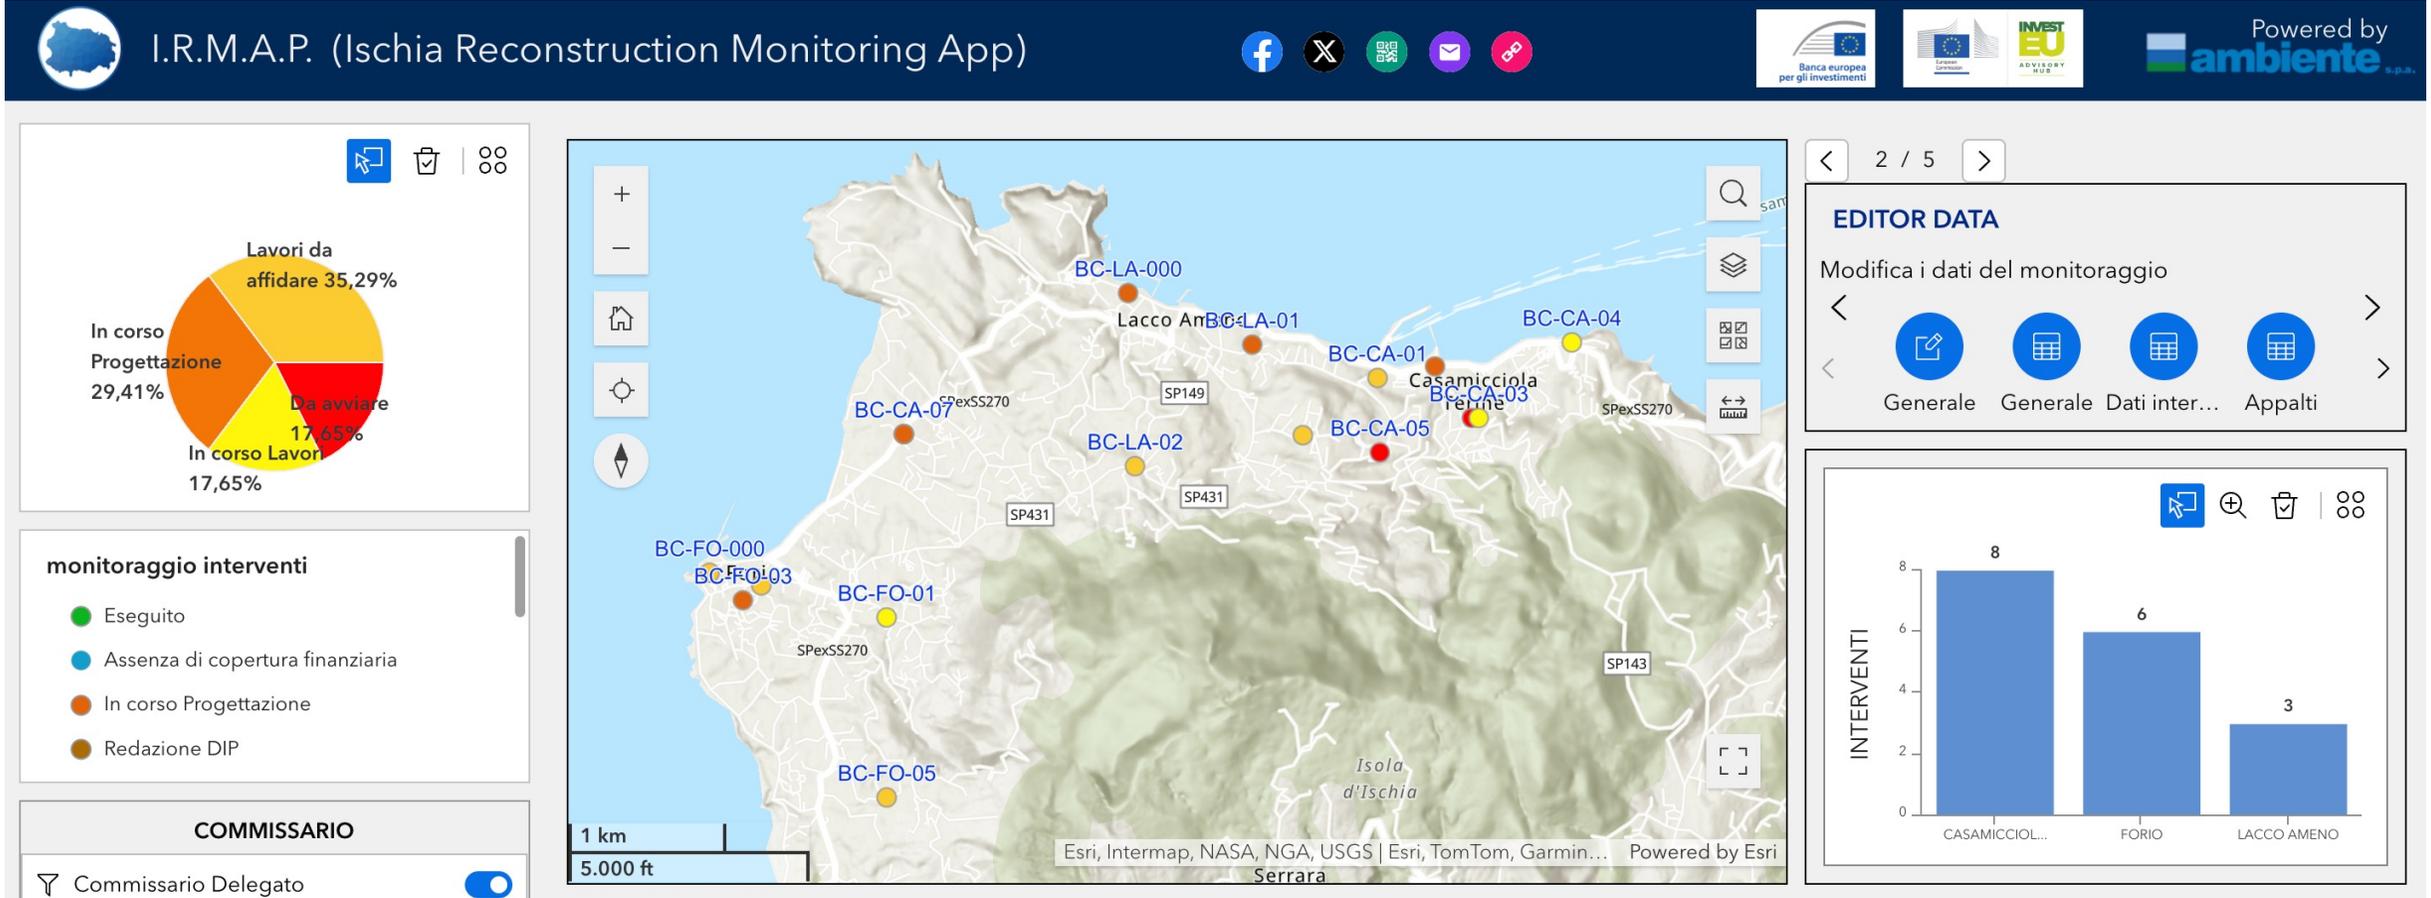

Ordinanza Speciale n.6 – STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI POST SISMA EDIFICI DI CULTO

LEGENDA			
	LAVORI IN CORSO		PROGETTAZIONE IN CORSO
	CONCLUSO		DA AVVIARE
	LAVORI DA AFFIDARE		

CODICE INTERVENTO	COMUNE	DESCRIZIONE INTERVENTO	SOGGETTO ATTUATORE	Stato	IMPORTO FINANZIATO	Note	AVANZAMENTO %
BC-CA-04	Casamicciola Terme	Chiesa Sant'Antonio da Padova	Diocesi di Ischia	In corso Lavori	703.984,56 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	60
BC-CA-03	Casamicciola Terme	Chiesa San Pasquale Baylon	Diocesi di Ischia	In corso lavori	1.003.422,96 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	30
BC-FO-01	Forio	Chiesa Santa Lucia	Diocesi di Ischia	In corso lavori	440.000,00 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	25
BC-FO-05	Forio	Chiesa San Domenico	Diocesi di Ischia	Lavori da affidare	300.000,00 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	10
BC-LA-02	Lacco Ameno	Chiesa San Giuseppe al Fango	Diocesi di Ischia	Lavori da affidare	2.594.297,79 €	Stazione appaltante: Comune di Lacco Ameno poi Diocesi di Ischia	10
BC-CA-01	Casamicciola Terme	Chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio	Diocesi di Ischia	Lavori da affidare	890.646,32 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	10
BC-CA-02	Casamicciola Terme	Chiesa di Santa Maria della Pietà	Diocesi di Ischia	In corso Progettazione	1.332.522,12 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	5
BC-CA-07	Casamicciola Terme	Chiesa Santa Maria del Suffragio detta del Purgatorio	Diocesi di Ischia	Da avviare	514.938,00 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	0
BC-FO-03	Forio	Chiesa parrocchiale di San Sebastiano	Diocesi di Ischia	In corso Progettazione	714.721,65 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	5
BC-FO-04	Forio	Chiesa di San Michele Arcangelo detta del Purgatorio	Diocesi di Ischia	In corso Progettazione	1.527.487,58 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	5
BC-LA-01	Lacco Ameno	Chiesa della SS. Annunziata	Diocesi di Ischia	In corso Progettazione	825.646,01 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	5
BC-CA-05	Casamicciola Terme	Chiesa Parrocchiale di Santa Maria Maddalena	Comune di Casamicciola T.	Da avviare	5.550.361,00 €	Stazione appaltante: Comune C.T.	0
BC-CA-06	Casamicciola Terme	Chiesa dell'Immacolata	Soprintendenza Area Metropolitana Di Napoli	Lavori da affidare	1.450.000,00 €	Stazione appaltante: Segretariato regionale del MIC	10
BC-FO-02	Forio	Chiesa di Santa Maria di Loreto f PNRR	Comune di Forio	Lavori da affidare	1.900.000,00 €	Comune di Forio	10
BC-CA-000	Casamicciola Terme	Chiesa di San Giuseppe - Don Orione	Diocesi di Ischia	Da avviare	1.303.549,87 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	0
BC-LA-000	Lacco Ameno	Chiesa Maria Assunta in cielo	Diocesi di Ischia	In corso Progettazione	820.579,11 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	0
BC-FO-000	Forio	Chiesa di San Francesco d'Assisi f	Diocesi di Ischia	Lavori da affidare	603.433,05 €	Stazione appaltante: Diocesi di Ischia	10



SINTESI STATO DI ATTUAZIONE INTERVENTI POST-SISMA

RICOSTRUZIONE PUBBLICA POST - SISMA							
		Conclusi	Con lavori in corso	In corso progettazione i cui cantieri saranno avviati nel corso del 2025	Da avviare	Totale	Totale per tipo
EDIFICI SCOLASTICI E ULTERIORI OPERE PUBBLICHE	CASAMICCIOLA TERME	5	2	11	6	24	42
	LACCO AMENO	2	2	6	1	11	
	FORIO	3	1	3	-	7	
DEMOLIZIONI	CASAMICCIOLA TERME	4	-	3	-	7	8
	LACCO AMENO	1	-	-	-	1	
	FORIO	-	-	-	-	-	
EDIFICI DI CULTO	CASAMICCIOLA TERME	-	2	3	3	8	17
	LACCO AMENO	-	-	3	-	3	
	FORIO	-	1	5	-	6	
TOTALE		15	8	34	10	67	



RICOSTRUZIONE PRIVATA

COMMISSARIO STRAORDINARIO

Sintesi complessiva delle procedure

DOMANDE DI CONTRIBUTO RICOSTRUZIONE PRIVATA - AGGIORNAMENTO 11 AGOSTO 2025													
TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO		Domande presentate	Domande ritirate su richiesta del beneficiario	Domande in istruttoria	Domande Approvate	Domande non approvate o sospese	Decreti di concessione contributo	IMPORTI DECRETATI	CANTIERI APERTI	CANTIERI DA AVVIARE	CANTIERI CHIUSI	IMPORTI SAL EROGATI	Unità immobiliari corrispondenti ai decreti di concessione
RICOSTRUZIONE SISMA	CONTRIBUTI DANNI LIEVI (Ord. 2/2018 e 4/2019)	49	0	5	38		38	4.232.614,12 €	2	1	35	3.729.267,67 €	59
	CONTRIBUTI DANNI GRAVI (Ord. 7)	14	0	0	3		3	1.736.059,92 €	0	0	3	1.749.878,21 €	10
	CONTRIBUTI Ord. 17	185	2	43	119	21		115	87.952.743,40 €	70	31	14	25.376.728,48 €
DELOCALIZZAZIONI - definitive (Ord.24/2023)		36	0	15	20	1	20	10.337.305,37 €	1	7	7	8.144.714,11 €	24
RIPARAZIONI FRANA / BENI STRUMENTALI E SCORTE Ord. n.22/2023	RIPARAZIONE IMMOBILI/RIDUZIONE RISCHIO ESTERNO - Edilizia residenziale	37	0	11	6	20	6	284.019,37 €				164.574,78 €	5
	RIPARAZIONE IMMOBILI/RIDUZIONE RISCHIO ESTERNO - Attività produttive	28	0	9	12	7	12	2.048.781,62 €	3	2	3	1.733.372,93 €	
	BENI STRUMENTALI/SCORTE E DELOCALIZZAZIONE - Attività produttive	25	0	0	23	2		23	1.802.549,27 €				1.761.251,16 €
TOTALE		321	2	74	221	42	217	108.394.134,07 €	76	41	62	42.659.787,34 €	380

